
고용노동 분야 ODA 사업평가 연구

- 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 ·
개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화
(필리핀, 라오스, 아제르바이잔) 사업 중심으로 -
-

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 “고용노동 분야 ODA 사업평가 연구”의 최종
보고서로 제출합니다.

2023년 12월

(사)국제개발협력실행연구원장

《 연구진 》

연구책임자 : 강정향 (숙명여자대학교 정책대학원 객원교수)

공동연구원 : 전용일 (성균관대학교 경제학과 교수)

장지순 (상명대학교 특임교수)

연구보조원 : 김재원 (국제개발실행연구원 국장)

박미진 (국제개발실행연구원 대리)

연구 요약

1. 연구 목적

- ODA 사업에 대한 자체평가를 통해 사업의 성과 점검 등을 통한 사업의 효율성을 제고하기 위함. ODA 시행기관의 자체평가 의무화에 따라 ‘22년 국무조정실의 ODA 자체평가 가이드라인에 의해 선정된 ODA 사업에 대한 자체 중간평가를 실시함.
- 본 연구는 고용노동부가 수행한 ODA 사업 중 「스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업」(2022~2024)과 「개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화 사업」(2021~2023)에 대한 중간평가를 실시함.
 - 이번 중간평가는 고용노동부의 2개의 ODA 사업의 사업계획 수립 당시의 계획과 그간의 수행된 사업 간의 변화한 사업 상황을 검토하여, 그간의 사업수행이 해당 사업의 최종 목표에 도달할 것인지를 검토함
 - 또한 해당 사업추진 상의 애로점과 개선점을 제시하여 본 사업이 애초의 성과에 도달할 수 있도록 제언을 제시함.
- 이번 중간평가 결과는 향후 고용노동부의 ODA 지원 사업의 효율성과 효과성을 제고하여 지속가능한 사업이 될 수 있도록 사업계획을 수립시의 근거를 마련함.

2. 국제개발협력 평가 매뉴얼(2022)에 따른 각 사업별 중간평가

2.1. 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업 중간평가

1) 적절성

평가 기준	평가 항목	평가값			
적절성	수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합	④	3	2	1
	사업 설계 및 구성의 적절성	4	③	2	1
	환경변화 대응, 위험관리 적절성	4	3	②	1

* 매우 적절 4, 적절 3, 일부 적절 2, 미흡 1

- 본 사업은 스리랑카의 개발전략에 의거하여 추진되었고 추진결과도 ODA의 절차를 준수함. 우리정부의 직업훈련 ODA 지원전략과 스리랑카의 해당 사업에 대한 기존 환경의 적합 정도가 상당히 높은 것으로 판단됨.
- 사업설계 및 구성의 적절성은 현지 국가 수요 사항을 상호 협의하에 구성하여 설계되고, 직업훈련의 유무상 연계의 좋은 사례임.
- 환경 변화 대응 및 위험 관리의 적절성에 대해서는 코로나라고 하는 전대미문의 팬데믹으로 인한 교류협력 중단이 발생하였고, 이로 인한 사업 지연은 어쩔 수 없는 현실이었음. 이러한 지연에도 불구하고, 이후 교류가 회복되면서 서서히 협력의 단계가 진일보하고 있는 것으로 평가됨. 사업주체는 최대한 일정에 맞추어 진행하고 있어, 사업기간내에 종료가 가능할 것으로 예상되고, 연수계획도 차질 없이 진행되고 있음.

2) 효율성

평가 기준	평가 항목	평가값			
효율성	사업비용의 효율성	④	3	2	1
	사업 기간의 효율성	4	3	②	1
	투입 대비 성과 달성 정도	④	3	2	1

- 기자재 지원, 훈련연수, 교육과정 개편, 귀국근로자 훈련 프로그램 등 다양하게 배정하고 있음. 스리랑카의 직업훈련 현황과 골 지역의 특수성이 충분하게 반영되었다고 판단됨.
- 계획된 대로 사업이 추진하도록 노력하고 있지만, 2022년도에 진척이 늦어져, 사업완료에 대한 부담감이 높은 상태임. 대부분의 사업이 2차년도의 중간과 3차년도에 진행할 계획을 가지고 있지만, 현재 시행기관인

한국산업인력공단의 조직과 추진력으로 달성이 가능할 것으로 기대됨.

- 사업추진 현황으로 투입대비 달성 정도를 평가해보면, 성과 지표가 적절하게 설정되어 있고 어느 정도 목표치를 달성한 것으로 판단됨. 스리랑카 공무원과 연수생의 만족도를 평가하면 상대적으로 상당히 높은 것을 알 수 있음.

3) 효과성 및 영향력

평가 기준	평가 항목	평가값			
효과성 및 영향력	계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	4	③	2	1
	사업성과의 취약계층 포용성 및 형평성 정도	4	③	2	1
	사회경제제도에 대한 영향력	4	③	2	1

- 사업계획대비 성과달성 정도를 살펴보면 어느 정도 계획에 맞추어 진행되고 있음. 직업훈련 연수를 경험한 연수생의 경험을 통해서 효과성/영향력이 일정 부분 발휘할 것으로 예상됨.
- 사업성과의 취약계층 포용성 및 형성 정도나 사회경제제도에 대한 영향력은 사업 특성상 어느 정도 높을 것으로 판단되고, 스리랑카 공무원과 연수생과의 심층면담을 통해서 구두 확인하였으나, 문서로 확인하기에는 중간평가상 어려움이 존재함.

4) 지속가능성

평가 기준	평가 항목	평가값			
지속가능성	재정적 제도적 역량 여부 계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	④	3	2	1
	인적 역량 유지관리 체계 여부	4	③	2	1
	계획대비 실제 지속가능성	4	③	2	1

- 스리랑카 정부의 적극성을 반영하면 지속가능성은 높을 것으로 판단됨.

○ 지속가능성을 달성하기 위한 선행조건은

- 스리랑카 측의 정확한 수요제시 및 적극적 협업
- 역량강화 프로그램 적극 참여 및 현업적용
- 제공된 기자재와 설비의 성공적 설치 활용 및 관리
- 코로나 19 상황개선

5) 일관성

평가 기준	평가 항목	평가값			
일관성	내적 일관성	4	③	2	1
	외적 일관성	④	3	2	1

- 본 사업은 EDCF와의 유무상 연계사업으로 내적 일관성을 확보한 것으로 평가됨. 국 직업훈련 체계에 대한 우월성을 인식하고 전수받기를 원하는 스리랑카 정부의 입장과, 개도국에 직업훈련 체계를 전파하려는 한국정부의 입장이 매칭되어 향후에도 일관성이 있게 추진될 것이라고 판단됨.

2.2. 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화 사업의 중간평가

1) 적절성

평가 기준	평가 항목	평가값			
적절성	수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합	④	3	2	1
	사업 설계 및 구성의 적절성	④	3	2	1
	환경변화 대응, 위험관리 적절성	4	③	2	1

* 매우 적절 4, 적절 3, 일부 적절 2, 미흡1

- 한국형 기능경기 시스템 모델을 개발도상국에 전수하여 숙련기술인력 양성 및 직업훈련 역량강화를 지원함으로써 개발도상국의 산업발전 및

경제성장 지원. 개도국 기능경기 역량강화를 위한 관계자 초청연수, 국내 전문가의 현지 파견, 기능경기 제도개선 및 대회운영 지원 등을 무상원조사업으로 진행함. 한국의 기능경기사업에 관한 축적된 지식이 개도국에 전파되는 사업으로 기술전수를 통한 협력국 간 교류 확대로 ASEAN 등 국제기구 내 한국의 영향력 강화.

- 한국의 기능경기사업은 지방·전국기능경기대회 개최 및 국제기능올림픽대회 참가를 통해 지역 간 기술격차 해소 및 숙련기술 수준 향상과 숙련기술인 우대풍토를 조성, 한국의 숙련기술인력 양성과 산업·경제 발전의 견인차 역할을 함. 본 역량강화 사업은 현지 상황을 반영하여 적절하게 구성되어 있음.
- 연수 참여자의 기능향상도, 국제기능경기대회참가 성적 향상도에 맞추어 사업이 진행되고, 사업종료 후 기능경기올림픽 회원국으로써 기능개발 우호적인 협력관계를 지속하고 있음. 집중 관리 국가를 3년 주기로 다변화하고 있어 국가간 협력관계가 지속되고 확장되고 있음.

2) 효율성

평가 기준	평가 항목	평가값			
효율성	사업비용의 효율성	④	3	2	1
	사업 기간의 효율성	④	3	2	1
	투입 대비 성과 달성 정도	④	3	2	1

- 예산은 필리핀과 아제르바이잔이 2023-2023년 각각 600백만원, 라오스 550백만원임. 사전 실무회의, 전문가파견, 초청연수, 훈련공구 및 재료, 최종 워크숍, 국제대회 참관지원으로 적절하게 배분되고 있음. 수원국에서는 파견 전문가 현지 활동 지원, 기능경기관련 시설 및 장비 지원, 각종 행정 편의시설을 제공하고 있음. 3개 국가의 현재 상황을 고려해서 각 국가에 인프라를 제공하고 인적 교류에 최대한 노력을 하고 있음.
- 3년 사업으로 2021년에는 개도국 기능경기 역량강화(8억원, 필리핀/라오스/아제르바이잔)로 진행되고, 연수사업의 후속으로 2022~2023 개별 국가 개발컨설팅을 추진함. 연수 참여자의 기능향상도와 국제기능경기대

회 참가의 성적 향상도가 달성 가능해짐. 코로나19로 대면 교류가 어려워진 상황에서도 줌 세미나를 활성화하고 교류를 지속함.

- 각국의 기능경기 능력에 따라서, 기능경기인력 양성, 기능경기주관 인력 양성, 기능경기 참관(자체 기능경기대회 개최), 국제기능경기의 성과 달성(연구 참가자의 역량 제고) 등의 목표가 설정되고 이에 대한 준비가 이루어지고 있음.

3) 효과성 및 영향력

평가 기준	평가 항목	평가값			
효과성 및 영향력	계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	4	③	2	1
	사업성과의 취약계층 포용성 및 형평성 정도	4	③	2	1
	사회경제제도에 대한 영향력	4	③	2	1

- 한국의 전국기능경기대회에 참여한 현지 공무원의 설문 의견과 연수에 참여한 연수생과 심층면담을 통해서 본 사업의 효과성/영향력이 높다는 사실이 확인됨.
- 사업성과의 취약계층 포용성 및 형성 정도나 사회경제제도에 대한 영향력은 사업 특성상 어느 정도 높을 것으로 판단됨.

4) 지속가능성

평가 기준	평가 항목	평가값			
지속가능성	재정적 제도적 역량 여부 계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	④	3	2	1
	인적 역량 유지관리 체계 여부	④	3	2	1
	계획대비 실제 지속가능성	④	3	2	1

- 현지 공무원과 연수생과의 심층면담을 통해서 본 사업의 지속가능성이 유지될 가능성이 높은 것으로 판단됨. 한국과의 지속적인 관계유지를

통해서 기능경기대회와 관련된 제반 사항의 향상을 수원국에서 요청하고 있음. 한국으로부터 수준높은 경험을 습득하였고 상당한 격차를 보고하고 있음.

5) 일관성

평가 기준	평가 항목	평가값			
일관성	내적 일관성	④	3	2	1
	외적 일관성	④	3	2	1

- KOICA나 EDCF의 연계사업으로 수행됨. 기능경기제도 정책자문 세미나를 시작하였고 이제는 독자적인 무상원조사업으로 자리매김. 우리나라가 제공한 직업훈련센터를 기능경기훈련 거점센터로 활용, 공급된 최신 훈련시설 및 기자재를 활용하여 현지 훈련 및 워크숍 실시하고 해당 훈련센터 훈련교사 및 관계자의 지속적 역량강화 실시
- 연수 참여자의 기능향상도, 자체 기능경기대회 개최 및 국제기능올림픽 대회 참가 등을 지원하고, 개도국의 기능경기대회 인프라 구축 및 역량강화를 통한 숙련기술인력양성 및 숙련기술을 촉진하고 있음.

3. 각 사업에 대한 제언

3.1. 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업 제언

- 스리랑카 직업기술교육훈련 역량강화 사업은 수행 기간 중 스리랑카정부의 부도사태, 코로나19의 여파로 사업추진에 심각한 영향을 받아 2022년 사업이 중단되고 2023년 여름이후에야 본격화되어 사업자체가 지연되고 있음.
 - 수원국인 스리랑카의 수요 개발과정이 적합한 것으로 판단되고 사업의 설계 구성도 상대적으로 적절한 것으로 판단됨.

- 하지만 코로나19로 직업훈련이 지연되거나 온라인으로 개설되는 한계가 발생함. 스리랑카의 급격하게 변화하는 국내 사정에 대한 대비가 충분히 마련되어 있지 못하고 코로나19로 인한 사업 지연이 발생하여 위험관리가 충분하게 이루어지지 않는 것으로 판단됨. 다만 코로나 같은 팬데믹을 대비하는 경우는 없었음.
- 스리랑카 자체의 노동시장이 빈약하여 (특히 골과 같은 지역 단위에서) 직업훈련이 채용으로 연결되기가 쉽지 않은 상황을 고려해서 사업이 진행되어야 함.
 - 청년실업이 20%이상 유지되는 상황이 반복되고 있음. 이러한 노동시장의 상황을 반영하지 않고, 직업훈련 공급 자체에만 관심을 두면, 고용으로 이어지지 않을 가능성이 매우 높음.
 - 사전타당성 조사단계에서 지역 상황과 노동시장에 대한 특수성을 고려할 필요가 있고 실시단계에서 신축적으로 대응해야 함.
- 직업훈련분야가 우리나라의 전문성이 높은 강점 분야로 수원국에서 강력하게 지원을 요청하고 있음. 2010년 유상원조로 지원된 환경개선사업의 후속으로 역량강화를 지원하는 차원에서 직업훈련 무상원조가 이루어지고, 사업자체의 합리성과 적절성은 확보된 사업임.
 - 직업훈련지원사업을 통해서 젠더, 인권, 환경(안전)분야 등의 지표개선이 용이하기 때문에, 사업시에 사전 지표화를 진행하면 성과를 쉽게 이룰 수 있는 분야임. 여성, 청년, 중년으로 다각화하고 노후설비를 대체하는 사업을 전개하는 지표를 설정할 필요가 있음. 수원국인 스리랑카 중앙정부와 지방정부의 지속적인 관심을 유도하도록 국제협력차원의 지원이 필요함.
- 본 중간평가의 결과를 반영하여 PDM를 수정하고 모니터링을 강화할 필요가 있음. 2023년 하반기와 2024년 사업진척에 대한 독려가 필요하고 필요시에 2025년 상반기까지 연장해서 수행하는 방안도 모색할 필요성이 있음.
 - 한국정부의 직업훈련 ODA 무상지원사업의 일관성을 유지하면서 유무상 연계의 성공적인 사례로 모범화해야 할 필요성이 존재함.
 - 현지에 사업진행을 위한 상주인력을 파견하여 사업을 체계화할 필요가 있음.

3.2. 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화 사업 제언

1) 기능경기 대회 ODA 사업 제언

- 한국의 과거 개발 단계와 유사한 경제사회발전단계에 위치한 국가들에게 한국의 기능경기 제도와 노하우를 무상원조사업으로 지원하여 기술인력을 양성하고 산업발전지원을 목표로 하고 있음
- 원조대상국의 숙련기술인력에 대한 인식을 개선하고 우대하는 환경을 조성하고, 국가전략산업에 대한 노동공급을 활성화하여 노동시장을 조성하고, 지역사회 숙련기술을 개발하고 수준을 상향화하도록 기여함.
- 국제기능올림픽에서 다수 종합우승을 달성한 경험을 국제교류, 무상 ODA에 적용하여 국가 브랜드 가치를 향상시키는 기여도가 높은 사업임.
- 다양한 국가에서 한국의 독보적인 위치와 경험을 전수받고 싶어하는 실정임. 그렇지만, 모든 국가를 동일한 시점에 하기보다는 각 국가의 사정에 맞추어 기능경기대회의 발전단계를 고려한 맞춤형 지원을 해야 할 것임. 각 국가의 기능인력양성과 숙련기술 촉진에 대한 국가적인 우선순위, 우리나라와의 직업훈련 체계의 유사성을 함께 고려해서 사업을 선정하고 전개해나가야 함. 아제르바이잔의 경우가 그렇지 못한 예에 해당됨.
- 국제협력에서 무상원조사업(소수 국가에 집중)으로 사업성격이 일부 전환됨. 국제협력차원에서 여러 국가와 동시적으로 사업이 진행되고 있음. 국가 숫자를 줄이면서 후속사업으로 고도화를 진행할 필요가 있음. 국가 발전단계가 달라서, 참여유도형 국가와 성과지향형 국가로 나누어 접근함.
- ODA 중점협력국이 아닌 국가를 선정하면서 무상 ODA로 추진하고 검토할 기관과 협력 체계가 충분하게 형성되어 있지 못함.
- 하지만 참여국가들의 정치경제적인 환경이 매우 다르고 직업훈련교육은 실시하고 있지만 수준과 범위의 차이가 발생하고 있음.
- 해당 국가에 대한 정확한 실태 파악이 되지 않고(요구 직종, 지원방

법이 확인되지 않은 경우가 많음), 홍보와 예산확보 등의 가시적인 지원이 확보되지 못하고 있음. 국가마다 명확한 성과지표를 구체적으로 양국 합의하에 제시되어야 할 것임.

- 수원국 담당자도 기능경기대회의 필요성은 인지하지만 절박성에 대해서는 확인하기 어려움 상황임. 법적 근거, 예산, 거버넌스의 부재가 이러한 상황을 반영하고 있음.
 - 온라인컨설팅, 초청연수, 훈련콘텐츠 전파로 진행되었지만, 사업이 동시적으로 진행되어 각 국가별 맞춤형으로 진행되지 못하고, 온라인컨설팅의 효과성은 높지 않은 것으로 판단되고, 일부 국가에서는 사업목표 대비 성과에 대한 구체적인 측정 지표가 설정되어 있지 못하고 확인이 가능하지도 않음. 대상국 별로 관심 직종에 한정해서 사전계획에 따라 맞춤형으로 진행될 필요성이 제기됨.
 - 기능경기대회의 가시적인 효과는 국제기능대회의 참여나 수상으로 이어져야 하지만, 단기간이 이루어지기에는 어려운 항목들로 장기간의 투자를 요구하는 사업임. 참여 선수단의 열망은 좋지만 실제로 실력이 현격히 떨어져서 성과목표를 이루기가 쉽지 않은 상황임.
 - 각 국가에서 기능경기위원회의 조직이 비영리단체나 취약한 법적 기반으로 유지되고 있는 실정으로 재정 자립도가 낮고 지원체계를 국제협력으로 지원하기에는 한계가 발생함.
 - 기능경기대회의 수상경험이 있는 국가에 대해서는 재입상에 대한 우리나라와의 경험에서 얻어지는 순수한 효과를 추출하기가 어려운 측면이 존재함.
 - 기능경기대회가 수원국의 사회경제에 미치는 영향을 나타내는 지표와 통계정보가 부족하여 확인이 어려움.
 - 수원국에서 요청하는 훈련센터의 건립지원은 쉽지 않고 현재 우리나라의 기능경기대회 ODA 지원이 물적 지원으로 이어지지 못하는 한계가 발생하고 있음.
- 무상원조의 3년 사업으로 진행되지만, 다년간 국제협력사업으로 보완되어야 할 것임.

- 각 국가의 현황과 의지를 반영한 성과지표를 구체적으로 설정하고 이를 달성하기 위한 전략방안(기능분야, 일정)에 대한 조치가 설정되어야 함. 각 국가마다 기능경기 참여 종목에 상당한 차이를 보이고 있음.
 - 무상원조사업을 추진하면서 성과지표에 대한 지속적 모니터링이 필요함. 초청연수사업의 목표가 명확하고 성과가 즉시 발현될 가능성이 높아서, 맞춤형 초청연수사업을 확대할 필요가 있음. 현재에는 기업체와 산업인력공단에서 효율적으로 잘 진행하고 있음.
 - 고난이도의 직업훈련 전파사업으로 경제사회적인 파급효과가 매우 높고 우리나라의 전속성을 강화하여 양국 국제협력에 강한 원동력을 제시함. 고급화된 기술 전수가 직업훈련계와 연계되도록 파급효과를 확산시킬 수 있는 방안이 모색되어야 함. 기능경기대회를 통해서 기능경기대회의 노하우가 전체 직업훈련 수준을 높이는 방향으로 설정이 되어야 함.
 - 우리나라 ODA 평가기준에 맞추어 젠더, 인권, 환경(안전)분야 등의 지표개발과 연관성 확보에 노력해야 함. 일부 ODA 항목과는 괴리감이 존재함(사회 취약계층에 대한 포용성과 형평성 등).
 - 기능적인 측면이외에도 기능경기대회의 법적 근거 마련, 공정 선발 시스템 개선 등의 인프라 설정에도 지원이 있어야 함.
 - 국제기능경기대회 참여자나 수상자들에게 신규채용이나 고용유지에 도움이 될 수 있는 제도가 형성되고 한국과의 지속성이 유지되도록 노력해야 함. 기능경기대회 ODA 사업상의 가장 난이점은 지속가능성의 유지에 있다고 할 것임. 상대적으로 수원국의 지속유지 의지는 강하지만 실제로 전개되려면 가시적인 성과와 많은 노력이 필요함.
 - 코로나19 등과 유사한 외부환경적 변화에 대응하기 위한 위험관리체계를 시나리오별로 구성하여 사전에 매뉴얼을 작성할 필요가 있음.
- 개도국 기능경기 역량강화 사업(K-STAR)의 의미 그리고 성공가능성을 위해서는 중장기 전략 마련이 필요함. 국제대회의 입상을 통한 해당 분야의 숙련기술 증진은 물론 발전을 위해서는 기능경기의 경쟁력 강화만큼 좋은 소재는 없기 때문임. 그렇지만, 이를 위해서는 선발에서

부터 교육훈련, 그리고 관리까지 전 과정에 걸쳐 보완과 제도적인 뒷받침이 있어야 할 것임.

- 선발과정에서의 엄격한 기준과 분야 선정이 중요할 것임.
- 교육훈련을 위한 시설 지원, 교육과정개선 등은 필요한 작업임. 국가별 사정은 다르겠지만, 어떤 국가는 기존 지원 ODA 사업에 대한 지원을, 어떤 국가는 새로운 시설을 지원해야 할 것임. 이에 대한 실태조사를 통한 사업 전개가 필요할 것임.
- 관리측면에서는 기능경기대회 준비에 대한 체계 수립에 대한 자문이며, 이를 위해서는 법제도 구축, 조직 및 인력 등의 체계를 마련해야 할 것임.
- 이러한 내용을 기반으로 한 중장기 전략 마련이 필요하고, 이에 따른 개도국 기능경기 역량강화 사업(K-STAR)을 해야 수원국의 수요를 반영함과 동시에 사업의 효과성을 높이고, 지속가능성을 확보할 수 있을 것임.

목 차

연구 요약

I. 서론	1
1. 연구 목적과 내용	1
2. 연구 방법	3
II. 중간평가 개요 및 개별 사업 현황	7
1. 중간평가 개요	7
2. 스리랑카 직업기술교육훈련 역량강화 사업 현황	17
3. 기능경기 역량강화 사업 현황	20
III. 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업 중간평가	25
1. 적절성	25
2. 효율성	34
3. 효과성 및 영향력	41
4. 지속가능성	45
5. 일관성	46
IV. 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화 사업 중간평가	48
1. 적절성	48
2. 효율성	56
3. 효과성 및 영향력	66
4. 지속가능성	75
5. 일관성	80
V. 결론	82
1. 중간평가 결과	82

2. 제언	90
-------------	----

부록	95
----------	----

1. 2023년 기능경기대회 초청연수 만족도 질문지	95
2. 「기능경기 역량강화 초청연수_연수생」 면접 질문지	99
3. 「기능경기 역량강화 초청연수_공무원」 면접 질문지	102

제1장 서론

1. 연구의 목적과 내용

- ODA 사업에 대한 자체평가를 통해 사업의 성과 점검 등을 통한 사업의 효율성을 제고하기 위함임.
- ODA 시행기관의 자체평가 의무화에 따라 ‘22년 국무조정실의 ODA 자체평가 가이드라인에 의해 선정된 ODA 사업에 대한 자체평가를 실시함.
- 본 평가는 중간평가로서 국제개발협력사업 진행 중에 수행되는 평가임. 따라서, 사업 이행에 문제가 있거나 사업의 애초의 최종 목적에 도달 가능한지를 점검하는 것임.
- 이번 평가는 중간평가로서 고용노동부의 2개의 ODA 사업의 사업계획 수립 당시의 계획과 그간의 수행된 사업 간의 변화한 사업 상황을 검토하여, 그간의 사업수행이 해당 사업의 최종 목표에 도달할 것인지를 검토하는 것임. 또한 해당 사업추진 상의 애로점을 분석하여, 개선점을 제시하여 본 사업이 애초의 성과에 도달할 수 있도록 제언을 제시하였다.
- 첫 번째 연구 내용은 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업 중간평가임.
 - 사업 기간 : 2022년~2024년
 - 스리랑카의 직업훈련 인프라 개선 및 역량강화를 통한 숙련기술인력 양성, 노동시장의 미스매치 해소 및 경제성장을 위해 수행함.
 - 본 사업은 스리랑카 니야가마 국립직업훈련원(EDCF 사업으로 건립)의 교육훈련 인프라 개선 및 훈련직종 개발·교과과정 최신화, 훈련교사 역량강화 등을 지원하여, 수원국 노동시장의 미스매치 해소 및 경제성장 도모를 목적으로 함.

- 중간평가의 기준은 국무조정실(2023년 4월 개정)에서 제시한 국제개발협력 평가지침 및 평가 매뉴얼에 의해 6개의 평가기준(적절성, 효율성, 효과성, 영향력, 지속가능성, 일관성)을 바탕으로 사업에 부합하는 평가매트릭스를 개발하여 사업의 성과 등 평가, 제언사항 도출
- 두 번째 연구내용은 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화 사업 중간평가임.
 - 대상 국가 : 필리핀, 라오스, 아제르바이잔
 - 사업기간 : 2021년~2023년
 - 직업기술훈련분야의 우리나라 경험과 기술을 개도국 3개국에 전수하여 개도국의 숙련기술 촉진 및 기능인력 양성 지원
 - 본 사업은 한국형 기능경기시스템 모델을 개도국에 전수하여 산업수요에 맞는 숙련 기술인력 개발과 기술교육훈련(TVET) 품질제고 국내·외 산업기술격차 해소를 통한 수원국의 산업발전 및 경제성장도모를 목적으로 함.
 - 중간평가의 기준은 국무조정실(2023년 4월 개정)에서 제시한 국제개발협력 평가지침 및 평가 매뉴얼에 의해 5개의 평가기준(적절성, 효율성, 효과성/영향력, 지속가능성, 일관성)을 바탕으로 사업에 부합하는 평가매트릭스를 개발하여 사업의 성과 등 평가, 제언사항 도출

2. 연구 방법

2.1. ODA 사업 중간평가 연구추진 절차

연구절차	연구 내용	연구 방법
ODA 사업성과평가 기준, 절차, 방법조사·분석	- 국무조정실, OECD DAC 사업성과 평가기준, 절차, 방법 제시 - 고용노동분야 ODA 사업성과 점검 및 평가를 위한 기준, 절차, 방법 등 제시	문헌연구
고용노동분야 ODA 사업추진 현황과 평가방향 설정	- 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업 추진현황 파악 및 평가방향 설정('22-'24) - 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화(필리핀, 라오스, 아제르바이잔) 사업 추진현황 파악 및 평가방향 설정('21-'23)	- 문헌연구 - 면담조사
고용노동분야 ODA 사업 중간평가 실시	2022년 시작한 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업의 사업진척 및 성과 점검 및 중간평가 실시 2021년 시작한 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화(필리핀, 라오스, 아제르바이잔) 사업의 사업 진척 및 성과 점검 및 중간평가 실시	- 문헌연구 - 면담조사
중간평가 결과를 반영한 사업개선 사항 도출	- 반영한 사업개선사항 도출·평가결과에 따른 사업효과성 및 효율성 제고방안 제시 - 고용노동분야 ODA 사업 개선을 위한 교훈 및 정책제언 제시 등	자문

2.2. 연구 방법

1) 문헌연구

○ 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업과 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화(필리핀, 라오스, 아제르바이잔) 사업에 대한 국내외 관련 보고서 및 보도자료 등

- 기존 사업이행 시의 자료를 사업요소 및 특성을 분석하여 평가의 객

관성과 신뢰성을 제고함.

- 사업 수행 시 주관기관에서 실시한 간담회 자료 및 만족도 조사 등
- 평가기준은 국무조정실의 「국제개발협력 평가 매뉴얼」에 의거함
(2023년 4월 개정)
 - 사업의 성격 및 현지 여건을 고려하여 국제개발협력 평가매뉴얼에 제시된 평가기준에 근거하여 중간평가를 실시함
 - 국무조정실(2023.4)의 OECD DAC의 6개 평가항목을 근거함

2) 설문조사

- (설문조사 목적) 본 설문조사는 과정평가 항목 중 수혜자 대상으로 객관적 검증이 필요한 사안에 대한 확인과 더불어 수혜자 관점에서의 성과를 판단하기 위해 실시함.
- 국내외 연구, 타 공여기간 사례를 참고하여 본 사업평가에 타당한 설문조사지 초안을 작성함. 특히, 고용노동부 ODA 2개 사업의 특성을 고려하여 공통적인 질문과 개별 사업별 질문을 구분하여 상호 비교가 가능하도록 설계함.
- 설문조사지 초안은 평가팀 및 고용노동부/산업인력공단의 사업담당자 등의 의견 수렴 및 편향(Bias) 여부를 검토하고 본 평가용역에 적합하도록 수정, 보완하여 설문 조사지를 확정함.
- 현지 조사 2주일 전에 최종 설문지를 확정함. 현지조사 기간 일주일 전에 현지 관계자에게 부탁하여 설문대상자에게 설문 조사지를 배포 요청. 현지조사 기간 내 연구진이 설문조사를 취합함.

설문조사 방법 및 내용

(목적) 사업의 주요 성과 확인 및 개선사항 탐색
 (대상) 사업 주요 관계자 및 수혜자(교육 대상자, 수혜기관 관리자 및 책임자 등)
 (방법) 사전에 타당도 신뢰도가 검증된 설문 도구 개발 활용 및 전집 표본

(설문 내용)

- 사업 설계 및 수행방식의 적절성

설문조사 방법 및 내용

- 사업수행구조의 효율성
- 사업 예산, 일정, 기술 등의 효율적 운용 정도
- 현지 파트너기관과의 협력
- 사업성과 모니터링 결과
- 종료평가 단계의 사업결과 내용
- 본 사업의 산출물 증위의 성과 달성 여부
- 후속관리 및 지속가능성을 위한 제언 등 청취

3) 면담조사

- (국내 연수 참여자 대상 조사) 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업에 참여한 공무원 및 참가자들 대상으로 심층면담을 진행하여 사업기획, 이행, 연수사업 참여 만족도 등에 따른 참여자 의견 및 반응을 수렴함.
- (국내 연수 참여자 대상 조사) 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화 사업에 참여한 필리핀, 라오스, 아제르바이잔 국가에서 온 참여자를 대상으로 면담을 실시함.

면담조사 방법 및 내용

(목적) 현지 사업과정 및 결과, 구체적 사업 내용 및 후속 영향 등에 대한 정보 및 의견 수집
 (대상) (현지 관계자) 사업 참여 관계기관, 사업 직/간접 수혜자
 (방법) 구조화 된 면접도구 개발 활용 전집 면담

(면담 내용)

- 사업 설계 및 수행방식의 적절성
- 사업수행구조의 효율성
- 사업 예산, 일정, 기술 등의 효율적 운용 정도
- 현지 파트너기관과의 협력
- 사업성과 모니터링 결과
- 종료평가 단계의 사업결과 내용
- 본 사업의 산출물 증위의 성과 달성 여부
- 후속관리 및 지속가능성을 위한 제언 등 청취
- 후속관리 및 지속가능성을 위한 제언 등 청취

4) 국내에서의 연수사업 현장 방문조사

- 국내 직업기술교육훈련 역량강화 국내 초청연수 사업의 현장을 방문하여 활동 이행상황을 점검하기 위해서 사업 현장의 방문조사를 실시함.
- 국내 기능경기대회 초청연수사업 현장(천안)을 방문하여 활동 이행상황을 점검함.
- 지원사업의 이해당사자와 심층면담을 통해 현장의견을 직접 수렴함.

5) 자문 실시

- 본 중간평가 결과에 대한 신뢰도를 확보하기 위해서 ODA 전문가(3인)에게 자문을 구함.

2.3. 연구의 기대효과

- 고용노동 분야 ODA 사업의 중간평가는 각 사업 추진 시 효율성을 제고하고 본래의 사업목적에 달성할 수 있도록 촉진함.
- 국무조정실(2022)의 국제개발협력 평가매뉴얼에 제시된 OECD DAC의 6개 평가항목 등을 기반으로 하는 평가를 함으로써 고용노동부의 ODA 사업 관리·운영 수준을 체크할 수 있음.
- 중간평가 결과로 도출된 개선사항 및 제언은 해당 사업추진의 성과목표 달성에 기여할 것이며, 사업의 이해당사자와 공유 및 환류하여 지원 사업에 대한 참여 및 협력을 강화할 것임.
- 본 연구에서 도출된 제언 및 개선 방안 등을 향후 고용노동부의 고용노동분야 ODA 사업 수행 시 지속가능한 사업계획 및 전략 수립에 활용하고자 함.

II. 중간평가 개요 및 개별 사업 현황

1. 중간평가 개요

1.1. 고용노동부 ODA 사업 중간평가

- 2023년 고용노동부 ODA 사업평가 방향
 - ODA 사업의 객관적 평가를 통해 시사점 도출 등 차기 사업계획 수립·추진에 환류 제공
- ODA 사업 중간평가(자체평가)의 근거(제45차 국제개발협력위원회, 2023년 4월)
 - 「국제개발협력기본법」 제정(2010년 7월 시행)에 따라 2011년부터 ODA 정책·사업에 대해 위원회평가와 자체평가로 구분하여 실시해 오고 있음.
 - 국제개발협력위원회(평가전문위원회)가 정책·전략·국별·분야별 등 대표성 있는 사업을 선정하여 종합적 평가 실시
 - 사업 시행기관이 소관 사업 중에서 평가 대상 과제 선정, 평가전문위원 검토 후 대상 과제에 대해 자체적으로 평가 실시
 - OECD 개발원조위원회(DAC) 권고사항 및 국제개발협력기본법 시행령(제12조)에 따라 6대 기준 적용
 - (적절성) 국제사회의 공동목표, 수원국 및 정부의 정책 우선순위 등에 부합하는 정도
 - (효율성) 투입된 자원 대비 국제개발협력사업의 성과(비용-편익분석)
 - (효과성) 국제개발협력 사업의 목표 달성도(산출물·성과물의 목표 달성 정도)

- (영향력) 협력대상국의 경제·사회·환경 등에 대한 직·간접적인 영향
- (지속가능성) 사업완료 이후 사업의 효과가 지속하는 정도
- (일관성) 국제적 규범과 기준에 부합하고 대내외적으로 일관되게 추진 되는지 여부

○ 평가 유형

- **(외부 평가)** 평가는 평가의 실시방법, 시기 및 대상 등에 따라 구분할 수 있음. 평가는 단일사업에 대해 또는 여러 개 사업을 묶어서 수행할 수 있음. 이번 평가의 실시방법은 외부 평가(Internal Evaluation, Self-Evaluation)임.
- **(중간평가)** 평가 시기는 중간평가(Interim Evaluation)에 해당함. 중간평가는 국제개발협력사업 진행 중에 수행되는 평가를 말하며, 사업진행에 문제가 있거나 사업기간이 일정기간 이상인 사업에 대해 점검 등의 형식으로 실시함.
- **(프로젝트/프로그램 평가)** 평가의 대상은 2개의 사업 모두 고용노동 분야의 사업에 대한 평가이기에 분야별 평가, 형태별 평가에서는 국내초청연수와 기자재지원사업이며, 국제개발협력 개별 프로젝트 또는 특정 프로그램을 평가하는 것을 포함하고 있어서 프로젝트/프로그램 평가임.

1.2. 평가 기준 설정

- 국제개발협력사업의 평가는 OECD/DAC의 6대 평가기준을 고려하여 실시하게 됨. 다만, 평가의 범위, 시기 등에 따라 동 기준을 모두 적용하기 어렵거나, 환경, 성주류화 등 기타 평가기준이 필요한 경우도 있으므로, 평가 담당자는 평가의 목적과 성격, 용도 등을 고려하여 각 평가별로 중점적으로 평가되어야 할 기준을 선정하고 이에 따른 세부 평가질문을 작성한 뒤 평가를 수행함.
- 중점적으로 평가 되어야 할 기준을 파악하기 위해서는 각 항목에 대해 다음과 같은 사항을 확인할 수 있음.

평가항목	구제적인 확인사항
적절성	사업선정 및 목표가 적절했는가? 사업수요 및 요청 기능을 적절하게 반영했는가? 현지 수요가 적절했는가?
효율성	사업수행과정의 효율성/ 사업수행구조의 체계성 합의된 개발일정 및 납기일에 처리가 완료되었다 충분한 의사소통과 적극적인 협조를 하였나? 사업기간 및 비용은 효율적이었나?
일관성	타 사업과의 연계 타 사업과의 시너지효과
효과성	수요를 반영해서 완성되었는가? 사업의 특성 및 절차를 고려하여 프로세스가 잘 설계되었는가? 제대로 작동되고 있는가?/ 제대로 활용되고 있는가? 사업 활용도가 향상되었는가?
지속가능성	사업의 지속가능성을 위한 준비는 되었는가? 추가 연수의 내용 및 빈도/ 자체 연수 계획 역량강화 계획
영향력	사업의 효과가 미치는 긍정적 영향은 무엇인가? 부정적 영향은 있는가? 사업지원 이후 변화(정책, 제도 등) 사업지원이 역량개발분야에 미치는 긍정적/부정적 효과

1.3. 평가 영역의 각 항목 설정

- 중간평가 영역 및 평가항목은 국제개발협력 평가지침(국무조정실예규 제21호)및 평가 매뉴얼(국무조정실, '23.4)의 6대 평가영역 및 평가항목을 활용함.

평가 기준	평가 항목
적절성	수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합 사업 설계 및 구성의 적절성 환경변화 대응, 위험관리 적절성
효율성	사업비용의 효율성 사업 기간의 효율성 투입 대비 성과 달성 정도
효과성 및 영향력	계획한 산출물, 성과목표 달성 정도 사업성과의 취약계층 포용성 및 형평성 정도 사회경제제도에 대한 영향력

평가 기준	평가 항목
일관성	내적 일관성 외적 일관성
지속가능성	재정적 제도적 역량 여부 계획한 산출물, 성과목, 표 달성 정도 인적 역량 유지관리 체계 여부 계획대비 실제 지속가능성
적절성	수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합 사업 설계 및 구성의 적절성 환경변화 대응, 위험관리 적절성

1.4. 평가 기준 설정

○ 평가기준은 국제개발협력 평가지침 및 평가 매뉴얼의 평가 기준에 기반하여 5개 항목의 평가질문을 개발하여 활용함.

- 평가질문 개발

평가 영역	평가 항목	평가 질문 개발
적절성	수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합	사업목표 및 내용이 수원국 개발전략 및 수요와 적합한가? 사업설계 시 수요분석을 하여 사업 내용에 반영하였는가? 국제사회 개발 목표에 부합하는가? 우리 정부의 국제개발협력 기본계획, 국가협력전략 등에 부합하는가?
	사업 설계 및 구성의 적절성	PDM (Project Design Matrix) 상 활동, 산출물, 성과, 사업 목표 등 단계별 사업논리가 체계적이고 달성가능한가 시행기관의 기술적·제도적·재정적 역량을 고려할 때 사업이 실현가능한가? 주요 이해관계자의 우선순위가 사업목적, 사업논리, 이행수단에 반영되어 있는가?
	환경변화 대응, 위험관리 적절성	사업설계와 수행에 있어 경제, 사회, 환경, 평등, 정치, 문화, 역량 등 다면적 지원환경을 분석하고 고려하였는가? 사업기간 동안 발생한 환경 변화(분쟁 및 내전, 팬데믹, 자연재해, 수원국 정책 및 경제환경)에 따라 유동적으로 대응하였는가? 사전적 위험분석, 대응방안에 따른 관리가 이루어졌는가?

평가 영역	평가 항목	평가 질문 개발
효율성	사업비용의 효율성	사업 기획 시 계획한 비용 범위 내에서 사업이 완료되었는가? 항목별 자원배분은 적절하였는가? 필요시 항목 간 적절한 예산 전용이 있었는가?
	사업 기간의 효율성	각 단계별 일정이 계획된 일정대로 잘 진행되었는가? 환경변화 및 사업지연 시 문제해결을 위한 대응조치가 있었는가?
	투입 대비 성과 달성 정도	사업목표를 달성하기 위해 현재 지원수단과 방법이 최적의 수단인가? 혹은 더 나은 대안이 있는가?
효과성 및 영향력	계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	계획 대비 실제 산출물 달성도는 어느 정도인가? 계획대비 성과 달성도는 어느 정도인가? 산출물, 성과달성에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
	사업성과의 취약계층 포용성 및 형평성 정도	사업성과와 혜택이 수혜그룹 중 특히 취약한 계층에게도 공평하게 배분되었는가?
	사회경제제도에 대한 영향력	사업을 통해 직간접적으로 초래된 사회, 경제, 제도적, 환경적 차원의 긍정적/부정적/의도한/의도하지 않은 영향은 무엇인가?
일관성	내적 일관성	대상국가 내 다른 ODA 시행기관 사업과 연계되는가? 우리 정부의 기관 내 기타 사업과 연계되었는가? ODA 외 정책, 주요 국제규범 및 기준, 대외전략 등과 상호 보완성, 조화, 부가 가치를 고려하여 사업을 추진하였는가?
	외적 일관성	대상국가의 다른 사업과 연계되어 있는가? SDG 달성을 위해 국가 차원의 연계·조정메커니즘이 존재하는가?
지속가능성	재정적 제도적 역량 여부 계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	사업 수행 기관의 재정이 건전한가? 향후 사업을 운영 관리 할 수 있는 재정적 능력을 보유하고 있는가? 정부의 예산지원 계획은 명확한가?
	인적 역량 유지관리 체계 여부	운영, 유지관리를 위한 기술역량, 인력, 관리능력을 보유하고 있는가? 사업 지속가능성을 뒷받침할 기관 역량, 제도의 개선이 있는가?
	계획대비 실제 지속가능성	사업 종료 이후에는 사업의 긍정적 성과가 지속되는가? 성과 지속을 위한 조치가 필요한가? 성과지속을 저해하는 요인이 무엇인가 사업계획 단계에서 의도한 지속가능성과 사업종료 이후 실제 지속가능성이 어떤 차이가 있는가? 향후 잠재적 지속가능성이 담보되었는가?

1.5. 중간평가 매트릭스 설정

○ 세부평가질문을 확정하고, 세부평가 질문별로 지표, 자료출처, 분석방법 등을 개발하여 평가매트릭스를 제안함.

- 평가 매트릭스

평가 기준	평가 항목	세부 평가질문	측정 대상	자료 출처	분석 방법
적절성	수원국 정책 및 국가 발전계획과의 연계성	해당 사업은 수원국의 국가발전계획의 우선순위에 해당하는가?	수원국의 국가발전계획 내 주요 정책과제	수원국 정부 문서 (국가발전 계획, 개발전략 등)	수원국의 국가발전계획 내 주요 정책과제 중 관련내용 파악
	한국의 수원국에 대한 국별지원 계획 및 분야전략과의 부합성	- 해당 사업은 수원국 정부에 대한 지원정책의 우선순위와 부합하는가? - 해당 사업은 분야별 지원전략과 부합하는가?	- 수원국 국별협력전략 (CPS) 중 우선순위 전략 - 역량개발분야 전략	- 수원국 국별 협력전략 (CPS) - 분야별 지원전략	수원국 국별협력전략(CPS) 및 분야별 지원전략 우선순위 파악
	수원국 수요 반영 여부	사업 목표는 수원국 정부의 요청과 사업대상 기관의 수요를 반영하였는가?	사업대상 기관 수요 반영 결과	- 수원국 정부 사업요청서 - 사업관련 문서(사전 타당성조사 결과보고서 등)	사업대상기관 수요 반영 절차의 적절성 분석
	사업수행 기관 선정의 적절성	- 사업추진기반이 미흡하거나 지역에서의 사업수행 경험이 있는가? - 보완적인 분야별 전문성을 가지고 있는가?	- 사업수행기관의 주요 사업범위 - 사업수행기관의 설립목적 - 사업수행기관의 주요 사업 수행 경험 - 사업수행기관의 주요 활동분야	사업수행기관의 추진사업 관련 문서 또는 보고서	사업수행기관의 사업 관련 문서 획득 및 현황 분석
효율성	비용 대비 효과성	보다 적은 비용으로 동일한 산출물을 도출할	해당 사업의 비용(유사사업의 비용과	- 사업예산 내역서 - 기존	- 사업비용 비교분석 및 - 사업관계자

평가 기준	평가 항목	세부 평가질문	측정 대상	자료 출처	분석 방법
		수 있었는가?	비교)	유사사업 평가보고서 • 사업관계자 면담결과	면담
	사업 수행의 효율성	• 사업 활동이 목표한 기한 내 정해진 비용으로 이루어졌는가?	• 목표 대비 사업이행현황	• 사업집행 계획서 • 사업집행 내역서	• 사업 활동의 목표 기한 내 추진현황 확인
	사업 참여자의 효율적 의사소통	• 사업 수행 과정에서 수원국 정부 관계자와 사업수행기관의 지속적인 의사소통이 이루어졌나? • 사업 진행과정 및 결과에 대해 사업수행기관은 고용부와 정보를 공유하고 충실하게 보고하는가?	• 수원국 정부 관계자와 사업수행기관 간의 협의방법(주 기, 절차, 주체 등) • 고용부와 사업수행기관 간의 보고방법(주 기, 절차, 주체 등)	• 협의 관련 자료 • 사업관계자 면담결과	• 협의자료, 사업관계자 면담을 통해 의사소통의 효율성 분석
일관성	사업의 연계 여부	• 사업이 타 기관과 연계되었나? • 사업의 배분이 일관되었나?	• 타 사업과의 연계	• 사업계획서 • 사업결과 보고서	• 문헌 및 면담자료 분석
	사업의 시너지효과 고려	• 사업의 시너지 효과는 있었나?	• 시너지 효과 사례	• 사업결과 보고서	• 자료 분석
효과성	목표 달성 여부	• 사업의 성과 및 창출된 효과는 무엇인가? • 사업을 통해 해당 역량이 향상되었는가? 근거는 무엇인가?	• 사업성과 만족도 • 인력의 DB활용숙련도	• 사업결과 보고서 • 설문 및 면담 분석 자료	• 설문 및 면담조사
	사업의 목적 달성 여부	• 사업의 목적은 달성되었나?	• 사업계획대비 결과 • 현지면담	• 사업결과 보고서 • 면담, 설문 자료 분석	• 문헌 및 면담조사
	사업의 산출물	• 사업의 실적은 무엇인가?	• 현재 상황 자료	• 현지 전문가 자료	• 현지 자료 확인
영향력	사업의 파급효과	• 현지 정부에 직접적인 효과는 있었는가?	• 타 활용 자료 근거 • 면담 및 문헌 등	• 설문 및 면담 자료분석	• 자료 확인

평가 기준	평가 항목	세부 평가질문	측정 대상	자료 출처	분석 방법
		• 현지 정부에서 효과는 어떤 것이 있는가?	• 구체적인 사례	• 우수사례	• 문헌 및 면담
지속 가능성	사후관리 계획 (수원국 및 공여국 후속조치) 수립 여부	• 한국은 사업종료 이후 후속조치 계획을 수립하고 있었는가? • 수원국 정부부처는 사업종료 이후 사후관리 계획을 가지고 있었는가?	• 사후관리 계획 내용 • 수원국 정부부처의 사후관리계획 내용	• 고용부의 사후관리 계획 • 수원국 정부부처의 사후관리 계획	• 문서 및 면담을 통한 사업 종료 이후 사후관리 계획 확인
	지속적인 파트너십	• 사업 종료 이후 한국과 수원국 간의 파트너십을 유지할 통로가 있는가? • 향후 사업 추진 시 한국 인력이 참여할 수 있는 통로가 있는가?	• 한국과 수원국 간의 파트너십	• 사업 종료 이후 한국과 수원국 간의 협력 관련 자료	• 문서 및 면담을 통한 사업 종료 이후 한국과 수원국 간의 협력여부 및 그 형태 확인
젠더	사업 기획 시 성주류화 고려 여부	• 젠더관계 및 성평등에 대한 고려가 사업의 기획단계에서부터 있었는가?	• 사업 기획 시 젠더 고려 여부	• 사업계획서 • 사업 중간 및 종료보고서 • 사업관계자 면담결과	• 보고서 확인 및 사업관계자 면담을 통한 사업의 환경 부정적 영향 여부 확인
환경	사업 수행 과정상의 환경영향 고려 여부	• 사업 수행에 있어서 주위의 환경오염을 야기하는 반환경적 행위는 없었는가? • 사업 수행결과 지역 환경에 부정적인 영향을 야기했는가?	• 사업 수행 시 반환경적 행위 발생 여부	• 사업 중간 및 종료보고서 • 사업관계자 면담결과	• 보고서 확인 및 사업관계자 면담을 통한 사업의 환경 부정적 영향 여부 확인

1.6. 평가지표 개발

○ 평가지표는 국제개발협력 평가지침(국무조정실예규 제21호)및 평가 매뉴얼(국무조정실, ' 23.4)에 의거하여 평가 기준에 따라 평가를 실시

- 평가 기준별 점수체계

기준	항목	구분	평가값				
적절성	수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합성	매우 적절	4	4	3	2	1
		적절	3				
	사업 설계 및 구성의 적절성	일부적절	2	4	3	2	1
	환경변화 대응, 위험관리 적절성	미흡	1	4	3	2	1
효율성	사업 비용의 효율성	계획된 비용 범위 내 완료	4	4	3	2	1
		계획된 비용의 101%~120%	3				
		계획된 비용의 121%~150%	2				
		계획된 비용의 150% 초과	1				
	사업 기간의 효율성	계획된 비용 범위 내 완료	4	4	3	2	1
		계획된 비용의 101%~120%	3				
		계획된 비용의 121%~150%	2				
		계획된 비용의 150% 초과	1				
	투입대비 성과 달성 정도	매우 효율적	4	4	3	2	1
		효율적	3				
		일부 효율적	2				
		미흡	1				
효과성 / 영향력	계획한 산출물, 성과 목표 달성 정도	당초 계획의 90% 이상 달성	4	4	3	2	1
		70% 이상 90% 미만 달성	3				
		50% 이상 70% 미만 달성	2				
		50% 미만 달성	1				
	사업성과의 취약계층 포용성 및 형평성 정도	매우포용적	4	4	3	2	1
		포용적	3				
		일부 불평등	2				
		매우 불평등	1				
	사회·경제·제도에 대한 영향력	매우 중대함	4	4	3	2	1
		중대함	3				
		일부 중대함	2				
		미흡	1				

기준	항목	구분		평가값			
지 속 가 능 성	제도적·재정적 역량 여부	매우 지속가능	4	4	3	2	1
	인적역량·유지관리 체계 여부	지속가능	3	4	3	2	1
		일부 지속가능	2				
	계획 대비 실제 지속가능성	지속불가능	1	4	3	2	1
일 관 성	내적 일관성	매우 일관적	4	4	3	2	1
		일관적	3				
	외적 일관성	일부 미흡	2	4	3	2	1
		미흡	1				

2. 스리랑카 직업기술교육훈련 역량강화 사업 현황

2.1. 스리랑카 직업기술교육훈련 역량강화 사업(2022~2024년) 개요

- 사업 부처 : 고용노동부
- 세부사업명 : 개도국 고용노동분야 개발협력(ODA)
- 내역사업명 : 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업
- 사업 유형 : 프로젝트
- 사업 총예산 : 21.5억 원 / 양자 무상
- 신규/ 계속 : 신규 사업
- 총 사업 기간 : 2022년 ~2024년
- 사업수행기관: 한국산업인력공단
- 사업 내용¹⁾

구성단위	주요 활동 내역	결과물/산출물
노동시장 수요맞춤형 교육환경 개선	1.1. 훈련 장비 공급(3개 공과) 1.2. 노후 설비 유지 보수	• 훈련 장비 목록(3개 공과) • 시설 개선(3개 공과)
노동시장 수요맞춤형 훈련 프로그램 개편	2.1. 훈련원 운영 개선방안 자문 2.2. 노동시장 수요 맞춤형 교육 과정 개발 2.3. 교육교재 개발지원 및 콘텐츠 제공	• 니야가마 국립직업훈련원 운영개선안(국·영문) • 교육과정 개발 결과물(영문) • 교재 개발(영문)
직업훈련교사 역량강화 및 시범과정 운영	3.1. 훈련교사 역량 강화 3.2. 기업 연계 맞춤 훈련 시범 과정 운영 3.3. 귀국근로자 취업훈련 시범 프로그램 운영	• 교사초청연수(3개 공과, 9 명, 3개월) • 시범 과정 현지운영(3개 공 과, 20명, 6개월) • 귀국근로자 취업과정(15명, 3개월)

1) 출처 : 『스리랑카 노동시장 수요기반 직업훈련 역량강화사업』 2023년도 사업 세부 실행계획(안)

○ 성과 지표

성과 지표	목표치	2023 목표치 산출 근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집 방법 또는 자료출처
	2023			
졸업생 취업율	5%	기준년도 대비 매년 5%p 증가	$\frac{\text{해당직훈련 3개 지원공과 취업자 수}}{\text{해당직훈련 3개 지원공과 졸업생 수}} \times 100$	해당 국가 직훈련 자료, 사업성과 보고서
졸업생 교육훈련 만족도	80%	5점 척도 평가 중 평균 3.5 이상	$\frac{\text{5점 척도 평가 중3.5점 이상 응답자 수}}{\text{해당직훈련 3개 지원공과 졸업생 수}} \times 100$	참여자 대상 설문 조사, 사업성과 보고서

2.2. 스리랑카 직업기술교육훈련 역량강화 사업 중간평가

- 평가배경 및 목적 : 2023년도 사업 사업비 상위 20% 수준 이내 사업이며, 중점협력국 및 협력분야(교육)에 해당. 중간평가를 실시하여 동 사업의 3단계(2024년)과업의 성공적인 완수를 위한 제언 도출 및 향후 추진될 후속사업을 위한 교훈 도출 목적
- 평가대상 및 범위 : 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량 강화(스리랑카) (2022 ~ 2024년/ 21.5억)
- 평가 구분 : 외부평가
- 평가 시기 : 중간평가
- 평가 대상 : 프로젝트/프로그램 평가
- 평가기준 : 국무조정실(2023년 4월 개정)에서 제시한 국제개발협력 평가지침 및 평가 매뉴얼에 의해 6대 평가기준(적절성, 효율성, 효과성/영향력, 지속가능성, 일관성)
- 기대성과 : 사업 진행사항 점검, 집행과정의 효율성, 제언사항 도출 등
- 해당 사업의 관련 공무원과의 사전면담 결과 상기 사업이 수행 기간 중 2021년, 2022년이 스리랑카의 부도 사태, 코로나19의 여파로 사업

추진에 심각한 영향을 받아 사업이 지연되고 있었음.

- 본 중간 평가는 2022년 및 2023년 진행 사업에 대한 평가를 추진하였음. 2022년 자료 및 2023년 연수 간담회 결과 및 심층면담의 산출물 결과를 통해 평가했음. 따라서, 본 연구가 목표한 사업의 적절성과 효율성은 평가가 가능함.
- 그러나 현재의 사업 추진 상황에서는 효과성, 영향, 지속가능성의 측정과 평가는 확보할 수 없음. 사업 산출물의 생산과 인과관계를 갖는 효과성 및 영향은 산출물이 아직 생산되지 않은 상황에서 측정 및 평가가 상대적으로 어려움.

○ 이번 사업의 평가 방법은 다음과 같음.

- 사업 적절성은 수원국의 본 사업의 개입 정도와 목표와의 부합성을 확인하고 수원국 및 수혜자의 요구가 본 사업을 통해 충족될 수 있는지 검토·평가함.
- 사업 효율성은 기 문서를 정량평가를 실시하고, 이를 기반으로 2023년 시행한 사업에 참여한 해당 국가의 대상자를 대상으로 진행한 심층면담 및 간담회 결과를 통해 사업 산출물 생산에 대한 정성평가를 진행하였음.
- 사업 일관성은 본 사업이 수원국내 기 실시된 우리정부 지원 사업, 타 공여기관의 유사사업, 수원국 주도 정책사업과 연계를 통해 시너지를 창출할 수 있는지를 문헌자료를 통해 확인하고 연수참여자 대상 면담조사(대면·비대면 면담 및 서면응답)를 통해 관련사항을 평가함.
- 따라서 효과성, 영향, 지속가능성의 평가주제에 대해 현재 상황을 조사하고 그 결과를 전망하였음.

3. 기능경기 역량강화 사업 현황

3.1. 기능경기 역량강화 사업(2021년~2023년) 개요

- 사업 부처 : 고용노동부
- 세부사업명 : 개도국 고용노동분야 개발협력(ODA)
- 내역사업명 : 개도국 노동시장수요 기반 직업기술교육훈련(TVET) 역량강화
 - 해당 개도국 : 필리핀, 라오스, 아제르바이잔 (3개국)
- 평가 시기 : 중간평가
- 평가 대상 : 프로젝트/프로그램 평가
- 사업 총예산 : 25.5억 원/ 양자 무상
- 신규/ 계속 : 신규 사업
- 총 사업 기간 : 2021년~2023년
- 사업수행기관: 한국산업인력공단
- 목적 : 한국형 기능경기 시스템 모델을 개발도상국에 전수하여 숙련 기술인력 양성 및 직업훈련 역량강화를 지원함으로써 개발도상국의 산업발전 및 경제성장 지원
- 주요 내용 : 개도국 기능경기 역량강화를 위한 관계자 초청연수, 국내 전문가의 현지 파견, 기능경기 제도개선 및 대회운영 지원 등
- 2023년 개도국 기능경기 역량강화 사업(K-STAR) 추진 주요 내용
 - (주요내용) 기능경기 초청연수(135명 이상), 전문가파견(24명 이상), 정책자문 등

대상국가	필리핀	라오스	아제르바이잔
중점 방침	World Skills ASEAN 고성과 달성, 국내 노하우·BP 전수	'23년 국내대회 개최 및 World Skills ASEAN 출전 지원	World Skills Asia 출전 및 직업훈련센터 활용 과정 개발 지원
초청 연수	10개 직종·40명(6월), 관리자 5명(10월)	10개 직종·40명(6월), 관리자 5명(10월)	관리자 5명(10월), 10개 직종·40명(11월)
전문가 파견	3월, 7개 직종·8명	3월, 7개 직종·8명	8월, 7개 직종·8명
기타 활동	한국대회 준비과정· 노하우 전수	라오스 전국대회 개최 지원 (정책자문, 재료지원 등)	-
공통	디지털 아카이브·NCS-WSOS 훈련모듈 등을 활용한 비대면 교육 실시, 국내대회 기간 중 관리자 초청, 전문가 자문, 관계자 업무협의 등		

○ 2023년 개도국 기능경기 역량강화 초청연수 개요

- (연수대상) 개도국 기능경기 관련 대표선수, 지도교사, 지도위원 등
- (연수기간) 2~4주(평일: 훈련 실시, 주말: 자율훈련 및 문화체험 등)
- (연수장소) GIFTS, 국제지도위원 소속 사업장(GIFTS 내 연수가 불가능한 경우) 등
- (주요내용) 국제지도위원의 직종별 기술·노하우 전수, 국제대회 대비 모의훈련 실시, 국내 선수들과의 합동훈련, 지도위원 간 기술교류, 국제협력 등
- (지원사항) 항공권, 숙식, 연수강사·재료비 등 초청연수에 필요한 제반 경비

○ 만족도 : 본 사업 후 설문조사 결과를 제시하면, 2021년(비대면) 대비 2022년 만족도는 4.5%(0.42점) 증가하였음.

3.2. 기능경기 역량강화 사업 중간평가 방향 설정

- 평가기준 : 국무조정실(2023년 4월 개정)에서 제시한 국제개발협력 평가지침 및 평가 매뉴얼에 의해 6대 평가기준(적절성, 효율성, 효과성/영향력, 지속가능성, 일관성)

○ 기대성과 : 사업 진행사항 점검, 집행과정의 효율성, 제언사항 도출 등

○ 전략적 ODA 추진 체크리스트

구분	연번	점검항목	체크	결과
필수 항목	1	ODA 중점협력국 대상 사업인가?	○	필리핀, 라오스, 아제르바이잔
	2	(중점협력국 대상 사업일 경우) CPS 중점협력분야에 해당 되는가?	○	라오스 : ③교육
	3	수원국 국가개발계획상 정책적 우선순위가 높은 분야와 관련된 사업인가?	○	아제르바이잔 직업교육훈련 분야에 관한 전략적 로드맵(2016-2020)
	4	수원국의 수요가 수원총괄기관을 통해 확인되었는가?	○	*관계기관 공문 접수
	5	지속가능개발목표(SDGs) 17개 항목 중 연계되는 항목이 있는가?	○	SDG 4 교육 SDG 8 경제성장
	6	ODA 기본 정책, 대외전략 등 우리 정부의 정책 방향과 연계되어 있는가?	○	신남방·신북방 정책
선택 항목	7	여타 공여국 또는 국제기구가 추진중인 사업과 중복되지 않는가?	○	중복되지 않음
	8	여타 공여국·국제기구 사업과 연계 가능성이 있는가?	×	-
	9	사업관리의 효율성을 고려한 적정규모의 사업인가?	○	적정함

○ 평가배경 및 목적 : 2023년도 사업 사업비 상위 20% 수준 이내 사업으로, SDGs 4(미래역량개발을 위한 직업기술교육)의 전략적 이행을 위한 중요사업으로 평가 효과성과 필요성이 높음. 연수사업에서 개발컨설팅 사업으로 전환 후 중간평가를 실시하여 사업의 지속가능성 제고 및 후속사업의 효과성·효율성 제고 목적

○ 평가대상 및 범위 : 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화(필리핀, 라오스, 아제르바이잔). 사업 진행사항 점검, 집행과정의 효율성, 지속가능성 및 개선사항 도출 등

○ 평가 구분 : 외부 평가

○ 평가 시기 : 중간평가

○ 평가 대상 : 프로젝트/프로그램 평가

○ 성과 지표 및 목표치 : 라오스, 아제르바이잔

성과 지표	현황	목표치		2022 목표치 산출 근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집 방법 또는 자료출처
	2021	2022	2023			
대회 개최	-	-	1회	자체 기능경기 대회 개최 목표	국내 기능경기대회 개최 횟수	수원국 자료
기능 향상도	30%	35%	40%	전년대비 연수 참가자 역량제고	$\frac{\text{연수 후 기능수준 증감}}{\text{연수 전 기능수준}} \times 100$	기초선·종료선 조사

○ 성과 지표 및 목표치 : 필리핀

성과 지표	현황		목표치		2022 목표치 산출 근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집 방법 또는 자료출처
	2019	2020	2022	2023			
기능 향상도	-	30%	35%	40%	전년대비 연수 참가자 역량제고	$\frac{\text{연수 후 기능수준 증감}}{\text{연수 전 기능수준}} \times 100$	기초선·종료선 조사
국제 대회 입상 직종 수	2 직종	-	3 직종	-	전 국제대회 대비 입상 직종 수 증가 (+1개 직종)	입상 직종 수	수원국 자료

○ 평가 방법

- 사업 적절성은 수원국 개발정책 및 지역 정책을 분석(문헌분석)하여 본 사업의 개입과 목표와의 부합성을 확인하고 해당 사업이 관련 정책요구에 부합하였는지 검토·평가함.
- 사업 효율성은 기 제출된 연수사업 결과 보고서의 검토(문헌분석) 및 연수참여자와의 면담조사(현장방문)를 통해 사업 산출물 수량 및 품질을 분석·평가함
- 사업 효과성 및 영향은 상기 연수사업 면담조사 자료를 토대로 임의로 선정된 연수 참가자와 면담을 진행하여 평가함
- 사업 일관성은 본 사업이 우리정부 지원사업, 타 공여기관의 유사사

업, 수원국 주도 정책사업과 연계를 통해 시너지를 창출할 수 있는지를 문헌자료를 통해 확인(문헌분석)하고 연수참가자와의 면담조사를 통해 관련사항을 평가함

- 지속가능성 관련사항은 우리정부 무상원조 실행 계획(문헌분석)과 연수기관의 향후계획 등에 대한 면담 결과를 토대로 평가함

○ 기대성과 : 본 사업은 한국형 기능경기시스템 모델을 개도국에 전수하여 산업수요에 맞는 숙련 기술인력 개발과 기술교육훈련(TVET) 품질제고 국내·외 산업기술격차 해소를 통한 수원국의 산업발전 및 경제성장 도모

○ 기능경기 역량강화 사업 평가의 한계

- 본 사업의 산출물은 연수사업 시행기관(한국산업인력공단)이 전담하고 체계적으로 수행한 바 사업의 효율성, 일관성, 지속가능성에 대한 평가를 진행함.
- 본 연수사업 참가자가 본 사업에 참여하며 지식과 정보를 습득하며 역량이 강화된 측면을 사업의 효과로 설정할 수 있으나, 세 개의 국가 중 아제르바이잔의 경우 면담조사 및 만족도조사에 소극적인 자세를 지녀 일부 참가 연수자의 면담이 용이하지 않은 점이 있었음.
- 더불어, 본 연수사업은 다국가 참여자를 대상으로 하고 있어 국가별로 상황이 달라서 국별 직업기술현안을 분석하여 본 연수사업 결과와 일원화된 적절성을 평가하기는 어려움.

○ 기능경기 역량강화 사업 단계별·산출물별 목표 수정

- 본 연구를 통해 도출된 본 사업 중간평가 결과를 근거로 사업기간 내 달성 가능한 사업 산출물과 성과목표 및 관련지표를 설정하고 향후 사업적용 가능한 변화에 대해 적용가능성 및 타당성을 논의함.

Ⅲ. 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업 중간평가

1. 적절성

1.1. 적절성 평가 기준과 중간평가 결과

평가 기준	평가 항목	평가값			
적절성	수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합	④	3	2	1
	사업 설계 및 구성의 적절성	4	③	2	1
	환경변화 대응, 위험관리 적절성	4	3	②	1

* 매우 적절 4, 적절 3, 일부 적절 2, 미흡 1

- 국제개발협력 사업이 협력대상국의 개발 우선순위·수요·정책, 우리 정부의 정책, 지원환경 및 변화에 부합하는 정도를 나타냄.
- 평가대상 사업이 SDGs 등 국제사회 개발목표를 반영하는지와 초기 사업설계와 구성의 적절성도 함께 평가하여 등급을 부여함.
- 수원국인 스리랑카의 수요 개발과정이 적합한 것으로 판단되고 사업의 설계 구성도 상대적으로 적절한 것으로 판단됨. 하지만 스리랑카의 국내 사정에 따라 사업 지연이 발생함에 따라 이에 대한 위험관리 방안을 마련해야 할 것으로 판단됨.

1.2. 수원국 개발전략 및 수요의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합 : 중간평가 결과 4점

- 수원국은 종합적인 직업훈련을 통해서 일자리 공급에 중점을 두고 있고, 본 사업을 통해서 효율적인 직업훈련사업으로 진행되도록 절대적

인 도움이 되고 있음.

○ 수원국의 인적자원개발전략과 부합됨.

- 스리랑카는 Vision 2025에 따라 일자리 100만개 창출을 주요 정책 목표로 설정하고 인적자원개발을 우선 정책과제로 추진²⁾
- 스리랑카 직업훈련청(VTA)에서 노동시장 수요에 부응하는 인력양성을 위한 Niyagama 국립직업훈련원³⁾의 역량강화 지원 요청
- 훈련과정의 최신화, 훈련 인프라 개선 및 교사의 역량 개발 등 양질의 직업훈련을 제공하기 위한 후속 역량강화 사업의 필요성 대두
- 이 사업의 목적은 스리랑카의 직업훈련 인프라 개선 및 역량강화를 통한 숙련기술인력양성, 노동시장의 미스매치 해소 및 경제성장 도모

○ 본 사업의 추진결과도 ODA의 절차를 준수한 것으로 판단함.

- 스리랑카의 사업요청서(PCP : Project Concept Paper)를 공식적으로 접수(2021.1)⁴⁾
- 제안사업의 범위와 기대효과 및 지속가능성 등 분석을 통해 사업의 사전 타당성 조사를 실시, 무상원조(ODA) 시행계획을 제출(2021.2)
- 해당 사업 ' 22년 국제개발협력사업 시행계획 확정(2022.1)
- 스리랑카 정부⁵⁾ 및 수원기관(VTA)과 프로젝트 개요 공유 및 반입되는 훈련 장비, 기자재 등 면세보장 등 수원국 분담 사항 논의를 위한 2차 회의실시(2022.2)
- 우리나라 ODA 지원 중 직업훈련에 대한 비중이 높고 전략적으로 접근하고 있는 지원 사업임. 스리랑카 정부도 직업훈련에 중점을 두고 있어, 양국간의 해당 사업에 관한 지원전략이 부합한다고 판단함.
- 우리정부의 직업훈련 ODA 지원전략과 스리랑카의 해당 사업에 대한 기존 환경의 적합 정도가 상당히 높은 것으로 판단됨.⁶⁾

2) 출처 : 2022년 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화사업 기본계획(안) 1-2쪽

3) 『스리랑카 Niyagama 직업훈련원 개선사업』(EDCF 사업, 878만불, 기간 : 2006년~2010년)

4) 출처 : 2022년 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화사업 기본계획(안) 1쪽

5) 직업능력개발·직업교육·조사혁신부 (MOSTR, Ministry of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation)

□ 스리랑카 직업훈련청(Vocational Training Authority)

- 소속 부처: 기술개발 직업교육연구 및 혁신부
- 설립근거: 1995년 스리랑카 직업훈련기관법 제12호에 따라 설립
- 비전
세계 고용시장에 부응하는 스리랑카에서 가장 역동적이고 혁신적인 직업훈련 제공자가 되는 것
- 미션
직업교육훈련과 수단과 기술을 통해 개인의 역량을 개발하여, 국제적으로 요구하는 숙련된 고용 수요충족을 촉진한다.
우리는 서비스와 시설에서 최고 수준을 설정하고 글로벌 고용가능성 동향에 초점을 맞추므로써 이 사명을 실천한다.
- 기능
직업훈련 프로그램을 준비하고 자격을 갖춘 청년들에게 직접, 국가 또는 민간 대리기관을 통해 취업을 위한 직업훈련 제공
직업훈련을 받은 훈련생에게 국가시험을 실시하고 인증서를 발급
직업훈련에 관한 연구 및 개발
직업훈련원 형식적 기준 유지를 위한 점검 및 감독
직업훈련 시설장비에 대한 주문 및 수수료 등 비용 청구
직업훈련청 기능에 필요한 동산 부동산의 취득, 제공, 임대 등
직업훈련청 훈련생 및 직원에 대한 금전적 지원 및 복지시설 이용
기관 목적 달성을 위한 계약 체결
직업훈련 대상자로 선발된 도제에 대하여 사업주와 직업훈련 협약체결 및 직업훈련청 등록
직업훈련청의 실습생에게 직업훈련을 제공하고자 하는 각 사업주는 연수생과 약정을 체결하고 동 약정을 직업훈련청에 등록할 것을 인가
진로지도 프로그램을 시행하고 상담
- 직업훈련청 산하 교육센터 현황(규모)

구 분	2021년	2020년	2019년
총계	213	216	216
국립 직업훈련원	8	8	8
지구 직업훈련 센터	22	22	22
직업훈련센터	179	181	181
기타	4	5	5

- 직업훈련 실시 현황(2019~2020)

(단위: 명)

구 분	2021년	2020년	2019
입학생 수	33,416	23,455	37,936
수료생 수	8,320	17,349	30,674

경제적 타당성 ⁷⁾	국가 관점 경제효과	스리랑카 인구조사 및 통계국이 실시한 지역별 청년실업률 조사 결과를 보면 남부 지역이 31.5%로 가장 높은 실업률을 기록하고 있어, Galle 지역 청년 등에 양질의 직업기술교육훈련을 제공하고 기업과 연계한 훈련기회를 제공함으로써 취업률을 높이고 실업 해소 기대
	기업 관점 경제효과	양질의 기능인력 및 숙련인력 확보를 통해 생산성 제고
	경제사회 통합관점 경제효과	연간 수 만명에 이르는 스리랑카로 귀국하는 이주노동자에 대한 재취업·기술향상 교육훈련과정 운영을 통해서 이들의 경제·사회적 통합을 지원하는 효과 기대
기술적 타당성	수행기관 측면	직업능력개발(TVET)분야에 전문성을 보유한 한국산업인력공단의 사업수행에 기술적 타당성 확보
	수원기관 및 대상지역 측면	Niyagama 직업훈련원은 2006~2010년 유상원조(EDCF)로 지원된 환경개선 사업의 후속으로 역량강화를 지원받음으로써 직업훈련의 품질 제고를 통한 ODA 사업의 지속가능성과 효과성 제고 기대

- 하지만 스리랑카 정부의 정치적 불안정이 상존하고 있고 코로나19로 직업훈련이 지연되거나 온라인으로 개설되는 한계가 발생함. 이러한 환경변화로 직업훈련의 질이 다소 하락되었을 것으로 추정됨.

1.3. 사업 설계 및 구성의 적절성 : 중간평가 결과 3점

- 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화 사업⁸⁾은 무상 원조사업(ODA)으로 사업기간은 2022~2024년이며, 총 예산은 21.5억(1차년도: 10.5억 2차년도 : 9.41억 3차년도 : 1.59억)임.
- 대상국가와 지역은 스리랑카 골(Galle) Niyagama 훈련원임.
- 주요내용은 스리랑카 산업 및 기술 수요에 부응한 인력 양성을 위한 Niyagama 국립직업훈련원(EDCF 사업으로 건립)의 교육훈련 인프라 개선 및 훈련 직종 개발·교과과정 최신화, 훈련교사 역량강화 지원임.
- 직업훈련 과정 최신화·훈련 역량강화 : 현지 직업기술교육훈련(TVET) 시스템 심층 분석을 토대로, 업종별 기업의 수요를 기반으로 한 과정 설계·교보재 개발, 훈련교사 역량강화 프로그램 운영

7) 출처 : 2022년 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화사업 기본계획(안) 9쪽

8) 출처 : 2022년 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화사업 기본계획(안) 1쪽

- 훈련원 인프라 개선·리모델링 : 스리랑카 산업 및 기술 수요에 부응하기 위한 훈련원 교육훈련 시설·장비 현대화 등 지원
- 기업 연계 맞춤 훈련 과정 : 기업 연계 맞춤 훈련과정, 귀국 이주노동자의 노동시장 재통합을 위한 재취업·기술향상 교육훈련 프로그램 등 개발·운영 지원

○ 사업설계와 구성이 현지 국가의 수요를 적절히 반영하여 설계됨.

- 세부 사업 내용으로는 첫째, 교육환경 개선으로 현지에 적합한 기자재 목록 선정을 위해 PM이 착수조사 시 스리랑카 산업 현황 및 수원기관 관계자 의견 등 심층 분석⁹⁾을 함.
 - PM은 내·외부 국제개발협력사업 인력풀을 우선 활용하여 선정하되, 사업 총괄, 장기간 파견, 보고서 작성 등 업무수행
 - ODA 사업임을 감안하여 수원기관 의견을 충분히 반영하여 예산 범위 내 3개 공과 외 원활한 훈련원 운영을 위한 기자재 등 추가 지원
- 둘째, 훈련원 운영 개선방안으로 스리랑카의 산업구조 변화 및 기업에서 요구하는 기술 수준에 부응하기 위한 직업훈련원 운영을 위한 개선방안 제시
- 셋째, 노동시장 수요기반의 과정 및 교재 개발로 기업이 요구하는 실무능력을 갖추도록 기업 맞춤형 교육과정 및 교재 개발
- 넷째, 직업훈련교사 역량강화로 훈련교사를 대상으로 직무 수행능력 향상을 위해 초청 연수 실시
 - 공과에 해당하는 분야 산업시찰 등 초청 연수프로그램에 포함하여 운영
- 다섯째, Pilot 훈련과정 운영으로 노동시장(기업) 수요기반의 숙련 기술자 양성 및 귀국근로자의 재정착 지원을 위해 기업 맞춤형 및 취업연계 훈련과정 시범운영

○ 기자재 지원은 스리랑카의 현지 사정을 조사하고 산업인력공단에서

9) 출처 : 2022년 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화사업 기본계획(안) 3쪽

내부적으로 검토하여 적절하게 진행되고 있음. 다만 코로나19 기간에는 모든 일정이 지연되었음.

- EDCF가 건립한 훈련시설에 기자재를 공급하고 훈련교사를 훈련시키는 사업이었는데도, (고용노동부에서는 처음으로 유무상 연계가 시행된 것이기는 하지만,) 시설을 건립한 것 이외에는 시간적인 차이로 특별한 연관성을 가지고 있지 못함.
- 귀국근로자훈련프로그램을 2024년도에 실시하기 위해서 준비하는 단계임. 귀국근로자의 수요를 세밀하게 파악하는 별도의 작업이 필요하고 현지의 노동시장에 대한 수요적인 요인이 파악되어야 함. 수원국의 수요에만을 고려하다 보면 기자재 추가 공급이나 훈련직종의 세분화 정도로 사업의 퀄리티가 그칠 가능성이 큼. 귀국근로자는 양자간 임금의 차이로 통상 자영업을 시작하기를 바라는 추세라는 점도 사업 수행 전에 참고해야 할 사안임.
- 이번 한국에 방문한 스리랑카 공무원 3인과의 면담결과¹⁰⁾, 한국의 장점과 단점을 인지하고 스리랑카에 적합하게 적용하기 위해서 노력하고 있는 것을 알 수 있음.

• 본인이 느낀 한국의 직업훈련의 장점과 단점은?

장점

민간 부문 참여

직업훈련 교육의 50%는 민간 부문이, 나머지 50%는 정부가 커버해, 예산 할당이 좋음.

실력 좋은 교사들

민간 부문과의 협력

수준 높은 기술력

세계적 인정을 받음.

단점

자격증 시스템이 통합되어 있는 것 같지 않음. 자격증을 발급해주는 기관의 수준에 따라서 자격증의 수준도 달라지는 것 같음.

호텔, 조리사 등 서비스직 직업훈련이 있는지 모르겠음.

수준 높은 기술을 가지고 있으나, 영어 교육이 더 잘 되어서 교사들이 영어로 교육할 수 있다면 더 좋을 것 같음. 영어만 하면 더 크게 성장할 수 있지 않을까 함.

10) 스리랑카 공무원 대상 직업기술교육훈련 역량강화 면담조사 개요

(대상) 스리랑카 공무원 3명, (면접일) 2023년 11월 5일

(목적) 고용노동부가 지원하고 있는 스리랑카 직업훈련원 개선사업(교육훈련 인프라 개선, 교육과정 지원 등)의 중간평가

인력이 부족함. 성비가 잘 안 맞는 것 같음.
한국 교육 시스템이 너무 성적 중심인 것 같음.

- 스리랑카 직업훈련을 한국과 비교하였을 때 어떻게 평가하십니까?

스리랑카는 한국처럼 신기술이 많이 들어오지는 않았음.
교사들이 신기술과 교수법에 더 많이 노출되고 경험해야 함.
장비들도 오래됐음.
AI에 더 많은 노출이 필요함.
취업 전략이 필요함.

- 이번 연수 프로그램 중 가장 기대하고 있는 프로그램은 무엇인가요?

한국산업인력공단과 스리랑카 사업의 발전을 위해 가진 간담회
공단에서 요청사항을 긍정적으로 검토해줘서 좋았음.


1.4. 환경변화 대응, 위험관리 적절성 : 중간평가 결과 2점

- 코로나19로 양국간의 인적 교류가 단절되고, 스리랑카 정부의 정치적인 불안으로 사업의 어려움이 발생하고 있음.
 - (수요국가 정세 불안) 스리랑카 국가부도 등 경제위기 장기화 및 대통령 퇴진('22.7.10.) 등 외부 환경요인 악화로 사업추진 약 1년 지연
- 사업기간이 3년임에도 불구하고 대부분의 사업이 2년차 중간에 시작되거나 3년차에 계획되기도 함.
- 하지만, 사업주체는 최대한 일정에 맞추어 진행하고 있어, 사업기간내에 종료가 가능할 것으로 예상되고, 연수계획도 차질 없이 진행되고 있음.
- 코로나로 인한 이동제약에도 불구하고 온라인을 진행한 것이나 파견가지 못한 대신 현황분석 등은 대처를 잘한 것으로 판단됨.
 - 코로나로 인한 전 세계 팬데믹 상황에서 사업 지연이 발생했음에도 불구하고, 온라인 연수 등을 통한 사업을 적절하게 진행한 것으로 평가됨.
 - 현지 파견이 제한된 상황에서 문헌 자료를 통한 현황분석에 치중한

것은 적절한 대응인 것으로 평가됨.

- 양국 간에 사업추진 거버넌스가 설정되어 환경변화와 위험 관리에 적절하게 대응한 인프라를 지닌 것으로 판단함.

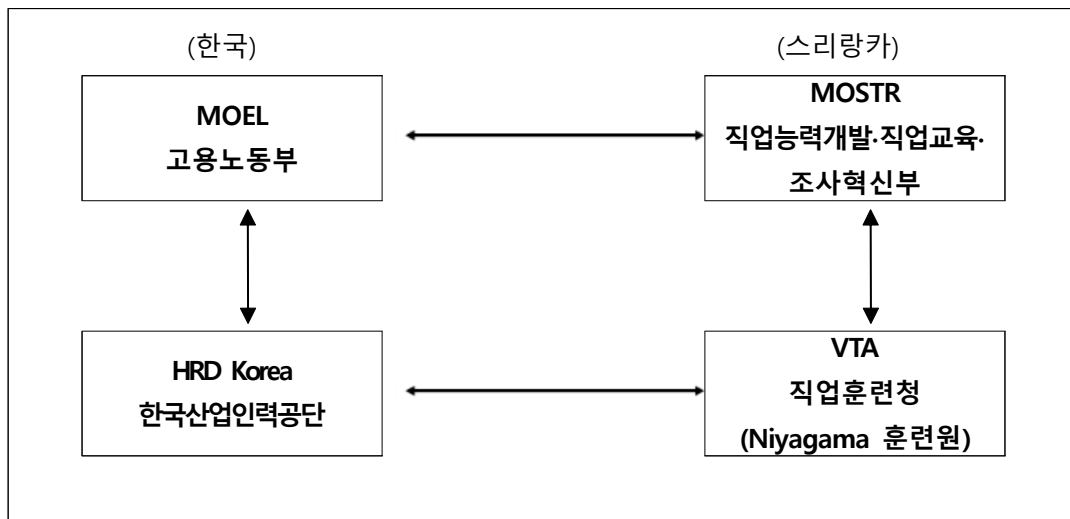[그림 3-1] 기관간 사업추진 거버넌스 체계도¹¹⁾



<스리랑카 노동시장 수요기반 TVET역량강화 사업 - 환경적 타당성 분석결과>

환경적 타당성	환경에 미치는 영향	기존 직업훈련원의 기능과 역량강화를 지원하는 사업으로 주요 활동이 전문가 자문과 컨설팅, 교보재 개발·보급, 역량 강화 프로그램을 중심으로 하고 추가적인 실습실 개선 및 노후 훈련 장비 개선 등 지원은 환경에 영향을 크게 주지 않음.
---------	------------	--

<스리랑카 노동시장 수요기반 TVET역량강화 사업 - 정책적 타당성 분석결과>

	평가 항목	타당성 분석
정책적 타당성	UN SDGs와의 부합성	2030년까지 모든 여성·남성에게 적정비용의 양질의 기술, 직업교육 및 대학과정을 포함한 고등교육에 대한 평등한 접근을 보장하는 SDG 4 목표와 포괄적이며 지속가능한 경제 성장과 안전하고 생산적인 고용, 그리고 모두를 위한 양질의 일자리를 창출하는 SDG 8 목표와 부합
	스리랑카 정책과의 부합성	스리랑카는 100만 일자리 창출, 기술기반 사회, 국가 경쟁력 강화와 생산성 제고를 위한 인적 역량강화를 우선 정책과제로 추진하고 있는바, 동 직업훈련(TVET)역량강화사업은 수원국 정부의 주요 정책과제에 부합 - 스리랑카 정부는 인적자원개발을 우선 과제로 선정하고 중기예산계획에 반영하고 있으며, 전체 국가 예산 중

11) 출처 : 2022년 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화사업 기본계획(안) 8쪽

	평가 항목	타당성 분석
		21.4%*를 투입 *비중 측면에서 인프라 개발에 이어 2위에 해당
	우리나라 對 스리랑카 ODA 지원전략과의 부합 여부	스리랑카는 ODA 중점협력국으로 스리랑카 국가협력전략(CPS)의 중점협력분야인 교육분야의 세부 지원 '시장수요에 맞춘 기술·직업훈련 제공으로 산업인력 개발 및 고용창출 역량강화 지원'에 부합

○ 향후 실행 계획을 통해서 위험관리가 적절하게 이루어질 것으로 판단됨.

구분	실행방안		추진 일정
훈련 장비 공급	제안서 평가 및 계약체결	▶ (본 공고 2개 이상 입찰 시) 재공고 없이 바로 진행 가능	'24.1월 2주차
		▶ (본 공고 유찰 시) 입찰 재공고('24.1.2.~15.) 이후 진행	'24.1월 3주차
	노후시설 개선	▶ 훈련장비 도입전 건물증축 등 노후시설개선	'24. 2~4월
	구매·운송	▶ (구매) 국내 구매지원 원칙(단, 일반가구 등 현지 구매 가능) ▶ (운송) 해상 후 내륙 차량운송	'24. 2~5월
	설치·시운전	▶ 설치 기술자 현지 파견하여 설치·시운전·운영교육 실시 - 용역 전문가(PM, 공과 전문가) 입회하여 설치·시운전 진행	'24. 6~8월
교육 과정 개편	▶ 직훈련 운영 개선방안 자문(안) 도출 - 산업별 고용현황 분석 및 교육과정 운영계획 수립 등		'24.1월
	▶ 노동시장 수요맞춤형 교육과정(교재) 개발 - 기업에서 요구하는 실무능력과 주요 활용 장비 실습 위주의 교육과정 개발		'24. 1~6월
시범 과정 운영	기업연계 맞춤형	▶ 파트너사 채용 연계를 목표로 기업 맞춤형 시범 과정 운영 - 3개 공과(용접·자동차정비·전기) 각 20명, 6개월 교육 과정 운영	'24.7월
	귀국 근로자 취업훈련	▶ 귀국근로자의 안정적 재정착 지원을 위한 기술 재교육 훈련과정 - 15명, 3개월 교육과정 운영	'24.5월

2. 효율성

2.1. 효율성 평가 기준과 중간평가 결과

평가 기준	평가 항목	평가값			
효율성	사업비용의 효율성	④	3	2	1
	사업 기간의 효율성	4	3	②	1
	투입 대비 성과 달성 정도	④	3	2	1

- 투입된 자원 대비 국제개발협력의 성과가 경제적 의미에서 얼마나 효율적으로 나타났는가의 정도를 표시하는 것으로, 투입자원 대비 성과가 클수록 효율성이 높다고 판단함.
- 사업의 비용이 얼마나 되는가, 목표가 계획된 시간 내에 달성되었는가, 다른 대안들보다 적은 비용으로 큰 성과를 거두었는가 등을 평가함.
- 상황에 따라 필요한 경우 예산과 기간이 적절히 조정되었는가도 효율성을 측정하는 기준이 됨.
- 사업비용은 적절하게 책정되고 사용되고 있고, 투입대비 성과 달성 정도로 높은 것으로 판단됨. 다만, 코로나19로 지연된 사업진척 정도를 가능한 한 빨리 진도를 내어 성과를 달성할 과제가 남아 있음.

2.2. 사업비용의 효율성 : 중간평가 결과 4점

- 3개년도 사업에 21.5억을 예산으로 측정함. 기자재 지원, 훈련연수, 교육과정 개편, 귀국근로자 훈련 프로그램 등 다양하게 배정하고 있음. 스리랑카의 직업훈련 현황과 골 지역의 특수성이 충분하게 반영되었다고 판단됨.
- 소요예산은 총 2,150백만원[국제교류협력(6600)-개도국 노동시장수요기반 직훈 역량강화(6624)]¹²⁾으로 편성되고 있음.

12) 출처 : 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화사업 기본계획(안) 6쪽

<소요 예산>

구분		금액 (백만원)	주요 내역
합계		2,150	
인프라 개선	실습 기자재	1,180	- 3개 공과 실습 기자재 개선
	시설 개선	108	- 3개 공과 시설 개선
	행정 물품	18	- 3개 공과 행정 물품 개선
전문가 파견	훈련운영 자문(PM)	219	- 현지조사 파견을 위한 인건비, 항공료 및 체재비 등(노동분야 전문가 포함)
	과정 및 교재 개발	291	- 3개 공과 전문가 항공료 및 체재비
	기자재 설치 및 자문	47	- 3개 공과 전문가 항공료 및 체재비
역량강화	초청 연수	162	- 3개 공과 교사 9명*3개월
	시범 과정 운영	90	- 기업 맞춤형 시범 과정 3개 공과 6개월 운영
	시범 과정 운영	15	- 귀국근로자 취업훈련 시범 과정 3개월 운영
기타	평가	20	- 사업종료평가(용역)

2.3. 사업기간의 효율성 : 중간평가 결과 2점

○ 2023년 추진계획안 자료를 참고하여 사업 추진 경과를 확인한 결과, 계획된 대로 사업이 추진하도록 노력하고 있다고 판단함. 다만 2022년도에 진척이 늦어져, 사업완료에 대한 부담감이 높은 상태임.

- 코로나와 현지 사정으로 인하여 사업 지연이 발생한 것 이외에는 잘 진행된 것으로 평가됨
- 수원국 분담사항 등 공유 및 IA(안) 도출 (' 22.2~3월)
- 스리랑카 TVET 역량강화 사업관리자(PM) 선정 (' 22.3.28)
- 스리랑카 정세불안 대비 TVET 역량강화 사업 추진계획(안) 보고 (' 22.8.1)

- 사업추진 방향 결정을 위한 스리랑카 현지 점검 출장 (' 22.8.31~9.7)
- 스리랑카 內 IA 승인현황 및 절차 확인 협조 공문 발송(' 22.10.19)
및 승인 촉구를 위한 스리랑카 교육부, 외교부에 고용부 서한 송부
(' 22.12.16)
- IA 승인현황¹³⁾ 확인 및 공과 선정 등 협의를 위한 '23년도 사업추진
현황 점검 회의(3회/' 23.2.16., 3.2., 3.28.), IA 승인 완료(3.29.)
- 3개 우선순위 공과 선정을 위한 1차 현지 수요 조사('23. 3.7~3.31)
- 2023년 사업추진의 세부일정도 계획대로 진행되고 있음.

구분	세부 업무	일 정(안)	확인
사업 관리	☑사업기본계획 수립	'22. 3. 8.	기 완료
	☑PM 선정	'22. 3. 31.	기 완료
	공과 선정	3. 6~3. 31. 현지수요조사 4. 3~4. 13. 데이터 수집 4. 14. 공과 확정	스리랑카 수요조사 및 데이터 분석 결과 반영
	공과전문가 선정	4. 17~4. 28. 인력풀 선발 또는 공개모집 5. 3. 전문가 선정 심의	
	전문가 용역계약 체결	5. 4.	PM 및 3개 공과전문가
	IA 체결	4월중(비대면 또는 서면)	
	착수보고회	5. 8~5. 12.(스리랑카)	
	현지인력 채용	5. 1~12. 31(240일)	'24년 60일
기자재	기자재 목록 확정	4. 14~4. 28. 기자재 목록 작성 5. 1~5. 4. 기자재 목록 확정	
	기자재 사양 작성	5. 4~6. 4	공과 전문가
	기자재 구매·운송·설치	7월 초 용역계약 의뢰 8월 말 용역계약 체결 8월~12월 기자재 구매·운송 '24. 1월 기자재 설치·시운전	기자재 공급업체 용역
	훈련시설 개선	9월~12월 장비 설치 관련 시설 개선 완료	
역량 강화	교사 초청연수	8. 21~11. 20.(3개월, 9명)	국내

13) 스리랑카 감사원(完)→외교부(完)→법무부(完)→국무회의(完)

구분	세부 업무	일 정(안)	확인
전문가 파견	직업훈련원 운영개선 자문(PM)	5.1.~12.31. PM 파견(240일) 9.30. 직훈련원 운영개선안 완료	'24년 60일
	교과과정 및 교재개발	7.1~12.31 교과전문가 파견(180일) 12.31. 교과과정 및 교재개발 완료	3명

- 다만 사업 초기에 코로나19로 사업진행에 어려움이 발생하고, 스리랑카 정부의 복잡성과 정치적인 불안으로 진척이 어려운 측면이 존재함. 인종간의 불안이 해소되었다고 생각되었지만, 다시 재연되는 조짐을 보이고 있음.
- 공무원 정책역량강화 초청연수 실시('23.11.1~6) 중 스리랑카 측의 추가 과업(건물증축) 요청에 따른 세부 예산내역 재검토 등 추가 시간 소요
- 대부분의 사업이 2차년도의 중간과 3차년도에 진행할 계획을 가지고 있지만, 현재 시행기관인 한국산업인력공단의 조직과 추진력으로 달성 가능성이 가능할 것으로 기대됨

2.4. 투입 대비 성과 달성 정도 : 중간평가 결과 4점

- 성과 지표가 적절하게 설정되어 있음.¹⁴⁾

성과 지표	객관적 검증지표	검증수단	중요 가정
Outputs(산출물) 1. 니야가마 직업 훈련원 운영개선 방안 2. 교육환경개선 3. 초청/현지 연수 실시 4. 시범교육 실시	1. 직업훈련원 운영개선방안 2. 교육환경개선 3. 초청/현지연수 완료 4. 교육실시 인원	- 사업추진 결과 보고서 - 설비/장비 공여 리스트 - 운영개선안 - 교육참석자 명단	- 수원기관/수혜자의 적극적 협력과 참여 가 이루어짐. - 운송과 통관이 차질 없이 진행됨. - 코로나19 상황이 개 선, 원활한 사업추진

- 사업추진 현황으로 투입대비 달성 정도를 평가해보면, 어느 정도 목표치를 달성한 것으로 판단됨.¹⁵⁾

14) 출처 : 2022년 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화사업 기본계획(안) 7쪽

15) 출처 : 『스리랑카 노동시장 수요기반 직업훈련 역량강화사업』 2023년도 사업 세부 실행계획(안)

○ 주요 과업별 추진 현황

구분	추진 내용	2023년 말 현재 추진현황
훈련장비 공급	▶ 직훈련 훈련(시설)장비 공급목록 확정(9.21.) - 200개 품목, 총 777개(1,306백만원)	25%
	▶ 훈련(시설)장비 구매 기본계획 수립 및 계약의뢰(10.27.) - 입찰 본 공고(12.18.~29.) 진행하였으나 무응찰, 입찰 참가 자격 완화하여 1.4(목)~1.16(화) 재공고 진행중	
교육과정 개발	▶ 3개 공과 교육과정 현황분석 보고서 작성 및 개발계획(안) 수립 (12.11)	100%
초청 연수	▶ 훈련교사(9명) 전공역량강화 초청연수 실시 완료 (10.18.~11.27) - 공무원(3명) 정책역량강화 초청연수(11.1.~6.) 포함	100%

○ 수혜자인 스리랑카 공무원 3인 면담결과를 고려해보면,¹⁶⁾ 한국에 연수를 온 담당 공무원들은 투입요소로 예산을 중요하게 생각하고 산출물로 본국 공장의 취업을 고려하고 있음.

○ 취업에 필요한 기술훈련을 인지하고 있으면 한국에서 지식, 연수, 장비, 교육과정을 향상시켜 취업률을 높게 유지하려고 노력하고 있음.

- 취업 시 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇인가요?

현장과 시장에 적합한 기술
분야에서의 전문성
필요한 소프트 스킬과 하드 스킬

- 한국의 지원을 통해서 귀 기관의 어떤 변화를 기대하나요?

지식, 연수, 장비, 교육과정의 향상.
이를 통해, 국내 시장, 국제 시장에 적합한 신기술을 가르칠 수 있을 것으로 기대됨.

16) 스리랑카 공무원 대상 직업기술교육훈련 역량강화 면담조사 개요

(대상) 스리랑카 공무원 3명

(면접일) 2023년 11월 5일

(목적) 고용노동부가 지원하고 있는 스리랑카 직업훈련원 개선사업(교육훈련 인프라 개선, 교육과정 지원 등)의 중간평가

○ 스리랑카 훈련 연수 만족도를 평가하면 상대적으로 상당히 높은 것을 알 수 있음.

Questionnaire			평균	과정	사설	강사(Engineering)			
						김△△	사△△	노△△	이△△
			4.54	4.35	4.44	4.52	4.90	5.00	4.00
Course Name	A Training Program For Sri Lanka TVET vocational Trainers								
Period	October 18. 2023 ~ November 27. 2023								
Nationality	Sri Lanka (9)								
Your Organization	Government Organization	9	Public Agency			Private Institution			
Occupation	Officer	1	Teacher		8				
Gender	Male	7	Female		2				
Training Institute	Gwangju Human Resources Development institute								
Question			Total	Ave	Very Good	Good	Fair	Bad	Very Bad
					5	4	3	2	1
Institute Satisfaction									
1. Training Program Satisfaction									
1-1	Overall Training Program Satisfaction		9	4.22	2	7			
1-2	Technical(IoT) Lecture Satisfaction		9	4.78	4	5	1		
1-3	HRD Lecture Satisfaction		9	4.44	4	5			
1-4	Adequacy of Training Level		9	4.33	3	6			
1-5	Cultural Experience		9	3.89		8	1		
1-6	Acceptance of Trainee's Requests		9	4.44	4	5			
소계			87.04	4.35					
1-7	Note (other opinions)								
2. Facility Satisfaction									
2-1	Lecture Room		9	4.67	6	3			
2-2	Accommodation		9	4.56	5	4			
2-3	Transportation		9	4.33	4	4	1		
2-4	Food		9	3.78	0	7	2		
2-5	Staff's Administrative Service		9	4.89	8	1			
소계			88.89	4.44					
2-6	Note (other opinions)								
Instructor Satisfaction									
Instructor Name: 김△△									
Topic: Welding									
1	Was the lecture appropriate to the trainee's demand?		3	4.33	2		1		
2	Was the instructor professionalized in the field?		3	4.67	2	1			
3	Was the contents of the lecture well made?		3	4.33	2		1		
4	Did the instructor attract the trainee's participation?		3	4.67	2	1			
5	Wast the length of lecture time appropriate?		3	4.67	2	1			
6	Is the lecture usable for the future industry work?		3	4.33	1	2			
7	Wast the instructor's communication skill appropriate?		3	4.67	2	1			
소계			90.48	4.52					

8	Note (other opinions)							
Instructor Name: 사△△								
Topic: Electricity								
1	Was the lecture appropriate to the trainee's demand?	3	5.00	3				
2	Was the instructor professionalized in the field?	3	5.00	3				
3	Was the contents of the lecture well made?	3	5.00	3				
4	Did the instructor attract the trainee's participation?	3	5.00	3				
5	Was the length of lecture time appropriate?	3	4.67	2	1			
6	Is the lecture usable for the future industry work?	3	4.67	2	1			
7	Was the instructor's communication skill appropriate?	3	5.00	3				
소계		98.10	4.90					
8	Note (other opinions)							
Instructor Name: 노△△								
Topic: Electricity								
1	Was the lecture appropriate to the trainee's demand?	3	5.00	3				
2	Was the instructor professionalized in the field?	3	5.00	3				
3	Was the contents of the lecture well made?	3	5.00	3				
4	Did the instructor attract the trainee's participation?	3	5.00	3				
5	Was the length of lecture time appropriate?	3	5.00	3				
6	Is the lecture usable for the future industry work?	3	5.00	3				
7	Was the instructor's communication skill appropriate?	3	5.00	3				
소계		100	5.00					
8	Note (other opinions)							
Instructor Name: 이△△								
Topic: Automobile								
1	Was the lecture appropriate to the trainee's demand?	3	4.00		3			
2	Was the instructor professionalized in the field?	3	4.00		3			
3	Was the contents of the lecture well made?	3	4.00		3			
4	Did the instructor attract the trainee's participation?	3	4.00		3			
5	Was the length of lecture time appropriate?	3	4.00		3			
6	Is the lecture usable for the future industry work?	3	4.00		3			
7	Was the instructor's communication skill appropriate?	3	4.00		3			
소계		80.00	4.00					
8	Note (other opinions)							

3. 효과성 및 영향력

3.1. 효과성/영향력 평가 기준과 중간평가 결과


평가 기준	평가 항목	평가값			
효과성 및 영향력	계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	4	③	2	1
	사업성과의 취약계층 포용성 및 형평성 정도	4	③	2	1
	사회경제제도에 대한 영향력	4	③	2	1

- (효과성 평가 기준) 국제개발협력사업의 목표 달성도를 의미하는 것으로, 사업 초기에 설정된 산출물 목표, 성과목표를 구분하여 초기 목표를 얼마나 달성했는지 측정하여 평가함. 목표 달성여부 및 정도에 기여하는 요인을 검토하고, 분리지표를 활용하여 사업혜택이 취약계층에게도 공평히 배분되었는지를 추가적으로 파악하여 등급을 부여함. 참고로, 일반적으로 종료평가 시에는 산출물(output) 목표까지, 사후평가 시에는 성과(outcome) 목표까지 달성여부를 측정할 수 있음.
- (영향력 평가 기준) 국제개발협력의 결과 직·간접적으로 초래된 지역적·사회적·경제적·환경적·제도적 변화 등 거시적이고 포괄적 변화에 대한 평가임. 사업내부요인과 외부환경적 요인으로 인한 변화를 구분하고, 긍정적 변화와 부정적 변화, 의도한 결과와 의도하지 않은 결과도 모두 포함함. 사업의 확장 가능성과 부정적 영향이 있다면 이를 해결하기 위한 조치가 있었는지도 검토함.
- 효과성 및 영향력에 대한 중간평가는 어려운 측면이 발생하고 미래의 불확성이 많이 존재함. 사업이 진행되면서 효과성과 영향력에 대한 평가가 심도깊게 이루어질 가능성이 높고 구체화될 것으로 예상됨 .

3.2. 계획한 산출물, 성과목표 달성 정도

- 연도별 추진대비 성과달성¹⁷⁾

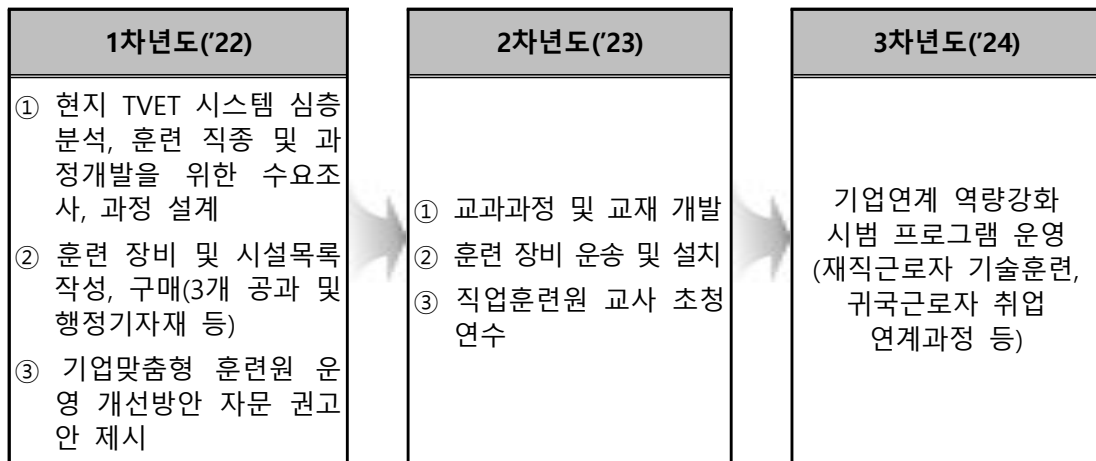17) 출처 : 2022년 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화사업 기본계획(안) 3쪽



- 사업계획대비 성과달성 정도를 살펴보면 어느 정도 계획에 맞추어 진행되고 있음.

산출물	활동	2023년 추진 목표	2023년말 현재 추진 현황
Output 1. 노동시장 수요맞춤형 교육환경 개선	1.1. 훈련 장비 공급	- 진행률 : 80% - 상세사항 : 3개공과 장비목록 확정. 3개공과 훈련 장비 구매·현지 운송 완료	- 진행률 : 25% (장비 설치는 '24년 과업)
	1.2. 노후 설비 유지 보수	- 진행률 : 100% - 상세사항 : 3개공과 장비설치에 필요한 시설 정비	- 진행률 : 30%
Output 2. 노동시장 수요맞춤형 훈련 프로그램 개편	2.1. 훈련원 운영 개선 방안 자문	- 진행률 : 100% - 상세사항 : PM 현지 파견('23년 5월초) 및 현지 사무기반 구축, 훈련원 운영 개선방안 수립('23년 9월말)	- 진행률 : 25%
	2.2. 노동시장 수요 맞춤형 교육 과정 개발	- 진행률 : 100% - 상세사항 : 3개 공과 교육과정 개발(영문)	- 진행률 : 25%
	2.3. 교육교재 개발지원 및 콘텐츠 제공	- 진행률 : 100% - 상세사항 : 3개 공과 교재개발 (영문)	- 진행률 : 25%
Output 3. 직업훈련 교사 역량강화 및 시범과정 운영	3.1. 훈련교사 역량 강화	- 진행률 : 100% - 상세사항 : 3개공과 훈련교사 초청연수(3개월, 9명)	- 진행률 : 100%
	3.2. 기업 연계 맞춤 훈련 시범 과정 운영	- 진행률 : 0% - 상세사항 : 2024년 과업	- 2024년 수행 예정

산출물	활동	2023년 추진 목표	2023년말 현재 추진 현황
	3.3. 귀국근로자 취업훈련 시범 프로그램 운영	- 진행률 : 0% - 상세사항 : 2024년 과업	- 2024년 수행 예정

- 직업훈련 연수를 경험한 연수생의 경험을 통해서 효과성/영향력이 일정 부분 발휘할 것으로 예상됨.

• 설문 10. 본인이 느낀 한국의 직업훈련의 장점과 단점은?

장점

민간 부문 참여

직업훈련 교육의 50%는 민간 부문이, 나머지 50%는 정부가 커버해, 예산 할당이 좋음.

실력 좋은 교사들

민간 부문과의 협력

수준 높은 기술력

세계적 인정을 받음.

단점

자격증 시스템이 통합되어 있는 것 같지 않음. 자격증을 발급해주는 기관의 수준에 따라서 자격증의 수준도 달라지는 것 같음.

호텔, 조리사 등 서비스직 직업훈련이 있는지 모르겠음.

수준 높은 기술을 가지고 있으나, 영어 교육이 더 잘 되어서 교사들이 영어로 교육할 수 있다면 더 좋을 것 같음. 영어만 하면 더 크게 성장할 수 있지 않을까 함.

인력이 부족함. 성비가 잘 안 맞는 것 같음.

한국 교육 시스템이 너무 성적 중심인 것 같음.

• 설문 11. 스리랑카 직업훈련을 한국과 비교하였을 때 어떻게 평가하십니까?

스리랑카는 한국처럼 신기술이 많이 들어오지는 않았음.

교사들이 신기술과 교수법에 더 많이 노출되고 경험해야 함.

장비들도 오래됐음.

AI에 더 많은 노출이 필요함.

취업 전략이 필요함.

• 설문 12. 이번 연수 프로그램 중 가장 기대하고 있는 프로그램은 무엇인가요?

한국산업인력공단과 스리랑카 사업의 발전을 위해 가진 간담회

공단에서 요청사항을 긍정적으로 검토해줘서 좋았음.

- 설문 13. 귀 기관을 운영하면서 가장 중요하게 생각하는 것은?

① 예산 ② 교사 ③ 교육과정 ④ 산학협력 ⑤기타()

- 설문 14. 귀 기관의 졸업생들은 어디에 취업하나요?

① 본국 공장 ② 해외취업 ③ 본국에서의 자영업 ④ 기타()

- 14-1 취업 시 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇인가요?

현장과 시장에 적합한 기술, 분야에서의 전문성, 필요한 소프트 스킬과 하드 스킬

- 설문 15. 한국의 지원을 통해서 귀 기관의 어떤 변화를 기대하나요?

지식, 연수, 장비, 교육과정의 향상.
이를 통해, 국내 시장, 국제 시장에 적합한 신기술을 가르칠 수 있을 것으로 기대됨.

4. 지속가능성

평가 기준	평가 항목	평가값			
지속가능성	재정적 제도적 역량 여부 계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	④	3	2	1
	인적 역량 유지관리 체계 여부	4	③	2	1
	계획대비 실제 지속가능성	4	③	2	1

- 국제개발협력 사업이 종결된 후에도 사업의 효과가 지속되는 정도를 의미함. 즉, 국제개발협력 사업이 향후에도 유지될 잠재성이 있는지, 사업의 긍정적 영향력이 지속적일 것인지에 대한 평가임.
- 이를 위해 수행기관의 인적·제도적·재정적 역량, 위험관리 계획을 검토하고 사업을 통한 잠재적 상쇄효과도 검토함.
- 스리랑카 노동시장 수요기반 TVET 역량강화 사업의 지속가능성 타당성 분석결과를 보면, 효과성과 지속가능성이 높을 것으로 판단하고 있음.¹⁸⁾

지속 가능성	ODA 효과성 및 지속가능성	기존 EDCF 사업으로 추진된 국립직업훈련원의 역량강화 지원사업으로, 스리랑카의 후속 협력수요에 부응함과 동시에 직업훈련분야 ODA 사업의 효과성과 지속가능성을 높일 수 있을 것으로 기대
-----------	-----------------------	--

- 지속가능성을 달성하기 위한 선행조건은 다음과 같을 것임.
 - 스리랑카 측의 정확한 수요제시 및 적극적 협업
 - 역량강화 프로그램 적극 참여 및 현업적용
 - 제공된 기자재와 설비의 성공적 설치 활용 및 관리
 - 코로나 19 상황 개선

18) 출처 : 2022년 스리랑카 노동시장수요 기반 직업훈련(TVET) 역량강화사업 기본계획(안) 9쪽

5. 일관성

평가 기준	평가 항목	평가값			
일관성	내적 일관성	4	③	2	1
	외적 일관성	④	3	2	1

- 본 사업 자체가 EDCF사업과 연계된 사업이라는 측면에서 일관성은 높은 것으로 평가됨. 하지만, 어떤 부분의 연계인지 구체적으로 드러나 있지 않은 한계는 존재함.
- 국제개발협력 사업이 국내외 다른 국제개발협력 사업과 중복성 없이 연계되어 시너지효과를 창출하는 정도를 나타냄.
- 국내 ODA 시행기관 사업이 기관 내 기타사업과 연계되었는지, 타 기관사업에 연계되었는지, 정책일관성 차원에서 외교/안보/환경/통상 등 ODA 외 정책과 연계되는지를 평가하는 내적 일관성(internal coherence), 타 공여국 및 공여기관 사업에 연계되었는지 여부를 평가하는 외적 일관성(external coherence)으로 구분됨.
- 일관성을 판단하기에는 아직 이른 감이 있지만, 일관성을 유지되고 있는 것으로 판단됨.
- 내적 일관성
 - 기자재 공급을 통해서 한국기계 부문이 연동되고, 인력훈련을 위해서 직업훈련관계자들이 사업 전반에 기여하게 됨.
 - 고용허가제로 도입된 스리랑카 근로자들이 귀국시에 일자리를 매칭하고 직업훈련을 진행하는 방안이 모색되고 있음.
- 외적 일관성
 - 본 ODA 사업의 수혜자인 스리랑카 공무원 3인의 면담결과¹⁹⁾, 프로그램 참여자들은 지속적으로 한국과의 연결성을 유지하고 있음. 한

19) 스리랑카 공무원 대상 직업기술교육훈련 역량강화 면담조사 개요

(대상) 스리랑카 공무원 3명

(면접일) 2023년 11월 5일

(목적) 고용노동부가 지원하고 있는 스리랑카 직업훈련원 개선사업(교육훈련 인프라 개선, 교육과정 지원 등)의 중간평가

국의 직업훈련에 대한 인지도가 높고 본국에의 연결성을 중요시하고 있음.

- 설문 7. 이번 한국의 연수에는 어떻게 참여하게 되었나요?

① 기관 추천 ② 광고 ③ 지인 소개 ④ 기타()

- 설문 8. 한국에서 진행하는 사업이나 연수에 참여해 본 경험이 있나요?

① 예 ② 아니오

- 설문 8-1. 만약 참여한 적이 있다면, 언제, 어떤 사업이었나요?

Prasanna: 없음

Prabath: 2022년 12월에 서울에서 한국생산성본부 프로그램.

Niroshana: 2023년 10월 15~21일에 코이카 초청 프로그램으로 전국기능경기대회.

- 설문 9. 한국의 직업훈련에 대해 알고 있는 것을 자유롭게 써보세요.

Prasanna: 한국산업인력공단이 스리랑카 직업훈련에 중요한 역할을 한다는 것.

Prabath: 이 프로그램만 알고 있음.

Niroshana: 지난번 한국방문을 통해, 한국의 직업훈련 교육과 학교 교육 시스템에 대해서 조금 알게 되었음.

IV. 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화 중간평가

1. 적절성

1.1. 적절성 평가 기준

평가 기준	평가 항목	평가값			
적절성	수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합	④	3	2	1
	사업 설계 및 구성의 적절성	④	3	2	1
	환경변화 대응, 위험관리 적절성	4	③	2	1

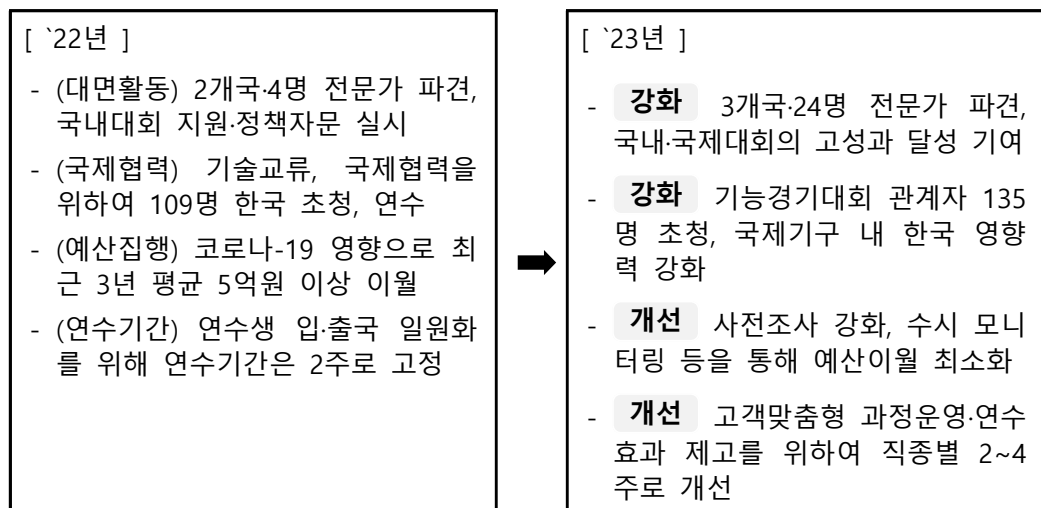
* 매우 적절 4, 적절 3, 일부 적절 2, 미흡 1

- 국제개발협력 사업이 협력대상국의 개발 우선순위·수요·정책, 우리정부의 정책, 지원환경 및 변화에 부합하는 정도를 나타냄.
- 평가대상 사업이 SDGs 등 국제사회 개발목표를 반영하는지와 초기 사업설계와 구성의 적절성도 함께 평가하여 등급을 부여함.
- 수원국 개발전략 및 수혜자 수요와의 적합성이 높고, 사업설계 및 구성도 적절한 것으로 평가됨. 환경변화에 대한 대응은 어느 정도 가능했으나, 위험관리에 대한 대응은 다소 부족하여 그 수단이 강구되어야 함.

1.2. 수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합 : 종합평가 결과 4점

- 국가 간 상호 기능교류를 통해 기능수준 향상 및 기능개발 촉진을 목적으로 하는 기능경기대회의 특성 상 다국가 간 합동훈련을 실시하고 국가별 사례를 공유함으로써 연수의 몰입도 제고 및 시너지 효과 기대

- SDGs 해당 목표에 부합함.
 - 1차 목표: SDG.4. 포용적이고 형평성 있는 양질의 교육 및 평생교육 기회 증진
 - 2차 목표: SDG.8 포용적 경제성장 및 양질의 일자리 촉진
- 한국형 기능경기 시스템 모델을 개발도상국에 전수하여 숙련기술인력 양성 및 직업훈련 역량강화를 지원함으로써 개발도상국의 산업발전 및 경제성장 지원²⁰⁾
- 개도국 기능경기 역량강화를 위한 관계자 초청연수, 국내 전문가의 현지 파견, 기능경기 제도개선 및 대회운영 지원 등을 무상원조사업(ODA), 1,182백만원('21~'23년 2,550백만원)으로 진행함.
- 한국의 기능경기사업에 관한 축적된 지식이 개도국에 전파됨.
 - 지방·전국기능경기대회 개최 및 국제기능올림픽대회 참가를 통해 지역 간 기술격차 해소 및 숙련기술 수준 향상과 숙련기술인 우대풍토를 조성, 한국의 숙련기술인력 양성과 산업·경제발전의 견인차 역할을 함.



- 기술전수를 통한 협력국 간 교류확대로 WSI, ASEAN 등 국제기구 내 한국의 영향력 강화
 - 수원국 대면(화상)회의, 관리자 초청연수, 합동훈련을 강화해 공단의

20) 출처 : 23년 개도국 기능경기 역량강화 사업(K-STAR) 기본계획

국제대회 고성과 달성, ASEAN 협력사업 확보 등에 기여

- 필리핀의 수요가 반영되어 ODA 절차를 반영함.²¹⁾

정책 부합성	수원국 수요 확인	- 수원국 요청서 접수 - 2020.02.17, 필리핀 관계기관 국가기술교육훈련청(TESDA) 공식서한 및 PCP 접수 (ISO 9001 : 2015 Certified) - 2021.4.21, 필리핀 수충기관(NEDA) 공문 접수 (NEDA-PIS 21APRIL2021) - 기타 사항 - (주요내용) 제14회 필리핀 개최 아세안 기능경기대회 준비 자문, 2022 중국 상하이 국제기능올림픽대회 출전 대비 선수 및 심사위원 역량강화 지원 등
	타당성 조사	- 시기 및 주체 : '21. 2월, 한국산업인력공단 실시 - 비대면 조사 여부: (O) / 현지조사 대행 전문가 활용 여부 : (X) - 민간전문가 참여 여부: (O) / 조사결과 대외공개 가능 여부: (O) - 민간전문가 참여 인원 : 2명 - 조사 결과 대외 공개 불가능시 사유 : 해당 없음
	재외공관 사업계획 공유 및 모니터링 결과 환류	- 사업 발굴단계 정보공유 : 글로벌HRD협력부-372('21.2.), 공단 분사무소인 필리핀 EPS 센터를 통해 재외공관에 공단 수행 고용부 국제개발협력사업 현황 공유 - 사업 시행단계 정보공유 : 수원국 재외공관과 정보 공유 예정 - 기타 재외공관 의견 : 해당 없음 - 재외공관 모니터링 결과 이행 현황 및 조치계획 : 해당 없음
	정책 연계성	- 국별협력전략(CPS)상 중점협력분야 해당 여부 : (X) - SDGs 해당 목표 : - 1차 목표 : SDG.4. 교육 - 2차 목표 : SDG.8 경제성장 및 양질의 일자리 - 기타 대외전략 관련 여부 : (O, X) - 신남방 정책 관련 여부 : (O) - 신북방 정책 관련 여부 : (X) - 디지털 뉴딜 ODA 관련 여부 : (X) - 그린 뉴딜 ODA 관련 여부 : (X) - 정상외교 후속조치 해당 여부 : (X) - 그 외 기타 대외정책 관련 여부 : (X)

21) 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화(필리핀, 라오스, 아제르바이잔)

- 라오스의 수요도 충분하게 반영함.

정책 부합성	수원국 수요 확인	- 수원국 요청서 접수 - '20. 3.6, 라오스 관계기관 노동사회복지부(MLSW) 공문 및 PCP 접수, 0203/SDDED - '21.4.6., 라오스 수총기관(MPI) 공문 접수, 0723/MPI.DoIC.DoAP08 - 기타 사항 - (주요내용) 기능경기관련 정책 및 규정, 기능경기대회 준비 및 운영 방법 자문, 한국의 전국기능경기대회 참관 및 대회 평가 방법 등 전수
	타당성 조사	- 시기 및 주체 : '21. 2월, 한국산업인력공단 실시 - 비대면 조사 여부 : (O) / 현지조사 대행 전문가 활용 여부 : (X) - 민간전문가 참여 여부 : (O) / 조사결과 대외공개 가능 여부 : (O) - 민간전문가 참여 인원 : 2명 - 조사 결과 대외 공개 불가능시 사유 : 해당 없음
	재외공관 사업계획 공유 및 모니터링 결과 환류	- 사업 발굴단계 정보공유 : 글로벌HRD협력부-372('21.2월), 공단 분사무소인 라오스 EPS 센터를 통해 재외공관에 공단 수행 고용부 국제개발협력사업 현황 공유 - 사업 시행단계 정보공유 : 수원국 재외공관과 정보 공유 예정 - 기타 재외공관 의견 : 해당 없음 - 재외공관 모니터링 결과 이행 현황 및 조치계획 : 해당 없음
	정책 연계성	- 국별협력전략(CPS)상 중점협력분야 해당 여부 : (O) 교육 - SDGs 해당 목표 : - 1차 목표: SDG.4. 교육 - 2차 목표: SDG.8 경제성장 및 양질의 일자리 - 기타 대외전략 관련 여부 : (O, X) - 신남방 정책 관련 여부 : (O) - 신북방 정책 관련 여부 : (X) - 디지털 뉴딜 ODA 관련 여부 : (X) - 그린 뉴딜 ODA 관련 여부 : (X) - 정상외교 후속조치 해당 여부 : (X) - 그 외 기타 대외정책 관련 여부 : (X)

- 아제르바이잔의 수요도가 충분하게 반영된 것으로 판단됨.

정책 부합성	수원국 수요 확인	- 수원국 요청서 접수 - '19.2.25, 아제르바이잔 관계기관(교육부) 공문 및 PCP 접수, 04-12-36/11 - '21.4.19, 아제르바이잔 수총기관(The Cabinet of Ministers) 공문 접수, D/O No. 12 173/6637 aid - 기타 사항 - (요청 배경) 아제르바이잔 직업훈련센터 건립사업(EDCF, '15~20년 공단 수행)을 통해 한국의 성공적인 기능경기시스템에 대한 적극적인 관심과 전수요청 및 협력의지 지속적 표명 - (주요내용) 자국 기능경기대회 개최 및 국제기능올림픽대회 참가준비 컨설팅, 기능경기 관계자(정책전문가, 심사위원, 훈련교사, 선수) 역량 강화
	타당성 조사	- 시기 및 주체 : '19. 9월, 한국산업인력공단 실시 - 비대면 조사 여부 : (X) / 현지조사 대행 전문가 활용 여부 : (X) - 민간전문가 참여 여부 : (O) / 조사결과 대외공개 가능 여부 : (O) - 민간전문가 참여 인원 : 2명 - 조사 결과 대외 공개 불가능시 사유 : 해당 없음
	재외공관 사업계획 공유 및 모니터링 결과 환류	- 사업 발굴단계 정보공유 : 사전타당성 조사 시 주아제르바이잔 한국대사 면담('19.9.10) - 사업 시행단계 정보공유 : 수원국 재외공관과 정보 공유 예정 - 기타 재외공관 의견 : 해당 없음 - 재외공관 모니터링 결과 이행 현황 및 조치계획 : 해당 없음
	정책 연계성	- 국별협력전략(CPS)상 중점협력분야 해당 여부 : (X) - SDGs 해당 목표 : 1차 목표: SDG.4. 교육 2차 목표: SDG.8 경제성장 및 양질의 일자리 - 기타 대외전략 관련 여부 : (O, X) - 신남방 정책 관련 여부 : (X) - 신북방 정책 관련 여부 : (O) - 디지털 뉴딜 ODA 관련 여부 : (X) - 그린 뉴딜 ODA 관련 여부 : (X) - 정상외교 후속조치 해당 여부 : (X) - 그 외 기타 대외정책 관련 여부 : (X)

1.3. 사업 설계 및 구성의 적절성 : 중간평가 결과 4점

- 주요 사업 내용은 ODA의 성격을 반영하고 있음.
 - (대회 운영·기술 전문가 자문) 한국의 기능경기 인프라·제도 전수, 자체 기능경기대회 개최에 대한 운영 및 기술 전문가 자문
 - (역량강화 초청연수) 기능경기 관계자(관리자, 심사위원, 훈련교사, 선수) 대상 기능경기 역량강화를 위한 한국 초청연수 실시
- 한국형 기능경기시스템 모델을 전수하여 산업수요에 맞는 숙련기술인력 개발과 기술교육훈련(TVET) 품질제고로 국내·외 산업기술격차 해소를 통한 산업발전 및 경제성장 도모
 - 한국의 기능경기사업 개요: 지방·전국기능경기대회 개최 및 국제기능올림픽대회 참가를 통해 지역 간 기술격차 해소 및 숙련기술 수준 향상과 숙련기술인 우대풍토를 조성, 한국의 숙련기술인력 양성과 산업·경제발전의 견인차 역할을 함.
 - 2022년 개도국 기능경기 역량강화 사업은 현지 상황을 반영하여 적절하게 구성되어 있음.²²⁾

- (주요내용) 초청연수, 전문가 파견, 비대면 기능경기 역량 강화를 위한 디지털아카이브 구축

개도국 기능경기 역량강화 사업(K-STAR)* 추진사항	필리핀	라오스	아제르바이잔
기능경기 역량강화 초청연수	○	○	○
기능경기대회 관리자 초청연수	○	○	○
기능경기 전문가 현지 파견	-	○	-
기능경기 정책자문, 운영지원	-	○	-
디지털 아카이브 구축	○	○	○
NCS-WSOS 훈련모듈 제작	○	○	○
신규수원국 타당성조사	-	-	-

□ 라오스 사례: 기능경기 정책자문 및 대회운영 지원

- (목적) 개도국 기능경기 역량강화 사업(K-STAR) 수원국 중 기능경기시스템이 가장

22) 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화(필리핀, 라오스, 아제르바이잔)

미흡한 라오스에 기능경기 정책자문 및 시스템 구축, 대회운영을 지원함으로써 지속가능한 기능경기시스템 구축 및 대회운영 역량강화에 기여

- (주요내용) 기능경기 관련 법령·정책자문, 관계자 협조체계 구축, 현지 워크숍 및 전국기능경기대회 운영 지원 등

<라오스 기능경기 정책자문 및 대회운영 지원 개요>

구분	기능경기 제도개선 정책자문	전국기능경기대회 운영지원
수행기간	‘21.9.29. ~ ‘22.8.31.	‘22.12.8. ~ 12.21.
자 문 단	정책, 법령, 기경 전문가 각 1인	희망컴퍼니
수행내용	기능경기대회 정책·법령 자문, 기능경기 인식확산 워크숍 개최	가구·용접·자동차페인팅·조적 직종 전국대회 개최를 위한 재료 지원
소요예산	18,793,086원	20,047,800원

- (주요성과) ‘17년 이후 첫 라오스 기능경기대회 개최 확정, 기능경기대회 법령 개선 안 마련, 라오스 기능경기 이해관계자 협력체계 구축 등

□ 참가자 만족도

- (종합만족도) ‘22년 초청연수생의 종합만족도는 9.82점(10점 만점)으로 매우 높은 수준이며, ‘21년(9.4점, 온라인멘토링) 대비 0.42점 상승
- 초청연수 재참가 희망여부도 9.96점으로 높은 희망의사를 보임.
- (건의사항) 초청연수생 대부분 연수에 만족하였으나, ‘연수기간이 길었으면 좋겠다’는 의견이 가장 많았음.

1.4. 환경변화 대응, 위험관리 적절성 : 중간평가 결과 3점

- 연수 참여자의 기능향상도, 국제기능경기대회참가 성적 향상도에 맞추어 사업이 진행되고, 사업종료 후 기능경기올림픽 회원국으로써 기능개발 우호적인 협력관계를 지속하고 있음.
- 집중 관리 국가를 3년 주기로 다변화하고 있어 국가간 협력관계가 지속되고 확장되고 있음.
- 4개 국가로 시작하였으나, 정치적인 이유로 미얀마가 사업을 중단하고, 나머지 3개 국가 중 아제르바이잔은 소극적으로 태도를 취하고 있음. 상대방 국가가 사업을 철회하거나 소극적인 태도를 취할 경우에 우리나라 정부가 취할 수 있는 수단이 거의 없음.

○ 각 국가에 담당자가 지정되고 기관별 운영체제가 구축됨.

- 필리핀

담당자	우리측	• (부처 담당자) 고용노동부 개발협력지원팀 사무관 • (산하기관 등 사업시행기관 담당자) 한국산업인력공단 글로벌HRD협력부 부장
	수원국측	• (수원국 수원기관 담당자) 국가기술교육훈련청 (TESDA) Lina C. Sarmiento, Deputy Director General/63-2-888-5753/ lcsarmiento@tesda.gov.ph

- 라오스

담당자	우리측	• (부처 담당자) 고용노동부 개발협력지원팀 사무관 • (산하기관 등 사업시행기관 담당자) 한국산업인력공단 글로벌HRD협력부 부장
	수원국측	• (수원국 수원기관 담당자) 라오스 노동사회복지부 (MLSW) / Skills Standards Development Division, Ministry of Labour and Social Welfare/Mr. Inthavone Singdala, Deputy Director/ 856-21-222779/in.gh2011@yahoo.com

- 아제르바이잔

담당자	우리측	• (부처 담당자) 고용노동부 개발협력지원팀 사무관 • (산하기관 등 사업시행기관 담당자) 한국산업인력공단 글로벌HRD협력부 부장
	수원국측	• (수원국 수원기관 담당자) 교육부 국가직업교육기관/Mr. Parviz Yusifov, Head of State Agency on Vocational Education/994-12-599-12-77/Parviz.Yusifov@edu.gov.az

○ 포스트 코로나 및 일상회복 기조에 대응하여, 훈련성과·수요·만족도가 높은 대면활동(초청연수 등)의 비중을 확대하고 있음.

- 특히, 코로나-19로 연기되었던 협력국·대륙별 기능경기대회의 개최를 대비하여 한국 초청연수 및 전문가 파견을 적극적으로 추진중임.
- 사업 설문조사 결과 '21년(비대면) 대비 '22년 만족도는 4.5%(0.42점) 증가함.

- 협력대상국 관련 주요 기능경기대회: WorldSkills ASEAN(싱가포르 /‘23.7, 필리핀/‘25.), WorldSkills Asia(‘23./장소미정), 필리핀/라오스 전 국기능경기대회(‘23.3.) 등

2. 효율성

2.1. 효율성 평가 기준

평가 기준	평가 항목	평가값			
효율성	사업비용의 효율성	④	3	2	1
	사업 기간의 효율성	④	3	2	1
	투입 대비 성과 달성 정도	④	3	2	1

- 투입된 자원 대비 국제개발협력의 성과가 경제적 의미에서 얼마나 효율적으로 나타났는가의 정도를 표시하는 것으로, 투입자원 대비 성과가 클수록 효율성이 높다고 판단함.
- 사업의 비용이 얼마나 되는가, 목표가 계획된 시간 내에 달성되었는가, 다른 대안들보다 적은 비용으로 큰 성과를 거두었는가 등을 평가함. 상황에 따라 필요한 경우 예산과 기간이 적절히 조정되었는가도 효율성을 측정하는 기준이 됨.
- 기능경기 ODA 사업은 예산과 기간의 설정이 효율성을 높이도록 설계되고 진행되고, 투입대입 성과달성도가 중간평가결과 상당히 높을 것을 예상됨.

2.2. 사업비용의 효율성 : 중간평가 결과 4점

- 예산은 필리핀과 아제르바이잔이 2023-2023년 각각 600백만원, 라오스 550백만원임. 사전 실무회의, 전문가파견, 초청연수, 훈련공구 및 재료, 최종 워크숍, 국제대회 참관지원으로 적절하게 배분되고 있음. 수원국에서는 파견 전문가 현지 활동 지원, 기능경기관련 시설 및 장비 지원, 각종 행정 편의시설을 제공하고 있음.

- 3개 국가의 현재 상황을 고려해서 각 국가에 인프라를 제공하고 인적 교류에 최대한 노력을 하고 있음.
- 소요예산은 1,182,837,264원이고, 본예산 900,000,000원 및 명시이월예산 282,837,264원임. 초청연수와 전문가파견에 대해서 예산이 효율적으로 배정되어 지출되고 있음.²³⁾

<'23년 개도국 기능경기 역량강화 사업(K-STAR) 소요예산>

연번	주요내용	소요예산	산출내역
계		1,182,837,264원	
1	초청연수	847,600,000원	• 운영비: 448,000천원 - (일반수용비) 연수수당 180,000천원(400천원x10개 직종x3개국x15일), 통역수당 180,000천원(400천원x10개직종x3개국x15일), 기타운영비 30,000천원(250천원x40명x3개국) - (기타) 재료비 36,000천원(300천원x40명x3개국), 피복비 12,000천원(100천원x40명x3개국), 임차료 6,000천원(2,000천원x3개국), 일용비 2,400천원(80천원x10일x3개국), 공공요금 1,600천원 • 여비: 397,200천원 - (국내여비) 시외여비 7,200천원(150천원x4회x12개월) - (국외여비) 항공료 150,000천원(1,250천원x3개국x40명), 체제비 240,000천원(100천원x3개국x40명x20일) • 업무추진비: 2,400천원 - 2,400천원(200천원x4회x3개국)
2	전문가파견	300,000,000원	• 운영비: 170,400천원 - (일반수용비) 파견수당 158,400천원(330천원x8개 직종x3개국x20일), 기타운영비 12,000천원(500천원x8명x3개국) • 여비: 129,600천원 - (국내여비) 시외여비 3,600천원(150천원x8명x3회) - (국외여비) 항공료 24,000천원(1,250천원x8명x3개국), 체제비 96,000천원(200천원x8명x3개국x20일)
3	연구용역	20,000,000원	• 일반연구비; 20,000천원 - 20,000천원x1식
4	기타	15,237,264원	• 운영비: 15,837,264원 - 라오스 대회지원 12,000천원(12,000천원x1식), 기타운영비 3,237,264원

23) '23년 개도국 기능경기 역량강화사업(K-STAR) 기본계획

- 필리핀 대상 사업 예산

우리 정부 분담 사항	총 사업비	사업 예산 : 총 600백만원('23년 300백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>실무 회의</th><th>전문가 파견</th><th>초청 연수</th><th>공구 재료</th><th>워크숍</th><th>사업 관리</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>300</td><td>13</td><td>75</td><td>163</td><td>35</td><td>-</td><td>14</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>300</td><td>-</td><td>75</td><td>163</td><td>35</td><td>13</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	구분	계	실무 회의	전문가 파견	초청 연수	공구 재료	워크숍	사업 관리	2022	300	13	75	163	35	-	14	2023	300	-	75	163	35	13	14
구분	계	실무 회의	전문가 파견	초청 연수	공구 재료	워크숍	사업 관리																			
2022	300	13	75	163	35	-	14																			
2023	300	-	75	163	35	13	14																			
전문가 파견	- 소요예산 : 총 150백만원 ('23년 75백만원) - 파견인원 : 시스템 컨설팅 전문가 1명, 행정지원 2명, 직종 전문가 5명 - 파견기간 : 14일 이내(연 1회) - 활동분야 : 기능경기대회시스템 정책 자문 및 직종별 기술전수(연 1회) - 세부내역 (단위:백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>직접인건비</th><th>항공료</th><th>체재비</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>75</td><td>40</td><td>8</td><td>27</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>75</td><td>40</td><td>8</td><td>27</td></tr> </tbody> </table>	구분	계	직접인건비	항공료	체재비	2022	75	40	8	27	2023	75	40	8	27										
구분	계	직접인건비	항공료	체재비																						
2022	75	40	8	27																						
2023	75	40	8	27																						
초청 연수	- 소요예산 : 총 326백만원 ('23년 163백만원) - 초청대상 및 인원 : 정책담당자, 심사위원, 훈련교사, 선수 등 연 22명 - 연수기간 : 4주 내외 - 연수내용 : 직업기술교육(기능경기) 기능향상 훈련 - 연수 실시기관 : 한국산업인력공단 - 세부내역 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>직접인건비</th><th>항공료</th><th>체재비</th><th>과정운영비</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>163</td><td>97</td><td>22</td><td>26</td><td>18</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>163</td><td>97</td><td>22</td><td>26</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	구분	계	직접인건비	항공료	체재비	과정운영비	2022	163	97	22	26	18	2023	163	97	22	26	18							
구분	계	직접인건비	항공료	체재비	과정운영비																					
2022	163	97	22	26	18																					
2023	163	97	22	26	18																					
훈련공구 및 재료	- 소요예산 : 총 70백만원 ('23년 35백만원) - 세부내역(훈련공구 및 재료 지원) ▷ 훈련공구 28백만원('22년 14백만원, '23년 14백만원) ▷ 훈련재료 42백만원('22년 21백만원, '23년 21백만원)																									
최종 워크숍	- 소요예산 : 총 13백만원('23년) - 대상/인원 : 전문가 2명, 행정지원 2명 - 내용 : 사업 최종평가회의 및 사후관리 협의 - 세부내역 : 직접인건비 4백만원, 항공료 및 체재비 9백만원																									
평가 /기타	- 소요예산 : 총 28백만원 ('23년 14백만원) - 자료 제작비 : 12백만원(23년 6백만원 /원고료, 번역료, 책자 제작비 등) *'22년 소요액 동일 - 사업 후속 발굴 타당성 조사 연구용역('22년) : 8백만원(인건비 5백만원, 출장비 및 경비 3백만원) - 종료평가 용역('23년) : 8백만원(인건비 5백만원, 출장비 및 경비 3백만원)																									

수원 국 분 담 사 항	• 파견 전문가 현지 활동 지원 • 기능경기관련 시설 및 장비 지원 • 각종 행정 편의시설 제공
-----------------------------	---

- 라오스 대상 사업 예산

우리 정 부 분 담 사 항	총 사업비	• 사업 예산 : 550백만원('23년 300백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>실무 회의</th><th>전문가 파견</th><th>초청 연수</th><th>공구 재료</th><th>워크 숍</th><th>사업 관리</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>250</td><td>13</td><td>65</td><td>115</td><td>26</td><td>17</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>300</td><td>-</td><td>75</td><td>163</td><td>35</td><td>-</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>	구분	계	실무 회의	전문가 파견	초청 연수	공구 재료	워크 숍	사업 관리	2022	250	13	65	115	26	17	-	2023	300	-	75	163	35	-	13
구분	계	실무 회의	전문가 파견	초청 연수	공구 재료	워크 숍	사업 관리																			
2022	250	13	65	115	26	17	-																			
2023	300	-	75	163	35	-	13																			
전문가 파견	• 소요예산 : 총 140백만원 ('23년 75백만원) - 파견인원 : 시스템 컨설팅 전문가 1명, 행정지원 2명, 직종 전문가 5명 - 파견기간 : 14일 이내(연 1회) - 활동분야 : 기능경기대회시스템 정책 자문 및 직종별 기술전수 (연 1회) - 세부내역 (단위:백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>직접인건비</th><th>항공료</th><th>체재비</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>65</td><td>35</td><td>7</td><td>23</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>75</td><td>40</td><td>8</td><td>27</td></tr> </tbody> </table>	구분	계	직접인건비	항공료	체재비	2022	65	35	7	23	2023	75	40	8	27										
구분	계	직접인건비	항공료	체재비																						
2022	65	35	7	23																						
2023	75	40	8	27																						
초청 연수	• 소요예산 : 총 278백만원 ('23년 163백만원) - 초청대상 및 인원 : 정책담당자, 심사위원, 훈련교사, 선수 등 연 17명 - 연수기간 : 4주 내외 - 연수내용 : 직업기술교육(기능경기) 기능향상 훈련 - 연수 실시기관 : 한국산업인력공단 - 세부내역 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>직접인건비</th><th>항공료</th><th>체재비</th><th>과정운영비</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>115</td><td>66</td><td>17</td><td>20</td><td>12</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>163</td><td>97</td><td>22</td><td>26</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	구분	계	직접인건비	항공료	체재비	과정운영비	2022	115	66	17	20	12	2023	163	97	22	26	18							
구분	계	직접인건비	항공료	체재비	과정운영비																					
2022	115	66	17	20	12																					
2023	163	97	22	26	18																					
훈련공구 및 재료	• 소요예산 : 총 61백만원 ('23년 35백만원) - 세부내역(훈련공구 및 재료 지원) ▷ 훈련공구 24백만원('22년 10백만원, '23년 14백만원) ▷ 훈련재료 37백만원('22년 16백만원, '23년 21백만원)																									
국제대회 참관지원	• 소요예산 : 총 17백만원 ('22년) - 지원대상 및 인원 : 우수 연수생 6명 - 지원내용 : 2022 중국 상하이 국제기능올림픽대회 참관 - 세부내역 : 항공료 6백만원, 체재비 11백만원																									

	최종 워크숍	• 소요예산 : 총 13백만원('23년) - 대상/인원 : 전문가 2명, 행정지원 2명 - 내용 : 사업 최종평가회의 및 사후관리 협의 - 세부내역 : 직접인건비 4백만원, 항공료 및 체재비 9백만원
	평가 /기타	• 소요예산 : 총 28백만원 ('23년 14백만원) - 자료 제작비 : 12백만원('23년 6백만원 /원고료, 번역료, 책자 제작비 등) - 사업 후속 발굴 타당성 조사 연구용역('22년) : 8백만원(인건비 5백만원, 출장비 및 경비 3백만원) - 종료평가 용역('23년) : 8백만원(인건비 5백만원, 출장비 및 경비 3백만원)
수원국 분담 사항		• 파견 전문가 현지 활동 지원 • 기능경기관련 시설 및 장비 지원 • 각종 행정 편의시설 제공

- 아제르바이잔 대상 사업 예산

우리 정부 분담 사항	총 사업비	• 사업 예산 : 총 600백만원('23년 300백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>실무회의</th><th>전문가 파견</th><th>초청연수</th><th>공구재료</th><th>워크숍</th><th>사업관리</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>300</td><td>13</td><td>75</td><td>163</td><td>35</td><td>-</td><td>14</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>300</td><td>-</td><td>75</td><td>163</td><td>35</td><td>13</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	구분	계	실무회의	전문가 파견	초청연수	공구재료	워크숍	사업관리	2022	300	13	75	163	35	-	14	2023	300	-	75	163	35	13	14
구분	계	실무회의	전문가 파견	초청연수	공구재료	워크숍	사업관리																			
2022	300	13	75	163	35	-	14																			
2023	300	-	75	163	35	13	14																			
전문가 파견	• 소요예산 : 총 150백만원 ('23년 75백만원) - 파견인원 : 시스템 컨설팅 전문가 1명, 행정지원 2명, 직종 전문가 5명 - 파견기간 : 14일 이내(연 1회) - 활동분야 : 기능경기대회시스템 정책 자문 및 직종별 기술 전수(연 1회) - 세부내역 (단위:백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>직접인건비</th><th>항공료</th><th>체재비</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td><td>75</td><td>40</td><td>8</td><td>27</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>75</td><td>40</td><td>8</td><td>27</td></tr> </tbody> </table>	구분	계	직접인건비	항공료	체재비	2022	75	40	8	27	2023	75	40	8	27										
구분	계	직접인건비	항공료	체재비																						
2022	75	40	8	27																						
2023	75	40	8	27																						
초청연수	• 소요예산 : 총 326백만원 ('23년 163백만원) - 초청대상 및 인원 : 정책담당자, 심사위원, 훈련교사, 선수 등 연 22명 - 연수기간 : 4주 내외 - 연수내용 : 직업기술교육(기능경기) 기능향상 훈련 - 연수 실시기관 : 한국산업인력공단 - 세부내역																									

		<table><tr><th>구분</th><th>계</th><th>직접인건비</th><th>항공료</th><th>체재비</th><th>과정운영비</th></tr><tr><td>2022</td><td>163</td><td>97</td><td>22</td><td>26</td><td>18</td></tr><tr><td>2023</td><td>163</td><td>97</td><td>22</td><td>26</td><td>18</td></tr></table>	구분	계	직접인건비	항공료	체재비	과정운영비	2022	163	97	22	26	18	2023	163	97	22	26	18
	구분	계	직접인건비	항공료	체재비	과정운영비														
	2022	163	97	22	26	18														
	2023	163	97	22	26	18														
훈련공구 및 재료	• 소요예산 : 총 70백만원 ('23년 35백만원) - 세부내역(훈련공구 및 재료 지원) ▷ 훈련공구 28백만원('22년 14백만원, '23년 14백만원) ▷ 훈련재료 42백만원('22년 21백만원, '23년 21백만원)																			
최종 워크숍	• 소요예산 : 총 13백만원('23년) - 대상/인원 : 전문가 2명, 행정지원 2명 - 내용 : 사업 최종평가회의 및 사후관리 협의 - 세부내역 : 직접인건비 4백만원, 항공료 및 체재비 9백만원																			
평가 /기타	• 소요예산 : 총 28백만원 ('23년 14백만원) - 자료 제작비 : 12백만원('23년 6백만원 /원고료, 번역료, 책자 제작비 등) - 사업 후속 발굴 타당성 조사 연구용역('22년) : 8백만원(인건비 5백만원, 출장비 및 경비 3백만원) - 종료평가 용역('23년) : 8백만원(인건비 5백만원, 출장비 및 경비 3백만원)																			
수원 국 분담 사항	• 파견 전문가 현지 활동 지원 • 기능경기관련 시설 및 장비 지원 • 각종 행정 편의시설 제공																			

○ (예산집행 체계화) 수원국 사전협조 강화로 예산 이월 최소화, 예산 집행에 대한 수시 모니터링을 통해 목적외 예산집행 방지

- 그간 예산이월액은 '20년 510백만원, '21년 699백만원, '22년 319백만원으로 나타남.

2.3. 사업기간의 효율성 : 중간평가 결과 4점

○ 3년 사업으로 2021년에는 개도국 기능경기 역량강화(8억원, 필리핀/라오스/아제르바이잔)으로 진행되고, 후속 연수사업으로 2022~2023 개별 국가 개발컨설팅을 추진함.

○ 연수 참여자의 기능향상도와 국제기능경기대회 참가의 성적 향상도가 달성 가능해짐.

○ 코로나19로 대면교류가 어려워진 상황에서도 줌세미나를 활성화하고

지속적으로 교류를 진행해 옴.

- 2023년 개도국 기능경기 역량강화 사업(K-STAR) 월별 주요일정이 준수되고 있음.²⁴⁾

대상국가	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
필리핀	개도국 기능경기 역량강화 사업 (K-STAR) 관계자 업무협의	-	전문가 파견	-	-	초청 연수	ASEAN 대회 출전 지원	-	-	관리자 초청 연수	-	개도국 기능경기 역량강화 사업 (K-STAR) 관계자 간담회
라오스		국내 대회 개최 지원		-	-			-	-		-	
아제르바이잔		-	-	-	-	-	-	전문가 파견	-		초청 연수	
기타	아카이브 구축	무상 원조 계획 제출	훈련 모듈 배포	-	노하우 전수	신규 국가 업무 협의	상반기 실적 점검	-	노하우 전수	개도국 기능경기 역량강화 사업 (K-STAR) 종료평가		

- 필리핀 연도별 추진은 계획에 따라 진행되고 있음.²⁵⁾

- 1차년도 (300백만원)

- 자체 기능경기대회 개최 · 운영 자문
- 직종별 기술자문(직종 및 과제개발, 교수법, 경기진행 및 평가방법 등)
- 한국 기능경기대회 참관
- 2022년 상하이 국제기능올림픽대회 출전대비 기능경기관계자 기능 향상 집중 훈련

- 2차년도 (300백만원)

- 아세안 기능경기대회 개최대비 국제대회 개최 경험 전수
- 2023년 싱가포르 아세안대회 출전대비 선수 및 훈련교사 등 기능 향상 집중 훈련
- 필리핀에서 ‘25년 제14회 아세안 기능경기대회 개최예정

24) ‘23년 개도국 기능경기 역량강화사업(개도국 기능경기 역량강화사업(K-STAR)) 기본계획

25) 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화(필리핀)

○ 라오스 연도별 추진 계획은 기간에 준수되면서 진행되고 있음.

- 1차년도 (250백만원)

- 라오스 기능경기시스템 구축 자문(정책·제도, 조직, 인력, 예산 등)
- 직종별 기술 자문(직종 및 과제개발, 교수법 경기진행 및 평가방법 등)
- 기능경기 단계별 로드맵 개발 자문
- 기능경기 관계자(심사위원, 훈련교사 및 선수) 대상 기능향상 훈련
- 2022 상하이 국제기능올림픽대회 참관 지원

- 2차년도 (300백만원)

- 자체 기능경기대회 개최·운영 자문
- 산업수요에 맞는 신규 직종 개발 자문
- 2023년 싱가포르 아세안대회 출전대비 선수 및 훈련교사 등 기능향상 집중 훈련

○ 아제르바이잔 연도별 추진 계획이 일정에 따라 진행되고 있음.

- 1차년도 (300백만원)

- 아제르바이잔 기능경기시스템 구축 자문(정책·제도, 조직, 인력, 예산 등)
- 직종별 기술 자문(직종 및 과제개발, 교수법 경기진행 및 평가방법 등)
- 기능경기 단계별 로드맵 개발 자문
- 2022년 상하이 국제기능올림픽대회 출전대비 기능경기관계자 기능향상 집중 훈련

- 2차년도 (300백만원)

- 자체 기능경기대회 개최·운영 자문

- 산업수요에 맞는 신규 직종 개발 자문
- 신규 개발 직종 기능향상 훈련

2.4. 투입 대비 성과 달성 정도 : 중간평가 결과 4점

- 각국의 기능경기 능력에 따라서, 기능경기인력 양성, 기능경기주관 인력 양성, 기능경기 참관(자체 기능경기대회 개최), 국제기능경기의 성과 달성(연구 참가자의 역량 제고) 등의 목표가 설정되고 이에 대한 준비가 이루어지고 있음.
- 사업종료 후 지속적인 자체 대회 개최를 위한 지원 및 기능경기올림픽 회원국으로써 기능개발과 관련되어 우호적 협력관계가 지속되고 있음.
- 우리나라 유무상과의 연계가 논의되어 실행되기도 하고, 한국산업계와 직업교육훈련체계와의 연계가 이루어지고 있음.
- 추진성과: 필리핀, 라오스, 아제르바이잔(2021~2023)을 대상으로 개도국 기능경기 역량강화를 위한 초청연수, 국내 전문가의 현지 파견, 기능경기 제도개선 및 대회운영 지원 등

성과 지표		목표 (향상도)			목표치 산출 근거	측정산식 (또는 측정방법)		자료수집 방법 또는 자료출처	결과	
		21	22	23						
공통	기능 향상 도	30 %	35 %	40 %	전년대비 연수 참가자 역량제고	연수 후 기능수준 증감	× 100	참가자 자체평가 (비실명)	'21	101%
						연수 전 기능수준			'22	52%
									'23	62%
필리핀	국제 대회 입상 직종 수	-	-	-	전 국제대회 대비 입상 직종 수 증가(+1개 직종)	입상 직종 수		WorldSkills 발표자료	1개 직종 2명* (22년 국제대회)	
아제르 바이잔	자체 기능 경기 대회 개최	-	-	1	자체기능경기대회 개최	개최 횟수		수원국 자료	1회(23년)	
라오스		-	-	-					1회(23년)	

* 요리 직종 필리핀, 아제르바이잔 각 1명(출처 : 월드스킬스 홈페이지)

- 필리핀 산출물 달성 여부 산정 근거

산출물
(OUTPUT)

- 연수 참여자의 기능향상도, 국제기능경기대회 참가 성적 향상도

성과
지표

- 2022년 중국 상하이 국제기능올림픽대회 참가 입상실적
- 연수 참가자의 연수 전·후 기능수준을 평가하여 “기능향상도 측정”

성과 지표	현황		목표치		2022 목표치 산출 근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집 방법 또는 자료출처
	2019	2021	2022	2023			
기능 향상도		30%	35%	40%	전년대비 연수 참가자 역량제고	$\frac{\text{연수 후기능수준 증감}}{\text{연수 전기능수준}} \times 100$	사전·사후 평가
국제대회 입상 직종 수	2 직종	-	3 직종	-	전 국제대회 대비 입상 직종 수 증가 (+1개 직종)	입상 직종 수	수원국 자료

- 라오스 산출물 달성 여부 근거

산출물 (OUTPUT)	연수 참여자의 기능향상도, 자체 기능경기대회 개최 및 국제기능올림픽 대회 참가 등
성과 지표	- 자국 내 기능경기대회 개최 - 연수 참가자의 연수 전·후 기능수준을 평가하여 “기능향상도 측정”

- 아제르바이잔 산출물 달성 여부 근거

산출물 (OUTPUT)	연수 참여자의 기능향상도, 자체 기능경기대회 개최 및 국제기능올림픽 대회 참가 등
성과 지표 및	- 자국 내 기능경기대회 개최 - 연수 참가자의 연수 전·후 기능수준을 평가하여 “기능향상도 측정”

설명	성과 지표	현황 목표치			2022 목표치 산출 근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집 방법 또는 자료출처
		2021	2022	2023			
	대회 개최	-	-	1회	자체 기능경기 대회 개최 목표	국내 기능경기대회 개최 횟수	수원국 자료
	기능 향상도	30%	35%	40%	전년대비 연수 참가자 역량제고	$\frac{\text{연수 후 기능수준 증감}}{\text{연수 전 기능수준}} \times 100$	사전·사후 평가

3. 효과성 및 영향력

3.1. 효과성/영향력 평가 기준 및 중간평가 결과

평가 기준	평가 항목	평가값			
효과성 및 영향력	계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	4	③	2	1
	사업성과의 취약계층 포용성 및 형평성 정도	4	③	2	1
	사회경제제도에 대한 영향력	4	③	2	1

□ 효과성 평가 기준

- 국제개발협력사업의 목표 달성도를 의미하는 것으로, 사업 초기에 설정된 산출물 목표, 성과목표를 구분하여 초기 목표를 얼마나 달성했는지 측정하여 평가함.
- 목표 달성여부 및 정도에 기여하는 요인을 검토하고, 분리지표를 활용하여사업혜택이 취약계층에게도 공평히 배분되었는지를 추가적으로 파악하여 등급을 부여함. 참고로, 종료평가 시에는 산출물(output) 목표까지, 사후평가 시에는 성과(outcome) 목표까지 달성여부를 측정할 수 있음.

□ 영향력 평가 기준

- 국제개발협력의 결과 직·간접적으로 초래된 지역적·사회적·경제적·환경적·제도적 변화 등 거시적이고 포괄적 변화에 대한 평가임.

- 사업내부요인과 외부환경적 요인으로 인한 변화를 구분하고, 긍정적 변화와 부정적 변화, 의도한 결과와 의도하지 않은 결과도 모두 포함함. 사업의 확장 가능성과 부정적 영향이 있다면 이를 해결하기 위한 조치가 있었는지도 검토함.

3.2. 효과성/영향력의 성과 달성 여부 산정 근거

성과 (OUT-COME)	• 개도국의 기능경기대회 인프라 구축 및 역량강화를 통한 숙련기술인력 양성 및 숙련기술 촉진 - 기술교육훈련(TVET) 품질 제고 및 숙련기술에 대한 인식 제고
------------------	--

□ 설문 그룹 1 - 현지 공무원

- 한국의 전국기능경기대회에 참여한 현지 공무원의 설문의견을 참조하여 효과성/영향력이 높다는 것이 발견됨.

- 대상 : 라오스 6인 + 필리핀 4인

- 일시 : 2023년 10월 16일

- [기대 효과 및 만족도] 설문 10. 한국 기능경기대회의 장단점은?

라오스 1. 단점 : 없음 장점 : 설비&경기장 시설이 매우 우수하고, 선수들의 기량이 뛰어남.
라오스 2. 단점 : 찾을 수 없었음 장점 : 선수들이 실력과 열정을 가지고 있고 대회 장비들 설비와 시설이 잘 되어있음.
라오스 3. 단점 : 없음 장점 : 선수들이 열정이 있고 실력이 뛰어남. "기능대회"라고 부를 수 있을 정도로 이에 알맞은 우수한 기술을 보유하고 있음.
라오스 4. 단점 : 없음 장점 : 한국의 기능경기대회에서 한국의 기술장비를 많이 볼 수 있어서 좋았다.
라오스 5. 단점 : 없음 장점 : 프로그램이 매우 좋음. 한국의 기능경기대회를 이해할 수 있어서 좋았음. 아세안 기능경기대회를 우리나라도 참여하려고 한다.

라오스 6.

단점 : 없음

장점 : 기능대회를 이끌어갈 때 필요한 절차(단계)를 이해하는 데에 도움이 됨.

필리핀 1, 2, 3, 4 동일 의견

장점- 전체적으로 잘 조직된 느낌이며 특히 개막식이 인상 깊었음. 대회 개최 자금 조성에 정부뿐만 아니라 민간 기업도 자금 조성에 참여한다는 점. 대회 참가자가 많음. 특히 기술 교육을 받고 있는 학생들과 함께 현직에 참가자들의 대회 참여 기회가 높다는 점. 대회 운영 중에도 과제나 대회 운영 상황 등 정보 수집에 용의하다. 기술 표준이 대회에 적용되었다는 점.

단점 : 단점을 찾을 수 없어 해당국가의 기능경기대회 개최 수준 현실을 자각하게 만들어 의기소침하게 만들

○ 설문 11. 한국 기능경기대회 중에 어떤 경기직종에 가장 관심이 있나요?

- ① 기계분과 ② 금속수송분과 ③ 전기전자분과
④ 건축목재분과 ⑤ IT디자인분과 ⑥ 공예의류분과 ⑦ 미예분과

라오스	필리핀
①,③,④	1. ④
2.	2. ⑤
3. ①,③,④	3. ⑥
4. ①,②,③,④,⑤,⑦	4. ④
5. ③,④,⑤	
6. ①,③,④,⑤,⑥	

- 국가별로 특정 분야에 대한 관심을 표명하고 있고 효과성과 영향력에 대한 지속성이 가능해짐.

○ 설문 12. 본국 기능경기대회 장단점은?

(장점)

라오스 전원(6명) 없음

필리핀 1, 2, 3, 4 동일 의견

장점 : 최소한 자체적으로 기능경기대회를 치를 역량이 있다는 점. 기업과 협력을 강화하여 기업과 정부가 상호 협력하여 시설을 공유하는 점. 미래 사업을 준비하는 기업이나 기관에 새로운 기술분야를 소개 한다는 점. 기능대회수상자가 민간 기업에 고용된다는 점. 많은 시설이 재정비 되고 있다는 점

(단점)

라오스 1. 아직 선수&심사들의 실력이 부족하고, 대중들의 기능대회인식&정부로부터 재정적 지원이 부족함

라오스 2. 라오스는 아직 선수&지도위원의 실력이 부족하고, 설비도 많이 없어 조직 면에서도 부족한 점이 많다고 함

라오스 3. 아직 선수와 심사위원들의 실력이 부족하고 기능대회에 대한 인식이 많이 부족함.
4. 5, 6 무응답
필리핀 1, 2, 3, 4 동일 의견 단점 : 기본 기술이 얼마나 중요한지에 대한 인식이 없어 목공이나 배관과 같은 기본적인 산업 기술에 대한 직종대회 개최하지 않음.

- 해당 국가의 기능경기 대회 개최 여력이 부족하고 실력이 낮은 상태임. 본 사업을 통해서 능력이 배양되고 효과성과 영향력이 발휘될 여지를 충분히 가지고 있음.

○ 설문 13. 한국과 본국의 기능경기대회를 비교

라오스 1. 한국 선수·심사위원들과 기량 차이가 크고, 시설면에서 라오스가 한참 뒤쳐져 있음.
라오스 2. 한국과 라오스 선수&지도위원들 간의 실력차가 너무 큰 것 같음. 열정이나 실력부분에서 많은 온도 차이가 있음.
라오스 3. 기능대회에 대한 인식. 선수&심사위원들의 실력차이가 너무 큰 것 같음.
라오스 4. 무응답
라오스 5. 예산의 차이가 있고 기능경기 참여자의 수에서 차이가 있다.
라오스 6. 한국 기능경기대회는 종목이 많고 퍼실리테이터(진행자)와 전문가가 많았음
필리핀 1, 2, 3, 4 동일 의견 한국과 본국의 기능경기대회를 비교할 때 확연히 차이가 나는 것은? 한국 선수들의 연령이 어리고 그럼에도 불구하고 어린 나이에 기술교육을 받고 있으며 정부나 기업이 일정 비율로 대회 관련 자금을 지원하는 반면 필리핀의 경우는 민간기업 후원 부분이 많이 약함. 또한 해당국가의 국내대회 수상자 일지라도 국제기능올림픽 수준의 기술 숙련도가 아니지만 한국 선수들은 국내대회 수상자가 국제기능올림픽 수상자로 이어질 가능성이 높은 기술 숙련도를 가지고 있음. 수상 후 높은 수준의 보상이 한국 선수들에게 주어지는데 이는 계속 공부할 수 있는 동기부여가 됨. 또 일선에서 일하고 있는 작업자들도 대회에 참여함으로써 배우는 중에 있는 어린 학생들에게도 동기부여와 지속적인 학습 자극을 줄 수 있는 것으로 보임.

- 한국과 해당 국가간의 실력 차이가 극명하게 발휘되고, 한국 ODA를 통한 지원을 계속 요청하고 있어, 효과성/영향력은 높을 것으로 판단됨.

□ 설문 그룹 2 – 한국 연수참여자

- 한국에서 시행된 연수참여자의 설문 의견을 참조하여 효과성/영향력이 높다는 것이 발견됨.
- 설문 13. 이번 기능경기 역량강화 초청연수 프로그램의 장점과 단점은?

①	장) 직종 관련 기술 및 지식 습득 기회, 선수 지도 및 훈련 전략 습득 기회, 국제기능올림픽대회 관련 정보 습득 기회, 한국 국가대표 선수 훈련 직접 참관 기회
	단) 없음
②	장) 필리핀 본국 훈련장에는 없는 MPS 모듈들 체험 및 사용 실습 가능, 한국 국제지도위원회 국제대회 참가 전략 및 관련 역량 배움
	단) 없음
③	장) 한국 국제지도위원의 국제기능올림픽대회 참여 경험 공유 및 이를 기반으로 한 국가대표선수 지도 및 훈련 전략 강의를 들을 수 있었음
	단) 연수기간이 다소 짧았음
④	장) 능력향상의 기회를 줌, 여러 나라의 문화를 배움, 다양한 연령대의 친구를 만날 수 있음
	단) 연수기간이 짧음
⑤	장) 심층 학습과 자원 가용함. 강사들은 자신들의 전문지식을 공유할 수 있는 경험이 풍부
	단) 집(본국?)으로부터 먼 거리와 날씨. 그러나 GIFTS의 환대로 편안하게 적응함
⑥	장) 더 기술적으로 설명하면 필리핀에서처럼 교과서에 초점을 두지 않음. 소프트웨어로서 더 발전된 장비는 훈련에 집중할 수 있도록 효율적인 편안한 환경을 제공함. (장점) MORE TECHNICALLY EXPLAINED NOT FOCUSING ON THE TEXTBOOKS AS WE HAVE IN THE PHILIPPINES. MORE ADVANCED EQUIPMENT & SOFTWARES ARE PROVIDED WITH AN ENVIRONMENT OF COMFORT & EFFICIENT WHICH HELPS US FOCUS ON THE TRAINING.
	단) 고향에서 멀리 떨어진 날씨 상황. 그러나 정말로 영향을 주는 건 아니고 불리하지만 도전함 (단점) FAIR-AMWAY FROM THE HOMETOWN & THE WEATHER CONDITION. BUT ALL THIS ARE NOT REALLY GIVING MUCH EFFECT AS AN DIS-ADVANTAGE BUT A CHALLENGES.

⑦	장) 네트워킹 환경에서 많은 것들을 배움 (장점) LEARN A LOT OF THINGS WHEN IT COMES IN THE NETWORKING ENVIRONMENT
	단) 단점이 없음 (단점) NO DISADVANTAGES
⑧	장) 대회에 필요한 기술 습득, 모듈을 다루는 지식과 전략을 배움
	단) 없음
⑨	장) 참가자들의 기술력 향상, 최신 트렌드를 알
	단) 무응답
⑩	장) 높은 수준의 기술을 배울 수 있고 대회 준비를 위해 기술을 익히는 것이 아니라 다른 산업 분야에 적용 가능한 기술을 배울 수 있음
	단) 프로그램 기간이 짧음
⑪	장) 국제대회 관련 기준이나 인프라목록 등 공식적인 정보를 확인받을 수 있었고, 선수가 훈련을 하며 스스로 점검하고 확인할 수 있었음
	단) 없음

○ 설문 14. 한국과 본국의 기능경기 역량강화 프로그램을 비교할 때, 차이점을 적어 주세요.

①	훈련 및 교육 프로그램을 위한 기반시설 (장비, 기계 등) 등이 본국 프로그램에 비해 한국 프로그램은 매우 높은 수준임
②	한국에 비해 본국 기능경기 역량 강화 프로그램의 경우 강사의 역량 및 훈련 기반 시설이 상당히 낮은 수준임
③	한국에서 제공하는 기능경기역량강화 프로그램에 비해 필리핀 프로그램의 경우 교육 및 훈련을 위한 기반 시설이 매우 부족함
④	한국 선수들의 역량이 더 뛰어남, 필리핀보다 더 좋은 숙소에서 연습할 수 있는 시간이 주어짐.
⑤	제3세계국으로서 필리핀은 자원 제약과 상이한 부문 우선순위(예: 건설)를 지님. 장비 조달과 소프트웨어 구독조차 쉽지 않음. GIFTS에서 경험한 바와 같이 한국 정부는 여러 부문의 역량 강화와 다른 국가들과의 기술 공유를 지원하고 있다

⑥	ITNSA에 필요한 장비 소프트웨어의 발전은 이러한 차이를 더욱 구체적으로 보여줌. 한정적인 교육기관은 유사한 훈련을 제공하지만 때로는 쓸모없는 교과서에 더 초점을 맞춤. 필리핀의 지리적 어려움으로 특정 훈련이 가능한 환경이 없음. THE DIFFERENCES ARE MORE PARTICULAR IN THE ADVANCEMENT IN EQUIPMENTS & SOFTWARE NEEDED IN ITNSA. LIMITED SCHOOLS/INSTITUTIONS OFFERS SIMILAR TRAINING BUT MORE FOCUS IN TEXTBOOKS WHICH SOMETIMES OUTDATED. NO SPECIFIC TRAINING ENVIRONMENT DUE TO CHALLENGES WITH THE GEOGRAPHICAL AREA IN THE PH.
⑦	필리핀과 한국의 실력 비교에 있어서 한국은 매우 발전적이고 매우 능숙함 When it comes to comparing the skills in philippines and korea, the korea is very advanced and very skillful.
⑧	한국은 후원자들이 있다. 우리도 필요함. 한국은 전문가와 경쟁자들의 급여와 수당에 대한...예산이 있다..?
⑨	필리핀보다 한국이 훈련장비가 많다
⑩	필리핀 역량 강화 프로그램 참여 경험이 없어 비교 불가
⑪	많은 차이점이 있는데, 한국은 전반적인 기능경기 훈련이 강도가 높고 기간이 매우 길다. 또, 정보기술 직종 선수의 경우, 삼성전자에 소속된 상태로 훈련을 받지만 필리핀을 모두 대학생들이 선수로서 활동을 해서 학업과 병행하는 어려움이 있다.





○ 설문 15. 이번 기능경기 역량강화 초청연수 후 본인(본국)에게 어떤 이득(또는 도움)을 얻었는지요?

①	선수 지도 및 훈련 전략 습득 기회, 직종 관련 지식 및 기술 습득 기회
②	PLC 프로그래밍, MPS 조립 및 시운전, 선수 지도 전략 등에 대해 많이 배움
③	한국에서 활용하는 방식으로 PLC 프로그래밍을 하는 방법을 배우게 되었음
④	I can impart everything i have learned from here & well help lots of enthusiast or young learners to have courage or confideence to compete. (= 저는 여기서 배운 모든 것을 전달할 수 있습니다. 많은 열정적인 학습자들이나 젊은 학습자들이 경쟁할 수 있는 용기나 자신감을 가질 수 있도록 도와줍니다.)
⑤	필리핀과 특히 TESDA 덕분에 이번 연수 참여자로 선정되고, 국내 항공료도 지원받았음. 그러나 연수 참여 전과 연수중의 생활비 같은 추가 지원을 받을 수 있다면 더 도움이 될 것 같음. 미래에 필리핀이 연수 후 지원도 제공하면 좋겠다.

⑥	필리핀에서는 얻을 수 없는 큰 지원과 성과.. 현지 여행, 숙박 등과 관련한 재정적 지원은 없었지만 우리가 선택할 수 있는 옵션은 진행하고 싶음. BY SELECTING US OR ME AS TO REPRESENT PH IN THIS TRAINING FOR HAVING THIS OPPORTUNITY IS A GREAT SUPPORT & ACHIEVEMENT I CAN GAIN IN WHICH ARE POSSIBLE NOT AVAILABLE IN OUR COUNTRY. THOUGH THERE WERE NO FINANCIAL SUPPORT IN RELATION TO LOCAL TRAVEL, ACCOMMODATION AND OTHERS. BUT AN OPTION FOR US WHETHER WE/I WOULD LIKE TO PROCEED OR NOT. - 2 -
⑦	학생 시절에 TESDA는 많은 도움을 줌. 학교에 관한 비용 지원을 해줌. the tesda for me as a student he help me a lot when it comes to school he giving me allowance for the expenses
⑧	선수 지도 전략 등에 대해 많이 배움.. Admin 지원은 정말 중요하다.
⑨	나의 지식을 향상 시켰다.
⑩	1. 대회 준비, 2. 높은 기술을 트레이닝을 통해 습득하고 이를 재학생들에게 전달하여 이들이 다른 기술대회를 준비할 수 있도록 할 수 있음, 3. 정부와 경험을 공유하여 유사 기술이 적용되는 곳에 전달하여 도움을 줄 수 있음
⑪	필리핀 선수가 본인이 몰랐던 과제나 해보지 않았던 과제를 본 연수에서 진행함으로써 한국 선수의 결과물과 비교해보고 함께 이야기 해보면서 답을 찾아갈 수 있었다.

○ 설문 16. 이번 기능경기 역량강화 초청연수 프로그램 중에서 가장 인상 깊었던 점은?

①	한국 국제지도위원 및 지도교사의 선수 지도 및 훈련 전략이 매우 인상적으로 느껴졌음
②	한국 국제지도위원 및 지도교사의 지도 역량 및 훈련 전략이 가장 인상깊었음
③	한국의 경우 기능경기분야와 실제 산업현장분야가 매우 긴밀하게 연결되어있다는 점을 이번 프로그램을 통해 가장 인상적으로 느끼게 됨. ex) 삼성전자의 기능경기 일부 직종 훈련 지원
④	기간이 정말 짧았지만 제가 배울 수 있는 최고의 사람들을 공유하려는 장 선생님의 열정과 이타심

⑤	강사들의 전문성과 본국의 학생들이 사용할 수 있도록 개인 장비를 기부해준 관대함이 인상적이었다. 우리의 식사를 제공해 준 그들의 환대와 관대함에 크게 감사한다.
⑥	
⑦	trainers의 체험과 배려에 대해 감동함 
⑧	참가자들과 강사들이 전문과들과 함께 본국의 참가자들부터 훈련 시킨 것? 
⑨	전문가들이 헌신적으로 훈련시켜준 것에 대해 감사하다. 
⑩	심사위원이나 코치가 전달하는 기술이 체계적이고 일반적이나 상세함. 또한 보유하고 있는 장비나 공구가 최고 수준임.
⑪	한국선수와 지도위원들이 관련 정보나 기술 등을 공유하고 전수하는 것에 적극적이었고 필리핀 선수가 어려움을 겪을 때마다 함께 해결하려 도와주는 모습이 인상깊었다.

4. 지속가능성

4. 지속가능성 평가 기준 및 중간평가 결과

평가 기준	평가 항목	평가값			
지속가능성	재정적 제도적 역량 여부 계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	④	3	2	1
	인적 역량 유지관리 체계 여부	④	3	2	1
	계획대비 실제 지속가능성	④	3	2	1

- 국제개발협력 사업이 종결된 후에도 사업의 효과가 지속되는 정도를 의미함. 즉, 국제개발협력 사업이 향후에도 유지될 잠재성이 있는지, 사업의 긍정적 영향력이 지속적일 것인지에 대한 평가임.
- 이를 위해 수행기관의 인적·제도적·재정적 역량, 위험관리 계획을 검토하고 사업을 통한 잠재적 상쇄효과도 검토함.

□ 설문 그룹 1 - 현지 공무원

- 한국의 전국기능경기대회에 참여한 현지 공무원의 설문의견을 참조하여 향후에 지속가능성이 유지될 가능성이 높다는 것이 발견됨.
 - 대상 : 라오스 6인 +필리핀 4인
 - 일시 : 2023년 10월 16일
- [한국에 기대하는 바] 설문 14. 향후 한국으로부터 어떤 지원을 원하는가? (예 : 예산지원, 기능경기노하우, 기자재, 시설/ 교재, 매뉴얼, 강사 등)

라오스 1. 기술적 & 재정적 지원 모두 필요함
라오스 2. 기능경기 노하우, 기자재, 교재/매뉴얼, 예산 등 기술적&예산적 지원을 받고싶음
라오스 3. 예산지원&기술지원을 비롯하여 매뉴얼, 강사 등 많은 도움이 필요합니다.

라오스 4. 예산지원, 기능경기 노하우, 시설/교재, 매뉴얼
라오스 5. 예산지원, 기능경기노하우, 기자재, 시설/ 교재, 매뉴얼, 강사
라오스 6. 예산지원, 기자재, 매뉴얼
필리핀 1, 2, 3, 4 동일 의견 향후 한국으로부터 어떤 지원을 원하는가? (예: 예산지원, 경기노하우, 기자재, 시설/교재, 매뉴얼, 강사 등) 공무원 : 지속적인 선수 및 트레이너(코치) 그리고 심사위원 교육과 더불어 아세안 대회를 위한 재정지원 및 스폰서쉽. 또 아세안 준비 및 대회 전 일정에 컨설턴트를 파견하여 자문 및 관리 감독 원함

- 한국과의 지속적인 관계유지를 통해서 기능경기대회와 관련된 제반 사항의 향상을 수원국에서 요청하고 있음.

○ 설문 15. 한국 기능경기대회 연수를 통해 본인(본국)의 어떤 부분이 개선될 것으로 보는가?

라오스 1. 라오스 전국기능대회 홍보·조직 관련 노하우를 배워 이 부분이 먼저 개선될 듯 함
라오스 2. 라오스 국내대회 조직이 조금 더 원활하게 진행될 것이라 예상/기대함.
라오스 3. 라오스 전국기능대회를 홍보할 수 있는 방법& 조직을 원활히 할 수 있는 방법·노하우를 배워 이 부분에 개선이 있을 듯 함.
라오스 4. 차이가 크다. 도구, 장비, 참가자 등
라오스 5. 한국의 기능경기대회는 여러나라가 참여했는데 라오스에서는 몇 팀만 참석한다.
라오스 6. 무응답
필리핀 1, 2, 3, 4 종합의견 한국 기능경기대회 연수를 통해 어떤 부분이 개선될 것으로 보는가? 모든 부분이 개선될 것으로 판단한다. 우선 커리큘럼에 대한 수정과 기술 표준을 정하고 참가자 나이 조정 및 많은 지역에서 참가자가 생길 수 있도록 개선할 생각이다(한국의 경우 전국의 모든 시도에서 참가자가 있다는 점이 인상적이었음) 또한 시설 개선과 민간 기업과의 협력에도 노력할 것이다. 한국 전국기능경기대회가 작은 아세안 대회로 여기고 이 대회를 개최하는데 있어 가장 기본적인 사항부터 보고 익혀 아세안 대회에 적용하여 성공적인 대회 개최가 이루어 질 것이라 예상함.

- 설문 16. 한국 기능경기대회 연수 참여 후 본인(본국)에게 어떤 이득이 있었는가요?

라오스 1. 기능대회 홍보, 조직에 대한 노하우를 배워 이를 라오스 국내대회에 접목하는 등 많은 도움이 될 것 같음.
라오스 2. 한국 기능대회 홍보방법 및 조직방법을 배워서 이 부분을 활용하여 라오스 국내대회 홍보·발전이 있을 것으로 기대함.
라오스 3. 라오스 국내대회 조직 & 기술 개발에 필요한 많은 노하우를 배울 수 있었음.
라오스 4. 5, 6 무응답
필리핀 1, 2, 3, 4 종합의견 한국 기능경기대회 연수 참여 후 본인(본국)에게 어떤 이득이 있었는가요? 국내 대회 개선을 통해서 국제대회에 한 발 더 다가설 수 있게 됨

- 설문 17. 한국 기능경기대회 연수 참여 후 가장 인상 깊었던 점은?

라오스 1. 한국 선수들의 기량이 뛰어남. 라오스 선수와 기량 차이가 너무 큼. 기능대회 조직이 잘 되어있고 홍보도 잘 되어있는 점이 인상 깊음.
라오스 2. 설비가 우수하고, 직종 선수들 실력이 뛰어난 점이 인상적이었음.
라오스 3. 선수&심사위원들 실력이 우수하고 장비&대회장조직이 잘되어있어서 인상적이었음
4, 5, 6 무응답
필리핀 1, 2, 3, 4 종합의견 한국 기능경기대회 연수 참여 후 가장 인상 깊었던 점은? 대회 준비의 완벽함. 모든 행사 및 대회가 잘 조직되어 운영된다는 점

□ 설문 그룹 2 - 한국 연수참여자

- 한국에서 시행된 연수참여자의 설문의견을 참조하여 향후에 지속가능성이 매우 높다는 것이 발견됨.
- 설문 11. 이번 기능경기 역량강화 초청연수에 참여한 목적은 무엇인가요?

①	필리핀 국가대표선수 훈련 전략 수립 목적 직종 관련 신규 지식 및 기술 습득 목적
---	--

②	기능경기 지도위원으로서의 개인역량 강화 목적 추후 필리핀 국가대표 선수 훈련 전략 수립 목적
③	직종 관련 심화 지식 및 기술 습득 목적 국제기능올림픽대회 입상을 위한 훈련 계획 및 전략 수립 목적
④	전문가로서 숙련된 훈련을 받고싶고 substance painter, unreal Engine& Z.brush programs에서 내 기술을 향상시키고 싶음. 기능경기 훈련 계획을 배울 수 있음. (To be Trained as a skilled expert and upgrade my skills in substance painter, unreal Engine& Z.brush programs. Able to learn the contents of Worldskills test project.?)
⑤	Training for skills competition 기능경기 훈련
⑥	별도 서식 (아래참고)
⑦	별도 서식 (아래참고)
⑧	전문가들이 경쟁력을 강화하고 경쟁자들을 훈련하는데 효과적일 수 있도록 하는 것이며 또한, 한국과 필리핀이 좋은 관계를 만들기 위해서이다.
⑨	팀리더로서 감독하려고 참가했다 <i>The purpose of our training in Korea as Team leader is to observe the conduct of training for competitors & Experts as well as the best practices used in conducting such event.</i>
⑩	직종 관련하여 전기(프로그램) 및 기계 분야 역량 향상과 2024년 프랑스 리옹 국제기능올림픽 참여를 위해 한국팀과 협력을 공고히 하기 위해서
⑪	선수의 기능역량강화 한국팀의 대회(Asiaskills)준비 및 훈련과정 참관

○ 설문 18. 향후 한국으로부터 원하는 지원이 있으면 작성해 주세요.

①	연수 기간을 길게 제공하였으면 좋겠음. (최소 3개월 이상)
②	연수시간이 더 길었으면 좋겠음
③	없음
④	Free training, Meal& accommodation. gamsahamnida.(=무료 교육, 식사& 숙박 감사합니다.)
⑤	연수 지속 및 역량 강화, 문화 체험
⑥	지속적인 지식 공유 및 기술 훈련. 문화적 차이를 공유하는 것 외 지속적인 개선을 위한 훈련 및 국가간 연계..? <i>CONTINUOUS SHARING OF KNOWLEDGE & SKILL TRAINING. A CONNECTION OF BOTH PARTIES / COUNTRY FOR CONTINUOUS IMPROVEMENT IN ADDITION OF SHARING OF CULTURAL DIFFERENCES.</i>

⑦	기술에 대한 지원 <i>Yes, I want the Korea in the future, because he help me alot when it comes to skills.</i>
⑧	2025년 제 14회 WSASEAN?에 대비하여 기술 경쟁 및 호스팅 관리를 위한 필리핀 훈련...? <i>Continuous capacity building for skills and TVE for the Philippines Training for managing skills competition and hosting in preparation for the 14th WSASEAN in 2025.</i>
⑨	1. 팀리더 훈련하는 것과 ...WSPH 사무실의 멤버 대상으로 훈련 실시...?국내외 경기..훈련 재개..? ... 2. 성장하는 훈련을 지원해줬으면 좋겠음 <i>* We would like to request a support /training for Team Leaders / members of Worldskills Philippines office in terms of conducting training, conduct of National and International skills competition.</i> <i>* Training for professional growth</i>
⑩	한국에서 선수들을 교육하는 커리큘럼을 지원 받아 한국과 같이 고등학생 때부터 모바일 로봇틱스를 공부할 수 있도록 관련된 자료 및 정보 지원 요망
⑪	만약 필리핀 선수가 내년 2024년 Worldskills Lyon에 참가하게 된다면, 이런 훈련 관련 초청연수를 더 진행하거나 한국의 국내대회 과제 등을 공유 받아서 다양한 방법으로 훈련을 경험할 수 있으면 좋겠다.

5. 일관성

5.1. 일관성의 평가기준

평가 기준	평가 항목	평가값			
일관성	내적 일관성	④	3	2	1
	외적 일관성	④	3	2	1

○ 국제개발협력 사업이 국내외 다른 국제개발협력 사업과 중복성 없이 연계되어 시너지효과를 창출하는 정도를 나타냄.

○ 국내 ODA 시행기관 사업이 기관 내 기타사업과 연계되었는지, 타 기관사업에 연계되었는지, 정책일관성 차원에서 외교/안보/환경/통상 등 ODA 외 정책과 연계되는지를 평가하는 내적 일관성(internal coherence), 타 공여국 및 공여기관 사업에 연계되었는지 여부를 평가하는 외적 일관성(external coherence)으로 구분됨.

○ 내적 일관성

- KOICA나 EDCF의 연계사업으로 수행되어 기능경기제도 정책자문 세미나 실시를 실시함.
- 민간 직업기술개발원 훈련시설, 기자재 활용하여 해당 직업훈련원 훈련교사 및 훈련생 대상 기능경기 역량강화 추진
- 우리나라가 제공한 직업훈련센터를 기능경기훈련 거점센터로 활용, 공급된 최신 훈련시설 및 기자재를 활용하여 현지 훈련 및 워크숍 실시하고 해당 훈련센터 훈련교사 및 관계자의 지속적 역량강화 실시

○ 외적 일관성

- 연수 참여자의 기능향상도, 자체 기능경기대회 개최 및 국제기능올림픽 대회 참가 등
- 개도국의 기능경기대회 인프라 구축 및 역량강화를 통한 숙련기술인력양성 및 숙련기술 촉진
- 기술교육훈련(TVET) 품질 제고 및 숙련기술에 대한 인식 제고

- 사업종료 후 지속적인 자체 대회 개최를 위한 지원 및 기능경기올림픽 회원국으로써 기능개발관련 우호적 협력관계 지속
- 자국 내 기능경기대회 개최. 연수 참가자의 연수 전·후 기능수준을 평가하여 “기능향상도 측정”
- KOICA 등 타 원조사업으로 기 구축된 직업훈련원의 인프라를 훈련 교사 및 선수 역량강화 등에 활용하여 사업에 대한 동반상승 효과를 낼 수 있는 대상국

<사후관리 계획>

필리핀	• 사업종료 후 기능경기올림픽 회원국으로써 기능개발 우호적 협력관계 지속
라오스	• 사업종료 후 기능경기올림픽 회원국으로써 기능개발 우호적 협력관계 지속
아제르바이잔	• 사업종료 후 지속적인 자체 대회 개최를 위한 지원 및 기능경기올림픽 회원국으로써 기능개발관련 우호적 협력관계 지속

V. 결 론

1. 중간평가 결과

- 본 연구는 고용노동부가 수행한 ODA 사업 중 「스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업」(2022~2024)과 「개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화 사업」(2021~2023)에 대한 중간평가를 실시함.
 - 이번 중간평가는 고용노동부의 2개의 ODA 사업의 사업계획 수립 당시의 계획과 그간의 수행된 사업간의 변화한 사업 상황을 검토하여, 그간의 사업수행이 해당 사업의 최종 목표에 도달할 것인지를 검토함.
 - 또한 해당 사업추진 상의 애로점과 개선점을 제시하여 본 사업이 애초의 성과에 도달할 수 있도록 제언을 제시함.
- 이번 중간평가 결과는 향후 고용노동부의 ODA 지원 사업의 효율성과 효과성을 제고하여 지속가능한 사업이 될 수 있도록 사업계획을 수립시의 근거를 마련함.
 - 본 중간평가의 대상은 고용노동부 ODA 2개 사업에 대한 중간평가이며, 평가의 기준은 국무조정실(2023년 4월 개정)에서 제시한 국제개발협력 평가지침 및 평가 매뉴얼에 의해 6대 평가기준(적절성, 효율성, 효과성/영향력, 지속가능성, 일관성)으로 수행되었음.
 - 「스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업」은 2022년부터 2024년까지 21.5억원을 투입하여 무상원조사업으로 이행하고 있는 중이다. 「개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화 사업」은 2021년부터 2023까지의 25.5억원을 투입하여 무상원조사업으로 마무리 단계에 있는 사업임.
 - 중간평가는 종료평가와는 달리 사업수행 중인 시점에 평가 분석한다는 특징을 지니고 있어서 6대 평가기준 중 사업 종료 시 파악할 수

있는 효과성/영향력 항목은 명확히 제시할 수가 없어서, 현 시점에서 판단할 수 있는 자료에 의존해서 현재까지의 사업 이행 정도를 고려하여 유추한 값을 제시하였음.

1.1. 스리랑카 개도국 노동시장수요기반 직업기술교육훈련 역량강화 사업 중간평가

1) 적절성

평가 기준	평가 항목	평가값			
적절성	수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합	④	3	2	1
	사업 설계 및 구성의 적절성	4	③	2	1
	환경변화 대응, 위험관리 적절성	4	3	②	1

* 매우 적절 4, 적절 3, 일부 적절 2, 미흡1

- 적절성은 스리랑카 인적자원 개발전략과 이에 따르는 수요에 부합하는지를 평가하는 것으로 본 사업은 스리랑카의 개발전략에 의거하여 추진되었고 추진결과도 ODA의 절차를 준수함. 우리정부의 직업훈련 ODA 지원전략과 스리랑카의 해당 사업에 대한 기존 환경의 적합 정도가 상당히 높은 것으로 판단됨.
- 사업설계 및 구성의 적절성은 현지 국가 수요 사항을 상호 협의 아래 구성하여 설계되고, 직업훈련의 유무상 연계의 좋은 사례임.
- 환경 변화 대응 및 위험 관리의 적절성에 대해서는 스리랑카 국가 부도 등 글로벌 이슈 발발로 인한 교류협력 중단이 발생하였고, 이로 인한 사업 지연은 어쩔 수 없는 현실이었음. 이러한 지연에도 불구하고, 이후 교류가 회복되면서 서서히 협력의 단계가 진일보하고 있는 것으로 평가됨. 사업주체는 최대한 일정에 맞추어 진행하고 있어, 사업 기간 내에 종료가 가능할 것으로 예상되고, 연수계획도 차질 없이 진행되고 있음.

2) 효율성

평가 기준	평가 항목	평가값			
효율성	사업비용의 효율성	④	3	2	1
	사업 기간의 효율성	4	3	②	1
	투입 대비 성과 달성 정도	④	3	2	1

- 기자재 지원, 훈련연수, 교육과정 개편, 귀국근로자 훈련 프로그램 등 다양하게 배정하고 있음. 스리랑카의 직업훈련 현황과 골 지역의 특수성이 충분히 반영되었다고 판단됨.
- 계획된 대로 사업이 추진하도록 노력하고 있지만, 2022년도에 진척이 늦어져, 사업완료에 대한 부담감이 높은 상태임. 대부분의 사업이 2차 년도의 중간과 3차년도에 진행할 계획을 가지고 있지만, 현재 시행기관인 한국산업인력공단의 조직과 추진력으로 달성이 가능할 것으로 기대됨.
- 사업추진 현황으로 투입대비 달성 정도를 평가해보면, 성과 지표가 적절하게 설정되어 있고 어느 정도 목표치를 달성한 것으로 판단됨. 스리랑카 공무원과 연수생의 만족도를 평가하면 상대적으로 상당히 높은 것을 알 수 있음.

3) 효과성 및 영향력

평가 기준	평가 항목	평가값			
효과성 및 영향력	계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	4	③	2	1
	사업성과의 취약계층 포용성 및 형평성 정도	4	③	2	1
	사회경제제도에 대한 영향력	4	③	2	1

- 사업계획대비 성과달성 정도를 살펴보면 어느 정도 계획에 맞추어 진행되고 있음. 직업훈련 연수를 경험한 연수생의 경험을 통해서 효과성/영향력이 일정 부분 발휘할 것으로 예상됨.

- 사업성과의 취약계층 표용성 및 형성 정도나 사회경제제도에 대한 영향력은 사업 특성상 어느 정도 높을 것으로 판단되고, 스리랑카 공무원과 연수생과의 심층면담을 통해서 구두 확인하였으나, 문서로 확인하기에는 중간평가상 어려움이 존재함.

4) 지속가능성

평가 기준	평가 항목	평가값			
지속가능성	재정적 제도적 역량 여부 계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	④	3	2	1
	인적 역량 유지관리 체계 여부	④	③	2	1
	계획대비 실제 지속가능성	④	③	2	1

- 우리 전문가들이 평가한 스리랑카 노동시장 수요기반 TVET 역량강화 사업의 지속가능성 타당성 분석결과를 보면, 효과성과 지속가능성이 높을 것으로 판단하고 있음. 스리랑카 정부의 적극성을 반영하면 지속가능성은 높을 것으로 판단됨.

- 지속가능성을 달성하기 위한 선행조건은

- 스리랑카 측의 정확한 수요제시 및 적극적 협업
- 역량강화 프로그램 적극 참여 및 현업적용
- 제공된 기자재와 설비의 성공적 설치 활용 및 관리
- 코로나 19 상황 개선

5) 일관성

평가 기준	평가 항목	평가값			
일관성	내적 일관성	4	③	2	1
	외적 일관성	④	3	2	1

- 본 사업은 EDCF와의 유무상 연계사업으로 내적 일관성을 확보한 것

으로 평가됨. 국 직업훈련 체계에 대한 우월성을 인식하고 전수받기를 원하는 스리랑카 정부의 입장과, 개도국에 직업훈련 체계를 전파하려는 한국정부의 입장이 매칭되어 향후에도 일관성이 있게 추진될 것이라고 판단됨.

1.2. 개도국 기술격차 해소를 위한 기능경기 역량강화 중간평가

1) 적절성

평가 기준	평가 항목	평가값			
적절성	수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합	④	3	2	1
	사업 설계 및 구성의 적절성	④	3	2	1
	환경변화 대응, 위험관리 적절성	4	③	2	1

* 매우 적절 4, 적절 3, 일부 적절 2, 미흡 1

- 한국형 기능경기 시스템 모델을 개발도상국에 전수하여 숙련기술인력 양성 및 직업훈련 역량강화를 지원함으로써 개발도상국의 산업발전 및 경제성장 지원. 개도국 기능경기 역량강화를 위한 관계자 초청연수, 국내 전문가의 현지 파견, 기능경기 제도개선 및 대회운영 지원 등을 무상원조사업으로 진행함. 한국의 기능경기사업에 관한 축적된 지식이 개도국에 전파되는 사업으로 기술전수를 통한 협력국 간 교류확대로 ASEAN 등 국제기구 내 한국의 영향력 강화
- 한국의 기능경기사업은 지방·전국기능경기대회 개최 및 국제기능올림픽대회 참가를 통해 지역 간 기술격차 해소 및 숙련기술 수준 향상과 숙련기술인 우대풍토를 조성, 한국의 숙련기술인력 양성과 산업·경제발전의 견인차 역할을 함. 본 역량강화사업은 현지 상황을 반영하여 적절하게 구성되어 있음.
 - (대회 운영·기술 전문가 자문) 한국의 기능경기 인프라·제도 전수, 자체 기능경기대회 개최에 대한 운영 및 기술 전문가 자문
 - (역량강화 초청연수) 기능경기 관계자(관리자, 심사위원, 훈련교사, 선수) 대상 기능경기 역량강화를 위한 한국 초청연수 실시

- 연수 참여자의 기능향상도, 국제기능경기대회 참가 성적 향상도에 맞추어 사업이 진행되고, 사업종료 후 기능경기올림픽 회원국으로써 기능개발 우호적인 협력관계를 지속하고 있음. 집중 관리 국가를 3년 주기로 다변화하고 있어 국가 간 협력관계가 지속되고 확장되고 있음.
- 4개 국가로 시작하였으나, 정치적인 이유로 미얀마가 사업을 중단하고, 나머지 3개 국가 중 아제르바이잔은 소극적으로 태도를 취하고 있음. 상대방 국가가 사업을 철회하거나 소극적인 태도를 취할 경우에 우리나라 정부가 취할 수 있는 수단이 거의 없음.
- 각 국가에 담당자가 지정되고 기관별 운영체제가 구축됨.

2) 효율성

평가 기준	평가 항목	평가값			
효율성	사업비용의 효율성	④	3	2	1
	사업 기간의 효율성	④	3	2	1
	투입 대비 성과 달성 정도	④	3	2	1

- 예산은 필리핀과 아제르바이잔이 2022~2023년 각각 600백만원, 라오스 550백만원임. 사전 실무회의, 전문가 파견, 초청연수, 훈련공구 및 재료, 최종 워크숍, 국제대회 참관 지원으로 적절하게 배분되고 있음. 수원국에서는 파견 전문가 현지 활동 지원, 기능경기관련 시설 및 장비 지원, 각종 행정 편의시설을 제공하고 있음. 3개 국가의 현재 상황을 고려해서 각 국가에 인프라를 제공하고 인적 교류에 최대한 노력을 하고 있음.
- 3년 사업으로 2021년에는 개도국 기능경기 역량강화(8억원, 필리핀/라오스/아제르바이잔)으로 진행되고, 연수사업의 후속으로 2022~2023 개별 국가 개발컨설팅을 추진함. 연수 참여자의 기능향상도와 국제기능경기대회 참가의 성적 향상도가 달성 가능해짐. 코로나19로 대면교류가 어려워진 상황에서도 줌세미나를 활성화하고 지속적으로 교류를 진행해옴.
- 각국의 기능경기 능력에 따라서, 기능경기인력 양성, 기능경기주관 인

력 양성, 기능경기 참관(자체 기능경기대회 개최), 국제기능경기의 성과 달성(연구 참가자의 역량 제고) 등의 목표가 설정되고 이에 대한 준비가 이루어지고 있음.

- 사업종료 후 지속적인 자체 대회 개최를 위한 지원 및 기능경기올림픽 회원국으로써 기능개발과 관련되어 우호적 협력관계가 지속되고 있음.

3) 효과성 및 영향력

평가 기준	평가 항목	평가값			
효과성 및 영향력	계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	4	③	2	1
	사업성과의 취약계층 포용성 및 형평성 정도	4	③	2	1
	사회경제제도에 대한 영향력	4	③	2	1

- 한국의 전국기능경기대회에 참여한 현지 공무원의 설문 의견과 연수에 참여한 연수생과 심층면담을 통해서 본 사업의 효과성/영향력이 높다는 사실이 확인됨
- 사업성과의 취약계층 포용성 및 형성 정도나 사회경제제도에 대한 영향력은 사업 특성상 어느 정도 높을 것으로 판단됨.

4) 지속가능성

평가 기준	평가 항목	평가값			
지속가능성	재정적 제도적 역량 여부 계획한 산출물, 성과목표 달성 정도	④	3	2	1
	인적 역량 유지관리 체계 여부	④	3	2	1
	계획대비 실제 지속가능성	④	3	2	1

- 현지 공무원과 연수생과의 심층면담을 통해서 본 사업의 지속가능성이 유지될 가능성이 높은 것으로 판단됨. 한국과의 지속적인 관계유지를 통해서 기능경기대회와 관련된 제반 사항의 향상을 수원국에서

요청하고 있음. 한국으로부터 수준높은 경험을 습득하였고 상당한 격차를 보고하고 있음.

5) 일관성

평가 기준	평가 항목	평가값			
일관성	내적 일관성	④	3	2	1
	외적 일관성	④	3	2	1

- KOICA나 EDCF의 연계사업으로 수행됨. 기능경기제도 정책자문 세미나로부터 시작하여 이제는 독자적인 무상원조사업으로 자리매김. 우리나라가 제공한 직업훈련센터를 기능경기훈련 거점센터로 활용, 공급된 최신 훈련시설 및 기자재를 활용하여 현지 훈련 및 워크숍 실시하고 해당 훈련센터 훈련교사 및 관계자의 지속적 역량강화 실시
- 연수 참여자의 기능향상도, 자체 기능경기대회 개최 및 국제기능올림픽대회 참가 등을 지원하고, 개도국의 기능경기대회 인프라 구축 및 역량강화를 통한 숙련기술인력양성 및 숙련기술을 촉진하고 있음.

2. 제언

2.1. 스리랑카 ODA 사업 제언

- 스리랑카 직업기술교육훈련 역량강화 사업은 수행 기간 중 스리랑카 국가부도 사태의 여파로 사업추진에 심각한 영향을 받아 2022년 사업이 중단되고 2023년 여름 이후에야 본격화되어 사업자체가 지연되고 있음.
- 수원국인 스리랑카의 수요 개발과정이 적합한 것으로 판단되고 사업의 설계 구성도 상대적으로 적절한 것으로 판단됨. 하지만 코로나19로 직업훈련이 지연되거나 온라인으로 개설되는 한계가 발생함. 스리랑카의 급격하게 변화하는 국내사정에 대한 대비가 충분히 마련되어 있지 못하고 코로나19로 인한 사업지연이 발생하여 위험관리가 충분하게 이루어지지 않는 것으로 판단됨. 다만 코로나 같은 팬데믹을 대비하는 경우는 없었음.
- 스리랑카 자체의 노동시장이 빈약하여 (특히 골과 같은 지역단위에서) 직업훈련이 채용으로 연결되기가 쉽지 않은 상황을 고려해서 사업이 진행되어야 함. 청년실업이 20%이상 유지되는 상황이 반복되고 있음. 이러한 노동시장의 상황을 반영하지 않고, 직업훈련 공급 자체에만 관심을 두면, 고용으로 이어지지 않을 가능성이 매우 높음. 사전타당성 조사단계에서 지역 상황과 노동시장에 대한 특수성을 고려할 필요가 있고 실시단계에서 신축적으로 대응해야 함.
- 스리랑카 정부의 정치적 불안정이 상존하고 있고 정부조직의 상시적인 변경과 불안정한 거버넌스로 일반적인 ODA 효율성이 높지 않은 국가로 평가되고 있음. 다양한 국가가 직업훈련 지원을 시도하고 있지만 가시적인 성과가 나타나고 있다고 판단하기는 어려움.
- 하지만 직업훈련분야가 우리나라의 전문성이 높은 강점 분야로 수원국에서 강력하게 지원을 요청하고 있음. 2010년 유상원조로 지원된 환경개선사업의 후속으로 역량강화를 지원하는 차원에서 직업훈련 무상원조가 이루어지고 있어, 사업 자체의 합리성과 적절성은 확보된 사업임.
- 직업훈련지원사업을 통해서 젠더, 인권, 환경(안전)분야 등의 지표개

선이 용이하기 때문에, 사업시에 사전 지표화를 진행하면 성과를 쉽게 이룰 수 있는 분야임. 여성, 청년, 중년으로 다각화하고 노후설비를 대체하는 사업을 전개하는 지표를 설정할 필요가 있음. 수원국인 스리랑카 중앙정부와 지방정부의 지속적인 관심을 유도하도록 국제협력차원의 지원이 필요함.

- 본 중간평가의 결과를 반영하여 PDM을 수정하고 모니터링을 강화할 필요가 있음. 2023년 하반기와 2024년 사업진척에 대한 독려가 필요하고 필요시에 2025년 상반기까지 연장해서 수행하는 방안도 모색할 필요성이 있음.
- 한국정부의 직업훈련 ODA 무상지원사업의 일관성을 유지하면서 유무상 연계의 성공적인 사례로 모범화해야 할 필요성이 존재함.
- 현지에 사업관리를 위한 상주인력을 파견하여 사업을 체계화할 필요가 있음.

2.2. 기능경기 대회 ODA 사업 제언

- 한국의 과거 개발 단계와 유사한 경제사회발전단계에 위치한 국가들에게 한국의 기능경기 제도와 노하우를 무상원조사업으로 지원하여 기술인력을 양성하고 산업발전지원을 목표로 하고 있음.
- 원조대상국의 숙련기술인력에 대한 인식을 개선하고 우대하는 환경을 조성하고, 국가전략산업에 대한 노동공급을 활성화하여 노동시장을 조성하고, 지역사회 숙련기술을 개발하고 수준을 상향화하도록 기여함.
- 국제기능올림픽에서 다수 종합우승을 달성한 경험을 국제교류, 무상 ODA에 적용하여 국가 브랜드 가치를 향상시키는 기여도가 높은 사업임
- 다양한 국가에서 한국의 독보적인 위치와 경험을 전수받고 싶어 하는 실정임. 그렇지만, 모든 국가를 동일한 시점에 하기보다는 각 국가의 사정에 맞추어 기능경기대회의 발전단계를 고려한 맞춤형 지원을 해야 할 것임. 각 국가의 기능인력양성과 숙련기술 촉진에 대한

국가적인 우선순위, 우리나라와의 직업훈련 체계의 유사성을 함께 고려해서 사업을 선정하고 전개해나가야 함. 아제르바이잔의 경우가 그렇지 못한 예에 해당됨.

- 국제협력에서 무상원조사업(소수 국가에 집중)으로 사업성격이 일부 전환됨. 국제협력차원에서 여러 국가와 동시적으로 사업이 진행되고 있음. 국가 숫자를 줄이면서 후속사업으로 고도화를 진행할 필요가 있음. 국가 발전단계가 달라서, 참여유도형 국가와 성과지향형 국가로 나누어 접근함.

- ODA 중점협력국이 아닌 국가를 선정하면서 무상 ODA로 추진하고 검토할 기관과 협력 체계가 충분하게 형성되어 있지 못함.

○ 하지만 참여국가들의 정치경제적인 환경이 매우 다르고 직업훈련교육은 실시하고 있지만 수준과 범위의 차이가 발생하고 있음

- 해당 국가에 대한 정확한 실태 파악이 되지 않고(요구 직종, 지원방법이 확인되지 않은 경우가 많음), 홍보와 예산확보 등의 가시적인 지원이 확보되지 못하고 있음. 국가마다 명확한 성과지표가 구체적으로 양국 합의 아래 제시되어야 할 것임.

- 수원국 담당자도 기능경기대회의 필요성은 인지하지만 절박성에 대해서는 확인하기 어려움 상황임. 법적 근거, 예산, 거버넌스의 부재가 이러한 상황을 반영하고 있음.

- 온라인컨설팅, 초청연수, 훈련 콘텐츠 전파로 진행되었지만, 사업이 동시적으로 진행되어 각 국가별 맞춤형으로 진행되지 못하고, 온라인컨설팅의 효과성은 높지 않은 것으로 판단되고, 아제르바이잔에서와 같이 사업목표 대비 성과에 대한 구체적인 측정 지표가 설정되어 있지 못하고 확인이 가능하지도 않음. 대상국별로 관심 직종에 한정해서 사전계획에 따라 맞춤형으로 진행될 필요성이 제기됨.

- 기능경기대회의 가시적인 효과는 국제기능대회의 참여나 수상으로 이어져야 하지만, 단기간이 이루어지기에는 어려운 항목들로 장기간의 투자를 요구하는 사업임. 참여 선수단의 열망은 좋지만 실제로 실력이 현격히 떨어져서 성과목표를 이루기가 쉽지 않은 상황임.

- 각 국가에서 기능경기위원회의 조직이 비영리단체나 취약한 법적 기

반으로 유지되고 있는 실정으로 재정 자립도가 낮고 지원체계를 국제협력으로 지원하기에는 한계가 발생함.

- 기능경기대회의 수상 경험이 있는 국가에 대해서는 재입상에 대한 우리나라와의 경험에서 얻어지는 순수한 효과를 추출하기가 어려운 측면이 존재함.
- 기능경기대회가 수원국의 사회경제에 미치는 영향을 나타내는 지표와 통계정보가 부족하여 확인이 어려움.
- 수원국에서 요청하는 훈련센터의 건립지원이 쉽지 않고 현재 우리나라의 기능경기대회 ODA 지원이 물적 지원으로 이어지지 못하는 한계가 발생하고 있음.

○ 무상원조의 3년 사업으로 진행되지만, 다년간 국제협력사업으로 보완되어야 할 것임.

- 각 국가의 현황과 의지를 반영한 성과지표를 구체적으로 설정하고 이를 달성하기 위한 전략방안(기능분야, 일정)에 대한 조치가 설정되어야 함. 각 국가마다 기능경기 참여 종목에 상당한 차이를 보임.
- 무상원조사업을 추진하면서 성과지표에 대한 지속적 모니터링이 필요함. 초청연수 사업의 목표가 명확하고 성과가 즉시 발현될 가능성이 높아서 맞춤형 초청연수 사업을 확대할 필요가 있음. 현재에는 기업체와 산업인력공단에서 효율적으로 잘 진행하고 있음.
- 고난이도의 직업훈련 전파사업으로 경제사회적인 파급효과가 매우 높고 우리나라의 전속성을 강화하여 양국 국제협력에 강한 원동력을 제시함. 고급화된 기술 전수가 직업훈련계와 연계되도록 파급효과를 확산시킬 수 있는 방안이 모색되어야 함. 기능경기대회를 통해서 기능경기대회의 노하우가 전체 직업훈련 수준을 높이는 방향으로 설정이 되어야 함.
- 우리나라 ODA 평가기준에 맞추어 젠더, 인권, 환경(안전) 분야 등의 지표개발과 연관성 확보에 노력해야 함. 일부 ODA 항목과는 괴리감이 존재함(사회 취약계층에 대한 포용성과 형평성 등).
- 기능적인 측면이외에도 기능경기대회의 법적 근거 마련, 공정 선발

시스템 개선 등의 인프라 설정에도 지원이 있어야 함.

- 국제기능경기대회 참여자나 수상자들에게 신규채용이나 고용유지에 도움이 될 수 있는 제도가 형성되고 한국과의 지속성이 유지되도록 노력해야 함. 기능경기대회 ODA 사업상의 가장 난이점은 지속가능성의 유지에 있다고 할 것임. 상대적으로 수원국의 지속유지 의지는 강하지만 실제로 전개되려면 가시적인 성과와 많은 노력이 필요함.

- 코로나19 등과 유사한 외부환경적 변화에 대응하기 위한 위험관리체계를 시나리오별로 구성하여 사전에 매뉴얼을 작성할 필요가 있음.

○ 개도국 기능경기 역량강화 사업(K-STAR)의 의미 그리고 성공가능성을 위해서는 중장기 전략 마련이 필요함. 국제대회의 입상을 통한 해당 분야의 숙련기술 증진은 물론 발전을 위해서는 기능경기의 경쟁력 강화만큼 좋은 소재는 없기때문임. 그렇지만, 이를 위해서는 선발에서부터 교육훈련, 그리고 관리까지 전 과정에 걸쳐 보완과 제도적인 뒷받침이 있어야 할 것임.

- 선발과정에서의 엄격한 기준과 분야 선정이 중요할 것임.
- 교육훈련을 위한 시설 지원, 교육과정 개선 등은 필요한 작업임. 국가별 사정은 다르겠지만, 어떤 국가는 기존 지원 ODA 사업에 대한 지원을, 어떤 국가는 새로운 시설을 지원해야 할 것임. 이에 대한 실태조사를 통한 사업 전개가 필요할 것임.
- 관리 측면에서는 기능경기대회 준비에 대한 체계 수립에 대한 자문이며, 이를 위해서는 법제도 구축, 조직 및 인력 등의 체계를 마련해야 할 것임.
- 이러한 내용을 기반으로 한 중장기 전략 마련이 필요하고, 이에 따른 개도국 기능경기 역량강화 사업(K-STAR)을 해야 수원국의 수요를 반영함과 동시에 사업의 효과성을 높이고, 지속가능성을 확보할 수 있을 것임.

부 록

[부록 1] 2023년 기능경기대회 초청연수 만족도 질문지

Matters regarding personal confidentiality in this survey is strictly protected under Article 33 (Protection of Secrets) of Statistics Act on Korea								
Global Institute for Transferring Skills(GIFTS) of Human Resources Development Service of Korea : Post-Program Feedback Survey								
Thank you for participating in 2023 K-STAR Partnership Program for Skills Development, invitational capacity building program(hereafter as “Program”) for Skills Competition administrative in partner countries, hosted by Global Institute for Transferring Skills(hereafter as “GIFTS”) of Human Resources Development Service of Korea(Hereafter as “HRDKorea”). The purpose of this survey is to identify what was or was not satisfactory for the participants of the K-STAR Partnership Program for Skills Development Program so that we can provide better and more improved public services in the future. Please note that the answers you specify below will be used only for our statistical purposes and confidentiality will be strictly applied pursuant to the Statistics Act. Please take a moment to complete this questionnaire and send us the completed form in English only. October, 2023 GIFTS, HRD Korea <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Name</td> <td>(Surname - Middle Name-Given Name)</td> </tr> <tr> <td>Nationality</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>(If you have official position for WSC, Please also include it : e.g. Official Delegate, Technical Delegate)</td> </tr> <tr> <td>Organization</td> <td></td> </tr> </table>	Name	(Surname - Middle Name-Given Name)	Nationality		Position	(If you have official position for WSC, Please also include it : e.g. Official Delegate, Technical Delegate)	Organization	
Name	(Surname - Middle Name-Given Name)							
Nationality								
Position	(If you have official position for WSC, Please also include it : e.g. Official Delegate, Technical Delegate)							
Organization								

Service Quality

Q1. This question is in regard to the **key aspects of the K-STAR Partnership Program for Skills Development**. Please select one of the 10 scale points below as per the level of your satisfaction to the given question. The higher the number, the higher the level of satisfaction (e.g., 0 point (Not satisfied) / 5 points (Average) / 10 points (Very satisfied)).

	Evaluation Points	Not satisfied	Average								Very satisfied	
Cognitive satisfaction	1. This Program meet your expectation	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
Benefit	2. This Program beneficial.	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
Completeness	3. This Program well-organized	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

Q2. This question is in regard to the **facilities and environment** of the service. Please mark your answer in the same way you did in the previous question.

	Evaluation Points	Not satisfied		Average						Very satisfied		
Physical environment	1. The facilities and environment this Program provided were pleasant.	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	1-1. The places where you visited through this Program was suitable	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	1-2. The quantity and quality of the meal was satisfactory.	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	1-3. The accommodation was satisfactory.	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
System/Procedures	2. The Program was well-structured	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	2-1. The presenters from Korea was professional in skills competition	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	2-2. The content of the Program was helpful to build your capacity on skills competition.	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	2-3. The interpreter's interpretation and/or translation helped me understand the content of the program	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	2-4. The interpreter was helpful in my stay in Korea.	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
HRDKorea Coordinator's Sincerity	3. Coordinators(staffs in HRDK) for the Program had been sincere for taking care of participants	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

Social Responsibility

Q3. This question is in regard to the **social responsibility and roles** of the Human Resources Development Service of Korea (GIFTS) as a public organization. Please select one as per the level of your satisfaction to the given question. The higher the numbers, the higher the level of satisfaction (e.g., 0 point (Not satisfied) / 5 points (Average) / 10 points (Very satisfied)).'

	Evaluation Points	Not satisfied		Average						Very satisfied		
Policy validity	1. HRD Korea implements the policies based on a sense of purpose and intent.	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
Sustainability	2. HRD Korea carries out duties for the sustainable development of the country and society.	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
Ethicality	3. HRD Korea operates given tasks in a fair and transparent manner.	①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

Q6. These questions are in regard to the **self-assessment of your competency**. Please specify your points from 0 point through 10 points; the higher number, the higher your competency.

	LOW ----- HIGH									
Your capacity <u>before</u> this Program	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
Your capacity <u>After</u> this Program	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

Q 6-1) Please describe in detail what competency has improved after the Program.

Q7. This question is in regard to HRD Korea's future projects in the field of skills development and international cooperation. Would you like to participate in the invitational training program conducted by HRD Korea (GIFTS) again in the future?

Scarcely	-----				Not sure	-----				Definitely
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	

Opinion for improvement

Q8. Please let me know what needs to be improved for better program.

Q9. Please specify anything you would like to comment to HRD Korea (GIFTS).

♣ Thank you for completing this questionnaire. ♣

[부록 2] 「기능경기 역량강화 초청연수_연수생」 면접 질문지

안녕하십니까?

본 설문조사는 한국 고용노동부가 지원하고 있는 기능경기 역량강화 초청연수의 평가를 위한 것입니다. 여러분의 성의 있는 답변을 부탁드립니다.

2023.11.17

발주기관 : 고용노동부

연구수행기관 : (사단법인)국제개발협력실행연구원

이메일 : iidc777@naver.com

[인적 사항]

1	국가명			
2	성명	2-1. 남() / 여()		
3	소속 및 지위	3-1. 근무기간 : ()년 ()월		
4	학력			
5	이메일		5-1. H.P.	
6	본국에서의 기능경기 역량강화 연수 경험(최근 순으로)			
	연도	내용	기타	
7	다른 나라에서 기능경기 역량강화 연수 경험(최근 순으로)			
	연도	내용	기타	

[참여 경로 및 목적]

8. 이번 기능경기 역량강화 초청연수에 어떤 경로로 참가하였나요?

(예: 추천, 광고, 지인소개 등 구체적으로 상세히 답해 주세요.)

--

9. 이번 기능경기 역량강화 초청연수에 어떤 역할로 참여하였나요?

- ① 지도위원 ② 선수 ③ 직원 ④ 기타

10. 이번 기능경기 역량강화 초청연수 중에 어느 분야로 참여하였나요?

- ① 3D 디지털게임아트 ② IT네트워크시스템 ③ 정보기술 ④ 메카트로닉스
⑤ 모바일 로봇틱스 ⑥ 팀 리더

11. 이번 기능경기 역량강화 초청연수에 참여한 목적은 무엇인가요?

12. 이번 기능경기 역량강화 초청연수 중에 어느 분야로 참여하였나요?

- ① 3D 디지털게임아트 ② IT네트워크시스템 ③ 정보기술 ④ 메카트로닉스
⑤ 모바일로봇틱스 ⑥ 팀리더

13. 본국에서 기능경기 역량강화프로그램에 참여한 적이 있다면 그 프로그램에 대해서 소개해 주세요.

[기대 효과 및 만족도]

14. 이번 기능경기 역량강화 초청연수 프로그램의 장점과 단점은?

장점
단점

15. 한국과 본국의 기능경기 역량강화 프로그램을 비교할 때, 차이점을 적어 주세요.

16. 이번 기능경기 역량강화 초청연수 후 본인(본국)에게 어떤 이득(또는 도움)을 얻었는지요?

17. 이번 기능경기 역량강화 초청연수 프로그램 중에서 가장 인상 깊었던 점은?

18. 향후 한국으로부터 원하는 지원이 있으면 작성해 주세요.

[부록 3] 「기능경기 역량강화 초청연수_공무원」 면접 질문지

안녕하십니까?

본 설문조사는 한국 고용노동부가 지원하고 있는 스리랑카 직업훈련원 개선사업(교육훈련 인프라 개선, 교육과정 지원 등)의 중간평가를 위한 것입니다. 여러분의 성의 있는 답변을 부탁드립니다.

2023.10

발주기관 : 고용노동부

연구수행기관 : (사단법인)국제개발협력실행연구원

이메일 : iidc777@naver.com

■ 기본 사항

1	성명		나이		남() 여()	근무기간	()년 ()월
2	소속기관		부서		직위		
3	이메일		H.P.				
4	학력						
5	주요 경력(최근 순으로)						
	연도	근무기관				업무	
6	연수 경험(최근 순으로)						
	연수기관	연수제목				연수기간	

■ 아래의 질문에 답변해주시기 바랍니다.

7. 이번 한국의 연수에는 어떻게 참여하게 되었나요?

① 기관 추천 ② 광고 ③ 지인 소개 ④ 기타()

8. 한국에서 진행하는 사업이나 연수에 참여해 본 경험이 있나요?

① 예 ② 아니오

☞ 8-1. 만약 참여한 적이 있다면, 언제, 어떤 사업이었나요? (직접 기입)

--

9. 한국의 직업훈련에 대해 알고 있는 것을 자유롭게 써보세요. (직접 기입)

--

10. 본인이 느낀 한국의 직업훈련의 장점과 단점은? (직접 기입)

장점
단점

11. 스리랑카 직업훈련을 한국과 비교하였을 때 어떻게 평가하십니까? (직접 기입)

--

12. 이번 연수 프로그램 중 가장 기대하고 있는 프로그램은 무엇인가요?(직접 기입)

--

13. 귀 기관을 운영하면서 가장 중요하게 생각하는 것은?

- ① 예산 ② 교사 ③ 교육과정 ④ 산학협력 ⑤기타()

14. 귀 기관의 졸업생들은 어디에 취업하나요?

- ① 본국 공장 ② 해외취업 ③ 본국에서의 자영업 ④ 기타()

☞ 14-1 취업 시 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇인가요? (직접 기입)

--

15. 한국의 지원을 통해서 귀 기관의 어떤 변화를 기대하나요?(직접 기입)

--
